

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

## 義力營造股份有限公司 函

承辦人：吳毓昌  
電話：0956607531  
電子信箱：okd5413@earthpower.com.tw

受文者：臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司

發文日期：中華民國115年1月16日

發文字號：商港土方(三)字第1150116001號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：115年1月份協議組織會議紀錄及簽到表乙份

主旨：檢送115年1月7日召開「臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程-土方交換管制及推整委託專業服務」之115年1月份協議組織會議紀錄乙份，敬請 貴公司遵照會議紀錄辦理，請查照。


正本：九賀電氣工程有限公司、上溢營造股份有限公司、久年營造股份有限公司、久佳營造工程股份有限公司、千代營造有限公司、大成工程股份有限公司、大陸工程股份有限公司、川力營造有限公司、工信工程股份有限公司、中華工程股份有限公司、中華威霸營造有限公司、中菲營造事業股份有限公司、五嶺營造有限公司、允升營造有限公司、元漢營造有限公司、文昌營造工程有限公司、日商大豐營造股份有限公司、日商日本國土開發股份有限公司台灣分公司、日商鹿島營造股份有限公司台灣分公司、日商華大成營造工程股份有限公司台灣分公司、日富營造股份有限公司、世久營造探勘工程股份有限公司、世芳開發有限公司、北大瑩工程有限公司、北昌營造股份有限公司、北翰營造有限公司、台正營造有限公司、巨佳營造工程股份有限公司、正田營造股份有限公司、正豪營造有限公司、永青營造工程股份有限公司、永馨營造有限公司、永騰工程股份有限公司、立電股份有限公司、同心開發土木包工業、地樺營造事業股份有限公司、宇力工程有限公司、安宏營造有限公司、安倉營造股份有限公司、安鴻工程有限公司、成盟營造股份有限公司、有田營造股份有限公司、百輝營造有限公司、百豐營造股份有限公司、利晉工程股份有限公司、利德工程股份有限公司、呈豐營造股份有限公司、宏昇營造股份有限公司、宏義工程股份有限公司、宏福電纜工程股份有限公司、宏錫工程股份有限公司、志億營造股份有限公司、沅垣營造事業有限公司、玖泰工程股份有限公司、辰茂營造工程股份有限公司、亞太土石資源有限公司、尚群營造有限公司、忠明營造工程股份有限公司、旺邦營造股份有限公司、昇萌股份有限公司、昌鉉工程股份有限公司、昌鴻營造有限公司、明秀營造有限公司、明鈴營造有限公司、東源營造工程股份有限公司、東鈺營造股份有限公司、東鑫龍營造有限公司、松弘營造有限公司、松青營造有限公司、泛亞工程建設股份有限公司、直佑營造股份有限公司、長友營造股份有限公司、長惟工業股份有限公司、長盛營造股份有限公司、長裕營造有限公司、俊曜工程有限公司、保障實業有限公司、冠



君營造有限公司、宥穎工程有限公司、建智營造有限公司、彥韋營造工程股份有限公司、政東水電工程股份有限公司、春旭營造工程股份有限公司、春原營造股份有限公司、昱盛營造股份有限公司、泉億營造有限公司、皇昌營造股份有限公司、虹泰營造有限公司、哲國營造有限公司、家名營造有限公司、宸茂營造有限公司、展旭營造工程股份有限公司、展慶營造股份有限公司、峻鴻營造有限公司、冕盛電氣工程股份有限公司、晉煌營造有限公司、根基營造股份有限公司、桔原企業有限公司、泰業營造股份有限公司、泰誠發展營造股份有限公司、祐邦工程有限公司、偉大建設股份有限公司、偉唐營造有限公司、國記營造股份有限公司、國盛電氣工程股份有限公司、國新營造股份有限公司、國裕建設工程股份有限公司、基強營造有限公司、崇偉營造工程股份有限公司、常泰有限公司、得豐電氣工程股份有限公司、晨鑫營造股份有限公司、淳家國際股份有限公司、盛河營造有限公司、盛泰開發實業有限公司、祥昌水管工程股份有限公司、竟成營造有限公司、統營營造股份有限公司、統鑫開發實業股份有限公司、造隆電氣工程股份有限公司、逢昌營造有限公司、逢國營造有限公司、凱鑫達營造股份有限公司、勝岳營造有限公司、勝益營造股份有限公司、勝堡村營造工程股份有限公司、富士山營造有限公司、富民營造股份有限公司、富頂營造有限公司、智發營造有限公司、朝洋營造有限公司、港洲營造股份有限公司、程峰營造股份有限公司、竣浩營造股份有限公司、菁木營造有限公司、華志營造股份有限公司、詠源實業有限公司、陽光城市開發股份有限公司、順通聯合工程有限公司、傳亞營造有限公司、勤曜電氣工程股份有限公司、新安營造有限公司、新亞建設開發股份有限公司、新高建設股份有限公司、輝昇營造工程股份有限公司、瑞助營造股份有限公司、瑞健營造有限公司、瑞通營造有限公司、盟巖營造有限公司、萬勁營造有限公司、萬達發剩餘土石方資源處理場、萬德營造有限公司、裕隆工程股份有限公司、達欣工程股份有限公司、嘉巖營造工程股份有限公司、暢禾企業有限公司、榮工工程股份有限公司、榮金營造工程股份有限公司、福住建設股份有限公司、福呈營造股份有限公司、福旺營造股份有限公司、福清營造股份有限公司、福程營造股份有限公司、遠揚營造工程股份有限公司、魁隆營造股份有限公司、億東營造股份有限公司、德益營造有限公司、慶霖營造股份有限公司、潤弘精密工程事業股份有限公司、稻田營造有限公司、翰德工程有限公司、興磊資源回收股份有限公司、鋼管建築工程股份有限公司、優寶營造有限公司、應州工程有限公司、總行營造興業股份有限公司、鴻祥營造股份有限公司、鴻銘營造工程股份有限公司、曜鼎營造有限公司、豐順營造股份有限公司、豐譽營造股份有限公司、鎮弘營造有限公司、麒瑞營造股份有限公司、麒耀營造有限公司、麗寶工程顧問有限公司、馨澤工程有限公司、慶陽室內裝修工程股份有限公司、裕晟營造工程股份有限公司、源利工程股份有限公司、昇達實業有限公司、仁德工程有限公司、大維營造股份有限公司、銓陽工程有限公司、麗高營造股份有限公司、金隆營造股份有限公司、泰億營造有限公司、耀鉉營造有限公司、翔禾管線工程有限公司、岳暘營造有限公司、遠碩營造股份有限公司、元順營造股份有限公司、雲順工程有限公司、志誠營造股份有限公司、廣鎡營造有限公司、郡毅營造有限公司、金助營造廠有限公司、冠勝工程有限公司、鉉運營造有限公司、芝銘有限公司、豐皇營造有限公司、拓和營造有限公司、上靖工程股份有限公司、正鼎東開發營造股份有限公司、久勝營造有限公司、萬達發開發股份有限公司、旭源營造工程股份有限公司、建國工程股份有限公司、時基營造股份有限公司、韻笙營造有限公司、世鷹工程有限公司、宏民營造股份有限公司、寬聯營造股份有限公司、翰駿營造有限公司、祺鑫營造有限公司、歲騰營造股份有限公司、偉邦營造股份有限公司、神緯營造有限公司、福鑫營造有限公司、敬沅企業股份有限公司、禾楓工程有限公司、敦榆開發實業有限公司、鉅登營造工程股份有限公司、鉅松營造有限公司、加豐營造有限公司、世登營造有限公司、承隆能源科技股份有限公司、碧城興業股份有限公司、睿森營造有限公司、勝泉工程有

限公司、有泰營造股份有限公司、華電聯網股份有限公司、廣京營造有限公司、  
山豐營造股份有限公司、安定營造有限公司、榮奕工程實業有限公司、鉸泰營造  
有限公司、登煌營造有限公司、昶清營造有限公司、昌吉營造股份有限公司  
副本：萬銘工程科技股份有限公司、臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司、宇泰工程  
顧問有限公司

負責人 劉進輝



# 義力營造股份有限公司

## 職業安全衛生暨環保協議組織會議規範之事項

主辦機關	臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司
監造/承辦廠商	宇泰工程顧問有限公司/義力營造股份有限公司/萬銘工程科技股份有限公司
承攬工程	臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程- 土方交換管制及推整委託專業服務
主席人員	工作小組負責人張景菴

### 協議組織會議：

本公司經基隆港務分公司委託實行臺北商港物流倉儲區填海造地計畫第三、四期造地工程，而為防止職業災害，於 115 年 1 月 7 日召開協議組織會議。

### 本次會議之紀錄：

#### 一、本會議依職業安全衛生法第二十七條規定召開

本法第二十七條第一項第一款規定之協議組織，應由原事業單位召集之，並定期或不定期進行協議下列事項：

1. 安全衛生管理之實施及配合。
2. 勞工作業安全衛生及健康管理規範。
3. 從事動火、高架、開挖、爆破、高壓電活線等危險作業之管制。
4. 對進入局限空間、有害物作業等作業環境之作業管制。
5. 電氣機具入廠管制。
6. 作業人員進場管制。
7. 變更管理。
8. 劃一危險性機械之操作信號、工作場所標識(示)、有害物空容器放置、警報、緊急避難方法及訓練等。
9. 使用打樁機、拔樁機、電動機械、電動器具、軌道裝置、乙炔熔接裝置、電弧熔接裝置、換氣裝置及沉箱、架設通道、施工架、工作架台等機械、設備或構造物時，應協調使用上之安全措施。
10. 其他認有必要之協調事項。

#### 二、進場作業之現場概況及危害告知事項

1. 非相關作業人員、車輛，請勿進入工作場所。
  2. 工區內如每十分鐘平均風速達每秒十公尺(六級風)或瞬間風速達十級，或遇異常極端天候變化，判斷現況危害人員車輛安全，將暫停收容作業採滾動式調整恢復作業。
  3. 維持車輛後退警報器、後退燈之功能正常。
  4. 遵守行車路線、不得任意超車、超速，並維持進出動線有充分視線淨空。
  5. 作業人員於工區內行走時，應避免跑步，並注意行駛中之車輛。
  6. 作業人員應依作業項目配戴所需之防護用具；禁止飲酒、赤膊、赤腳或穿拖鞋工作。  
\* 作業場所之進場動線隨時有所變動，屬於臨水作業。
1. 請各單位對所屬進場人員實施安全衛生教育訓練。
  2. 進場人員、車輛應依照現場管制人員指示進場，開啟及覆蓋防塵網並接受必要之抽驗及檢查。
  3. 進場車輛每日應詳細檢查各項裝置，確保其功能正常，並保持車內對講機暢通無誤。

# 義力營造股份有限公司

## 職業安全衛生暨環保協議組織會議規範之事項

4. 進場車輛倒車時務必遵守現場管制人員指揮，並保持煞車安全距離。
5. 車輛下料前，確認車斗之車鉤有無開啟。
6. 載運內容物沾黏車斗內，需要現場操作手協助處理者，應事先協調並依其指示操作，不得再經過管制站重複進場；於現場處理有困難者，一律運回該出土端處理，不得於其他場所任意棄置內容物，以免遭受民眾檢舉。
7. 出場車輛必須清洗乾淨後，始得出場。

### 三、各進場單位應配合及遵守之事項（逐項告知）

1. 各進場單位應於每上下半月進場前主動繳交「工作環境施工危害因素告知單」（新進單位之第一份告知單於進場第一天內繳交完成即可，此後比照各進場單位辦理），並對所屬進場之作業人員進行危害因素告知及教育訓練；繳交後如有新進作業人員者，務必對其另行上述告知、訓練及補交該部分之告知單；未如期繳交者，將暫停進場至確實繳交後再進場（即列入暫停工程辦理）。
2. 進場車輛之土方切勿裝載過滿，避免滲漏、掉出車斗污染路面，違規者記點 0.2 點，如發現有污染作業場所內外路面，該進場單位應調派水車清洗受污染之路面，該進場單位將暫停進場至確實改善受污染之路面後再進場（即列入暫停工程辦理）。
3. 請各進場單位代表人員務必出席本會議，未參加本協議組織會議至下次正式會議止，將列入暫停工程辦理，未參加協議組織仍有進場需求者，請公共工程主辦機關來函港公司敘明原因及預防措施，經同意後始得以記點方式進場。
4. 為響應政府節能減碳政策，110 年 5 月開始，原紙本郵寄協議組織開會通知單及會議記錄將改以填寫 google 表單登記電子郵件地址後寄發，以下為電子郵件寄送填寫網址及 QR CODE，新進單位或資料修改，請自行填寫。



<https://forms.gle/pqHfQVWGR2E2Gzo67>

5. 進場車輛前後車牌號碼（含車斗後壁）如有模糊不清而造成辨識困難者，應確實改善；傾卸土方後應待現場操作手完成落地檢查且車斗完全平放再離開。
6. 本收土端僅收容 B1~B6 土質之土方，不收容其餘廢棄物（如 AC 塊或鋼筋），違規者將以退車辦理。
7. B5 土質混凝土塊應破碎處理至 10 公分以下再進場，如工地有特殊情形、盡力分類、分離處理後仍混雜不同類別土方者（B1~B6 類）公共工程主辦機關得向港公司專案申請並提出相關佐證資料，經港公司同意收容，始可進場。
8. 電子聯單紙本隨車單欄位之修正，屬手寫錯誤者，應加蓋其工地負責人章（主任章）修正。原修改三處需換單已刪除該項規定。
9. 內政部國土管理署同步完成「電子聯單系統（網頁版及 APP 版）」建置並已正式上線，並自 115 年 1 月 1 日生效。電子聯單系統相關操作詳營建剩餘土石方資訊服務中心網站線上數位學習查詢說明（<https://www.soilmove.tw/soilmove/elearning>）

### 四、其他應注意之事項（逐項告知）

1. 車輛行經工區內外之轉彎處、有鋪設鐵板處、有人員作業處或洗車台通道時，應放慢車速以策安全，違規者記 0.2 點當日暫停再進場。

# 義力營造股份有限公司

## 職業安全衛生暨環保協議組織會議規範之事項

2. 進場車輛於管制站交單檢查後，必須覆蓋防塵網才能至傾卸區傾卸土方；空車出場必須駛出洗車台後才能覆蓋防塵網，以便錄影存查，違規者記 0.2 點當日暫停再進場
3. 載運車輛違反以下規定者，每次違規記點 0.2 點，該車輛將暫停當日再進場：
  - (1) 人員與提送名冊不符
  - (2) 使用逾期通行證
  - (3) 司機隨意丟棄廢棄物
  - (4) 司機下車未穿戴合格個人防護具
  - (5) 車輛超載(未逾 40 公噸)
  - (6) 載運土石方溢滿、洩漏
  - (7) 車牌損毀、污損、變造無法辨識且不可即時修復
  - (8) 未覆蓋防塵網及防塵網未下拉至 15 公分以上
  - (9) 進場土質混雜，可即時分離
  - (10) 夾雜可分離廢棄物
  - (11) 含 10 公分以上 B5 類土石方，可即時分離
  - (12) 未聽從現場管制人員指揮，任意傾倒
  - (13) 未遵守行車路線任意超車超速
  - (13) 出場車輛未清洗、未經洗車台
  - (14) 進出場未打開或未覆蓋防塵網並接受必要之檢查。
4. 載運車輛違反以下規定者，每次違規記點 1 點，原車退回，暫停該車輛進場，提供 GPS 後始得解除管制：
  - (1) 進場土質與運送憑證不符
  - (2) 運送時間明顯不符且未能提供相關佐證資料
  - (3) 車輛未裝設即時追蹤系統或無正常運作
  - (4) 進場土質混雜且不可即時分離
  - (5) 夾雜不可收容物品(廢棄物)且不可即時分離
  - (6) 土石方表面浮油
  - (7) 車輛嚴重超載(超載 40 公噸以上)違規記點，無退車
  - (8) 未辦理通行證
  - (9) 違反相關規定，屢犯或違規情節重大
5. 退車之車輛應依規定於隔日提供前往收土端及返回出土端之路線軌跡圖(彩色列印並加蓋其主辦機關章)，未能提供者將暫停進場至確實提供後再進場。
6. 累計違規記點達 3 點，該單位將暫停進場 3 天；第二次再累計違規記點達 3 點，則暫停進場 5 天；第三次即暫停進場 7 天，依此類推。當日同一違規事件退車達三車次，即暫停案件當日再進場(後續車輛取消進場、聯單作廢)。
7. 車輛進場須依「國際商港港區通行證申請及使用須知」申請人員及車輛港區通行證。
8. 出土期間應派自主管制人員至收土端辨識土方運送憑證真偽，並確認車載土方之土質與出土端相符、數量與憑證相符。
9. 派駐自主管制人員於進場前一日預先申報當日進場之轄管案件及車次後使得進場，當日進場轄管案件應以五件為限，自主管制人員代檢查非當日轄管之案件且經查屬實者，港公司得要求公共工程主辦機關更換自主管制人員。
10. 如經查證所載運之土石方來源非申請之工區，私自提供憑證予他案使用，或經抽驗確認土壤污染管制標準超標，則立即暫停該案土方收容，由公共工程主辦機關查證違規之土方全數運離並沒收全額保證金。
11. 本案環評承諾要求承包商所僱用之運輸車輛應符合 4 期、5 期排放標準，或符合 3 期排放標準並加裝濾煙器，請各出土單位管控進場車輛。
12. 內政部國土管理署於 114 年 7 月 18 日訂頒「營建剩餘土石方清除機具應裝置即時追蹤系統規範」，清運車輛裝置之即時追蹤系統(GPS 車機系統)應符合「全國營建剩餘土石方即時追蹤流向管控系統」規格規範型式，請各單位配合宣導辦理。詳「營建剩餘土石方資訊服務中心」網站最新消息(<https://soilmove.nlma.gov.tw/>)
13. 本會議之會議紀錄及開會通知，請各收件單位務必轉達其營造廠商所屬出土端；協議組織開會通知單於土方交換平台、LINE 廠商群組及電子郵件上登載及寄發，請各單位自行下載。

# 義力營造股份有限公司

## 職業安全衛生暨環保協議組織會議規範之事項

### 五、各進場單位提出之反映事項

問：電子聯單隨車單數量核對問題，因國土署系統未優化以致操作繁鎖，是否可領回或以電子檔方式提供？

答：請各單位反應國土署優化操作系統並提供其相關配套措施以便查詢下載，本案後端仍留存電子掃描檔，如有需求，暫訂請各單位向各自駐場簽單人員提出協助，以單一窗口提供，避免過多單位混亂造成收容端困擾。後續如有其他提供方式將另行公告。

### 六、主席人員宣導及辦理之事項

1. 當日同一違規事件退車達三車次，即暫停案件當日再進場(後續車輛取消進場、聯單作廢)，請出土單位應依規定維持土方品質，避免因退車造成取消進場後續清運車輛遭受管控。
2. 因本案為填海造地工程，收容場所電子聯單電子圍籬定位位置無法正確圈圍，請各主辦機關反應國土署討論後續相關問題。
3. 電子聯單紙本隨車單如修改土質，應加蓋其工地負責人(主任)章修正，以異常方式進場，車輛管控。
4. 電子聯單如內容資訊(工程名稱、收容場所...等)與土方交換系統不符應予以修正，保持內容一致性。
5. 如工地遭遇突發性極端天候影響，危害人員車輛安全，將暫停作業採滾動式調整恢復收容，於暫停期間，出土端應配合收容端調整調派清運車輛出場，避免造成後續收容端困擾。

### 七、主辦機關指示及辦理之事項

1. 為維持港區安寧，減少噪音源，土車進港後非必要，請勿亂鳴按喇叭。
2. 車輛進入港區，請依規定限速放慢行駛，司機應保持行車禮節，車輛匯流處應維持專注，勿急躁，以維護其他用路人安全。
3. 清運車輛於道路行駛，應依相關規定定期清洗車輛，保持清潔，避免遭受民眾檢舉。
4. 台北港行政大樓 8 樓會議室租借不易，請與會人員保持環境衛生，禁止飲食，勿亂丟垃圾。
5. 如土車經地磅站過磅，出土機關應檢具過磅前、中、後照片，以證明未加減土方之行為。若查證未經上述條件進入中繼站將依臺北港收容土石方作業規定，第 1 次將暫停該案土方交換作業 15 天，第 2 次則拒絕該案土方交換作業。
6. 本年度歲修時程預計於 115 年 2 月 9 日起-13 日止，適逢年假 2 月 14 日-21 日，於 2 月 22 日(年初六)恢復土方收容，2 月 28 日暫停收容 1 日，2 月份暫停收容共計 14 天，請各單位預先規劃歲修停收前準備。

下次協議組織會議預計於 115 年 2 月 4 日召開

吳桐昌 1/8

張景貴 1/8




# 義力營造股份有限公司

## 臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程-

### 土方交換管制及推整委託專業服務

115 年 1 月 7 日職業安全衛生暨環保協議組織會議照片

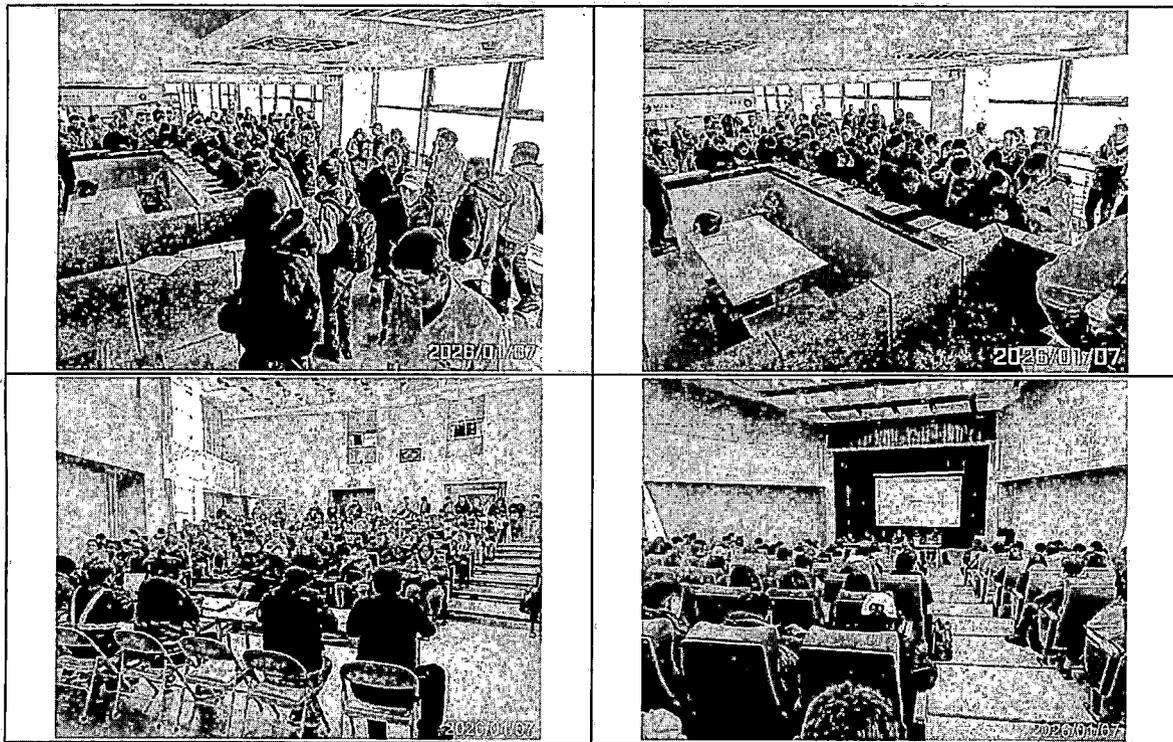

臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程

土方交換管制及推整委託專業服務

職業安全衛生暨環保協議組織會議簽到表

會議時間：115年1月7日(星期三)下午2點

會議地點：臺北港行政大樓8樓會議室

主席人員：工作小組負責人張景富

出席/進場單位(標案縮寫)：

Table with columns: 主辦機關, 監造單位, 承辦廠商, 出席人員簽到, 出席人員簽退. Includes entries for 臺灣港務股份有限公司, 宇泰工程顧問有限公司, 義力營造股份有限公司, etc.

臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程

土方交換管制及推整委託專業服務

職業安全衛生暨環保協議組織會議簽到表

會議時間：115年1月7日(星期三)下午2點

會議地點：臺北港行政大樓8樓會議室

主席人員：工作小組負責人張景富

出席/進場單位(標案縮寫)：

Table with columns: 出席人員簽到, 出席人員簽退. Includes entries for EXC22482, EYG03895, EYF30956, etc.

臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程

土方交換管制及推整委託專業服務

職業安全衛生暨環保協議組織會議簽到表

會議時間：115年1月7日(星期三)下午2點

會議地點：臺北港行政大樓8樓會議室

主席人員：工作小組負責人張景富

出席/進場單位(標案縮寫)：

Table with columns: 出席人員簽到, 出席人員簽退. Includes entries for EXE15622, EYD11183, EYI12328, etc.

臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程

土方交換管制及推整委託專業服務

職業安全衛生暨環保協議組織會議簽到表

會議時間：115年1月7日(星期三)下午2點

會議地點：臺北港行政大樓8樓會議室

主席人員：工作小組負責人張景富

出席/進場單位(標案縮寫)：

Table with columns: 出席人員簽到, 出席人員簽退. Includes entries for EYI26687, EYB10775, EYI02183, etc.

臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程

土方交換管制及推整委託專業服務

職業安全衛生暨環保協議組織會議簽到表

會議時間：115年1月7日(星期三)下午2點

會議地點：臺北港行政大樓8樓會議室

主席人員：工作小組負責人張景富

出席/進場單位(標案縮寫)：

Table with columns for unit name, personnel, and attendance status. Includes entries like EYE07586, EYK27064, EYK27541, etc.

臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程

土方交換管制及推整委託專業服務

職業安全衛生暨環保協議組織會議簽到表

會議時間：115年1月7日(星期三)下午2點

會議地點：臺北港行政大樓8樓會議室

主席人員：工作小組負責人張景富

出席/進場單位(標案縮寫)：

Table with columns for unit name, personnel, and attendance status. Includes entries like LVA04632, EYG14655, EYG26259, etc.

臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程

土方交換管制及推整委託專業服務

職業安全衛生暨環保協議組織會議簽到表

會議時間：115年1月7日(星期三)下午2點

會議地點：臺北港行政大樓8樓會議室

主席人員：工作小組負責人張景富

出席/進場單位(標案縮寫)：

Table with columns for unit name, personnel, and attendance status. Includes entries like LYF09300, LYI18359, EYH19392, etc.

臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程

土方交換管制及推整委託專業服務

職業安全衛生暨環保協議組織會議簽到表

會議時間：115年1月7日(星期三)下午2點

會議地點：臺北港行政大樓8樓會議室

主席人員：工作小組負責人張景富

出席/進場單位(標案縮寫)：

Table with columns for unit name, personnel, and attendance status. Includes entries like EYI24668, EYI02123, EYC04534, etc.



臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程

土方交換管制及推整委託專業服務

職業安全衛生暨環保協議組織會議簽到表

會議時間：115年1月7日(星期三)下午2點

會議地點：臺北港行政大樓8樓會議室

主席人員：工作小組負責人張景富

出席/進場單位(標案縮寫)：

Table with columns: 標案縮寫, 出席人員簽到, 出席人員簽退, 標案縮寫. Lists various construction projects and attendees.

臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程

土方交換管制及推整委託專業服務

職業安全衛生暨環保協議組織會議簽到表

會議時間：115年1月7日(星期三)下午2點

會議地點：臺北港行政大樓8樓會議室

主席人員：工作小組負責人張景富

出席/進場單位(標案縮寫)：

Table with columns: 標案縮寫, 出席人員簽到, 出席人員簽退, 標案縮寫. Lists various construction projects and attendees.

臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程

土方交換管制及推整委託專業服務

職業安全衛生暨環保協議組織會議簽到表

會議時間：115年1月7日(星期三)下午2點

會議地點：臺北港行政大樓8樓會議室

主席人員：工作小組負責人張景富

出席/進場單位(標案縮寫)：

Table with columns: 標案縮寫, 出席人員簽到, 出席人員簽退, 標案縮寫. Lists various construction projects and attendees.

臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程

土方交換管制及推整委託專業服務

職業安全衛生暨環保協議組織會議簽到表

會議時間：115年1月7日(星期三)下午2點

會議地點：臺北港行政大樓8樓會議室

主席人員：工作小組負責人張景富

出席/進場單位(標案縮寫)：

Table with columns: 標案縮寫, 出席人員簽到, 出席人員簽退, 標案縮寫. Lists various construction projects and attendees.

臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程  
土方交換管制及推整委託專業服務

職業安全衛生暨環保協議組織會議簽到表

會議時間：115年1月7日(星期三)下午2點

會議地點：臺北港行政大樓8樓會議室

主席人員：工作小組負責人張景富

出席/進場單位(標案縮寫)：

出席人員簽到

出席人員簽退

委託商簽到

標案縮寫	出席人員簽到	出席人員簽退	委託商簽到
臺灣P/S深埋土水工(約69KV GIS及埋管)	EYK25614	昇昇營造工程有限公司	張元
漢陽路及中環路及步路工程(三合土填土及埋管)	EWI05596	瑞豐營造有限公司	
161KV 埋管-埋管(埋管)3條地下管線埋管工程	EWI12658	瑞豐營造有限公司	王振發
南港路開闢人行環境改善(第二期)工程	EYD28599	盈發營造有限公司	洪智強
(113)新置行人行環境改善工程	EYF13169	盈發營造有限公司	洪智強
345KV 埋管-埋管#3#7度益益建設及埋管工程	EY125628	利源營造有限公司	張元
新北市永和地區污水下水管系統第二期第五-二標第六-1標埋管工程	EYF03269	萬祥工程有限公司	江榮堂
萬發營造有限公司	KYL 22783	萬發營造有限公司	張元
萬發營造有限公司	KYL09463	萬發營造有限公司	張元
南港區26路上新築工程	BWC09414	捷欣工程股份有限公司	李永發
CQ870區埋管	ERC01501	捷欣工程股份有限公司	李永發
北安路埋管工程	EYK04941	裕松營造有限公司	
新北市永和地區污水下水管系統第二期第五-1標工程	EYK23370 EYK10212	盈發營造有限公司	李永發
第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百	EWK20578	豐源營造有限公司	
114年淡水所管線工程	EYG17868	福承企業有限公司	李永發
114年淡水所管線用戶用水管線工程	EYG24999	福承企業有限公司	李永發
114年淡水所管線用戶用水管線工程	EYG24966	福承企業有限公司	李永發
114年淡水所管線用戶用水管線工程	EYE06760	順工工程股份有限公司	李永發

臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程  
土方交換管制及推整委託專業服務

職業安全衛生暨環保協議組織會議簽到表

會議時間：115年1月7日(星期三)下午2點

會議地點：臺北港行政大樓8樓會議室

主席人員：工作小組負責人張景富

出席/進場單位(標案縮寫)：

出席人員簽到

出席人員簽退

委託商簽到

標案縮寫	出席人員簽到	出席人員簽退	委託商簽到
淡水河北側沿河工程	EWJ31746	順工工程股份有限公司	張元
臺北港區大環路工程(第一期工程)	EYK16404	順工工程股份有限公司	
CQ850區埋管工程-永久管線埋管工程(第一期)	EQF15995	順工工程股份有限公司	張元
三區區管系統埋管工程	EYJ17517	豐源營造有限公司	張元
泰山區管線工程	EYK09431 EYK10404 EYK10086	豐源營造有限公司	張元
三區區管系統埋管工程(第二期)	EYJ22229	豐源營造有限公司	張元
三區區管系統埋管工程(第三期)	EWD09890	豐源營造有限公司	張元
三區區管系統埋管工程(第四期)	LWD17723	豐源營造有限公司	張元
三區區管系統埋管工程(第五期)	ETH14765	豐源營造有限公司	張元
三區區管系統埋管工程(第六期)	BXF20750	豐源營造有限公司	張元
三區區管系統埋管工程(第七期)	BXF20993	豐源營造有限公司	張元
三區區管系統埋管工程(第八期)	EYK09428	豐源營造有限公司	張元
三區區管系統埋管工程(第九期)	EWG20519	豐源營造有限公司	張元
三區區管系統埋管工程(第十期)	LX122821	豐源營造有限公司	張元
三區區管系統埋管工程(第十一期)	EYI08607	豐源營造有限公司	張元

臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程  
土方交換管制及推整委託專業服務

職業安全衛生暨環保協議組織會議簽到表

會議時間：115年1月7日(星期三)下午2點

會議地點：臺北港行政大樓8樓會議室

主席人員：工作小組負責人張景富

出席/進場單位(標案縮寫)：

出席人員簽到

出席人員簽退

委託商簽到

標案縮寫	出席人員簽到	出席人員簽退	委託商簽到
CQ890	EWB16686 EWJ31596	瑞豐營造有限公司	張元
666線	EXH07482	瑞豐營造有限公司	張元
6K+500-9K+100段平交路口渠化改善工程	EXH15864	瑞豐營造有限公司	張元
臺北港區大環路工程(第二期工程)	EYC03826 EYC03348 EYC03299	捷欣工程股份有限公司	李永發
臺北港區大環路工程(第三期工程)	LYG21320	捷欣工程股份有限公司	李永發
臺北港區大環路工程(第四期工程)	LWK07235	捷欣工程股份有限公司	李永發
臺北港區大環路工程(第五期工程)	EXC14526	捷欣工程股份有限公司	李永發
臺北港區大環路工程(第六期工程)	EYF19785	捷欣工程股份有限公司	李永發
臺北港區大環路工程(第七期工程)	LYH28119	捷欣工程股份有限公司	李永發
臺北港區大環路工程(第八期工程)	LYH27824 EYK18352	捷欣工程股份有限公司	李永發
臺北港區大環路工程(第九期工程)	EYH21797	捷欣工程股份有限公司	李永發
臺北港區大環路工程(第十期工程)	UF064958	捷欣工程股份有限公司	李永發
臺北港區大環路工程(第十一期工程)	EWA31864	捷欣工程股份有限公司	李永發

臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程  
土方交換管制及推整委託專業服務

職業安全衛生暨環保協議組織會議簽到表

會議時間：115年1月7日(星期三)下午2點

會議地點：臺北港行政大樓8樓會議室

主席人員：工作小組負責人張景富

出席/進場單位(標案縮寫)：

出席人員簽到

出席人員簽退

委託商簽到

標案縮寫	出席人員簽到	出席人員簽退	委託商簽到
臺北港區大環路工程(第十二期工程)	BWH28290 BWH28104 EWI12384	瑞豐營造有限公司	張元
臺北港區大環路工程(第十三期工程)	EXB21815	瑞豐營造有限公司	張元
臺北港區大環路工程(第十四期工程)	EXF05084	瑞豐營造有限公司	張元
臺北港區大環路工程(第十五期工程)	EKA30360	瑞豐營造有限公司	張元
臺北港區大環路工程(第十六期工程)	EXI20865	瑞豐營造有限公司	張元
臺北港區大環路工程(第十七期工程)	EYB25067	瑞豐營造有限公司	張元
臺北港區大環路工程(第十八期工程)	LYD30531	瑞豐營造有限公司	張元
臺北港區大環路工程(第十九期工程)	EYK13195	瑞豐營造有限公司	張元
臺北港區大環路工程(第二十期工程)	EYK06091	瑞豐營造有限公司	張元
臺北港區大環路工程(第二十一期工程)	EYH07159	瑞豐營造有限公司	張元
臺北港區大環路工程(第二十二期工程)	EYI03572	瑞豐營造有限公司	張元
臺北港區大環路工程(第二十三期工程)	KYL23424	瑞豐營造有限公司	張元
臺北港區大環路工程(第二十四期工程)	LUE26070	瑞豐營造有限公司	張元
臺北港區大環路工程(第二十五期工程)	EWD13952	瑞豐營造有限公司	張元
臺北港區大環路工程(第二十六期工程)	LVI13878	瑞豐營造有限公司	張元



