

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

義力營造股份有限公司 函

承辦人：吳毓昌
電話：0956607531
電子信箱：okd5413@earthpower.com.tw

受文者：臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司

發文日期：中華民國115年3月20日

發文字號：商港土方(三)字第1150320001號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：115年2月份協議組織會議紀錄及簽到表乙份

主旨：檢送115年3月4日召開「臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程-土方交換管制及推整委託專業服務」之115年3月份協議組織會議紀錄乙份，敬請 貴公司遵照會議紀錄辦理，請查照。


正本：九賀電氣工程有限公司、上溢營造股份有限公司、久年營造股份有限公司、久佳營造工程股份有限公司、久勝營造有限公司、大陸工程股份有限公司、日商鹿島營造股份有限公司台灣分公司、山豐營造股份有限公司、大勢承營造股份有限公司、川力營造有限公司、川億營造有限公司、工信工程股份有限公司、中華工程股份有限公司、日商大豐營造股份有限公司台灣分公司、日商奧村組營造股份有限公司台灣分公司、中華威霸營造有限公司、互助營造股份有限公司、日商華大林組營造股份有限公司台灣分公司、五嶺營造有限公司、仁德工程有限公司、元順營造股份有限公司、元漢營造有限公司、天泰工程有限公司、太暉營造股份有限公司、世久營造探勘工程股份有限公司、世芳開發有限公司、世登營造有限公司、世鷹工程有限公司、加豐營造有限公司、北昌營造股份有限公司、北翰營造有限公司、台正營造有限公司、正田營造股份有限公司、正鼎東開發營造有限公司、永青營造工程股份有限公司、永昶土木包工業有限公司、永馨營造有限公司、禾逸營造有限公司、地樺營造事業股份有限公司、安定營造有限公司、安倉營造股份有限公司、安鴻工程有限公司、成盟營造股份有限公司、旭源營造工程股份有限公司、有田營造股份有限公司、有泰營造股份有限公司、百輝營造有限公司、百豐營造股份有限公司、呈豐營造股份有限公司、壯為工程股份有限公司、宏民營造股份有限公司、宏昇營造股份有限公司、宏盛營造股份有限公司、宏匯營造工程股份有限公司、宏鋸工程有限公司、玖泰工程股份有限公司、見安營造股份有限公司、辰茂營造工程有限公司、亞太土石資源有限公司、亞億營造股份有限公司、京讚營造有限公司、承隆能源科技股份有限公司、拓和營造有限公司、旺邦營造股份有限公司、昇萌股份有限公司、昇達實業有限公司、昌吉營造股份有限公司、昌鉉工程股份有限公司、明秀營造有限公司、東丕營造股份有限公司、東源營造工程股份有限公司、東鈺營造股份有限公司、東鑫龍營造有限公司、松青營造有限公司、泛亞工程建設股份有限公司、芝銘有限公司、金助營造廠有限公司、長



友營造股份有限公司、長惟工業股份有限公司、長盛營造股份有限公司、長聖營造有限公司、長裕營造有限公司、俊曜工程有限公司、冠巨建設有限公司、冠君營造有限公司、冠勝工程有限公司、建國工程股份有限公司、建智營造有限公司、政東水電工程股份有限公司、春原營造股份有限公司、昱盛營造股份有限公司、昶清營造有限公司、泉億營造有限公司、皇昌營造股份有限公司、哲國營造有限公司、展慶營造股份有限公司、峻鴻營造有限公司、時基營造股份有限公司、晉煌營造有限公司、根基營造股份有限公司、桔原企業有限公司、泰億營造有限公司、益廣營造有限公司、祐邦工程有限公司、神緯營造有限公司、偉大建設股份有限公司、國盛電氣工程股份有限公司、國新營造股份有限公司、國裕建設工程股份有限公司、基強營造有限公司、崇偉營造工程股份有限公司、常泰有限公司、得豐電氣工程股份有限公司、捷琪企業有限公司、捷賀工程有限公司、晨鑫營造股份有限公司、淞源營造有限公司、淳家國際股份有限公司、盛河營造有限公司、盛泰開發實業有限公司、祥昌水管工程股份有限公司、統營營造股份有限公司、統鑫開發實業股份有限公司、造隆電氣工程股份有限公司、逢昌營造有限公司、凱鑫達營造股份有限公司、勝岳營造有限公司、勝泉工程有限公司、勝堡村營造工程股份有限公司、富士山營造有限公司、富民營造股份有限公司、歲騰營造股份有限公司、智發營造有限公司、朝洋營造有限公司、森業營造股份有限公司、港洲營造股份有限公司、登煌營造有限公司、翔禾管線工程有限公司、翔益營造有限公司、華志營造股份有限公司、華盛工程有限公司、華電聯網股份有限公司、詠源實業有限公司、陽光城市開發股份有限公司、雲順工程有限公司、順盛工程有限公司、順通聯合工程有限公司、勤曜電氣工程股份有限公司、敬沅企業股份有限公司、新安營造有限公司、新亞建設開發股份有限公司、輝昇營造工程有限公司、瑞健營造有限公司、瑞通營造有限公司、盟歲營造有限公司、祺鑫營造有限公司、萬基工程有限公司、萬達發開發股份有限公司、達欣工程股份有限公司、鉅松營造有限公司、鉅登營造工程有限公司、嘉昇昌實業有限公司、嘉歲營造工程有限公司、暢禾企業有限公司、榮工工程股份有限公司、榮奕工程實業有限公司、睿森營造有限公司、碧城興業股份有限公司、福呈營造股份有限公司、福旺營造股份有限公司、福清營造股份有限公司、福鑫營造有限公司、遠揚營造工程股份有限公司、銓陽工程有限公司、鉸泰營造有限公司、億東營造股份有限公司、墨格工程有限公司、寬聯營造股份有限公司、廣京營造有限公司、廣鎰營造有限公司、德承營造有限公司、慶陽室內裝修工程有限公司、慶霖營造股份有限公司、潤弘精密工程事業股份有限公司、稻田營造有限公司、韻笙營造有限公司、翰駿營造有限公司、興成營造有限公司、興磊資源回收股份有限公司、總行營造興業股份有限公司、鴻祥營造股份有限公司、鴻緯營造有限公司、曜鼎營造有限公司、豐皇營造有限公司、豐順營造股份有限公司、豐澤工程股份有限公司、豐譽營造股份有限公司、麒瑞營造股份有限公司、麒耀營造有限公司、麗高營造股份有限公司、麗寶工程顧問有限公司、耀鎡營造有限公司、馨澤工程有限公司、鎮沅有限公司、國隆營造股份有限公司、祥皓工程有限公司、和日盛有限公司、坤泉營造股份有限公司、弘鎰鋼營造有限公司、箴澤工程有限公司、加晟工程有限公司、聚人營造股份有限公司、威聖企業有限公司、競捷營造股份有限公司

副本：萬銘工程科技股份有限公司、臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司、宇泰工程顧問有限公司

負責人 劉進輝



義力營造股份有限公司

職業安全衛生暨環保協議組織會議規範之事項

主辦機關	臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司
監造/承辦廠商	宇泰工程顧問有限公司/義力營造股份有限公司/萬銘工程科技股份有限公司
承攬工程	臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程- 土方交換管制及推整委託專業服務
主席人員	工作小組負責人張景菖
協議組織會議： 本公司經基隆港務分公司委託實行臺北商港物流倉儲區填海造地計畫第三、四期造地工程，而為防止職業災害，於 115 年 3 月 4 日召開協議組織會議。	
本次會議之紀錄： 一、本會議依職業安全衛生法第二十七條規定召開 本法第二十七條第一項第一款規定之協議組織，應由原事業單位召集之，並定期或不定期進行協議下列事項： <ol style="list-style-type: none">1. 安全衛生管理之實施及配合。2. 勞工作業安全衛生及健康管理規範。3. 從事動火、高架、開挖、爆破、高壓電活線等危險作業之管制。4. 對進入局限空間、有害物作業等作業環境之作業管制。5. 電氣機具入廠管制。6. 作業人員進場管制。7. 變更管理。8. 劃一危險性機械之操作信號、工作場所標識（示）、有害物空容器放置、警報、緊急避難方法及訓練等。9. 使用打樁機、拔樁機、電動機械、電動器具、軌道裝置、乙炔熔接裝置、電弧熔接裝置、換氣裝置及沉箱、架設通道、施工架、工作架台等機械、設備或構造物時，應協調使用上之安全措施。10. 其他認有必要之協調事項。 二、進場作業之現場概況及危害告知事項 <ol style="list-style-type: none">1. 非相關作業人員、車輛，請勿進入工作場所。2. 工區內如每十分鐘平均風速達每秒十公尺(六級風)或瞬間風速達十級，或遇異常極端天候變化，判斷現況危害人員車輛安全，將暫停收容作業採滾動式調整恢復作業。3. 維持車輛後退警報器、後退燈之功能正常。4. 遵守行車路線、不得任意超車、超速，並維持進出動線有充分視線淨空。5. 作業人員於工區內行走時，應避免跑步，並注意行駛中之車輛。6. 作業人員應依作業項目配戴所需之防護用具；禁止飲酒、赤膊、赤腳或穿拖鞋工作。 * 作業場所之進場動線隨時有所變動，屬於臨水作業。 <ol style="list-style-type: none">1. 請各單位對所屬進場人員實施安全衛生教育訓練。2. 進場人員、車輛應依照現場管制人員指示進場，開啟及覆蓋防塵網並接受必要之抽驗及檢查。3. 進場車輛每日應詳細檢查各項裝置，確保其功能正常，並保持車內對講機暢通無誤。	

義力營造股份有限公司

職業安全衛生暨環保協議組織會議規範之事項

4. 進場車輛倒車時務必遵守現場管制人員指揮，並保持煞車安全距離。
5. 車輛下料前，確認車斗之車鈎有無開啟。
6. 載運內容物沾黏車斗內，需要現場操作手協助處理者，應事先協調並依其指示操作，不得再經過管制站重複進場；於現場處理有困難者，一律運回該出土端處理，不得於其他場所任意棄置內容物，以免遭受民眾檢舉。
7. 出場車輛必須清洗乾淨後，始得出場。

三、各進場單位應配合及遵守之事項（逐項告知）

1. 各進場單位應於每上下半月進場前主動繳交「工作環境施工危害因素告知單」（新進單位之第一份告知單於進場第一天內繳交完成即可，此後比照各進場單位辦理），並對所屬進場之作業人員進行危害因素告知及教育訓練；繳交後如有新進作業人員者，務必對其另行上述告知、訓練及補交該部分之告知單；未如期繳交者，將暫停進場至確實繳交後再進場（即列入暫停工程辦理）。
2. 進場車輛之土方切勿裝載過滿，避免滲漏、掉出車斗污染路面，違規者記點 0.2 點，如發現有污染作業場所內外路面，該進場單位應調派水車清洗受污染之路面，該進場單位將暫停進場至確實改善受污染之路面後再進場（即列入暫停工程辦理）。
3. 請各進場單位代表人員務必出席本會議，未參加本協議組織會議至下次正式會議止，將列入暫停工程辦理，未參加協議組織仍有進場需求者，請公共工程主辦機關來函港公司敘明原因及預防措施，經同意後始得以記點方式進場。
4. 為響應政府節能減碳政策，110 年 5 月開始，原紙本郵寄協議組織開會通知單及會議記錄將改以填寫 google 表單登記電子郵件地址後寄發，以下為電子郵件寄送填寫網址及 QR CODE，新進單位或資料修改，請自行填寫。



<https://forms.gle/pqHfQVWGR2E2Gzo67>

5. 進場車輛前後車牌號碼（含車斗後壁）如有模糊不清而造成辨識困難者，應確實改善；傾卸土方後應待現場操作手完成落地檢查且車斗完全平放再離開。
6. 本收土端僅收容 B1~B6 土質之土方，不收容其餘廢棄物（如 AC 塊或鋼筋），違規者將以退車辦理。
7. B5 土質混凝土塊應破碎處理至 10 公分以下再進場，如工地有特殊情形、盡力分類、分離處理後仍混雜不同類別土方者（B1~B6 類）公共工程主辦機關得向港公司專案申請並提出相關佐證資料，經港公司同意收容，始可進場。
8. 電子聯單紙本隨車單欄位之修正，屬手寫錯誤者，應加蓋其工地負責人章（主任章）修正。原修改三處需換單已刪除該項規定。
9. 內政部國土管理署同步完成「電子聯單系統（網頁版及 APP 版）」建置並已正式上線，並自 115 年 1 月 1 日生效。電子聯單系統相關操作詳營建剩餘土石方資訊服務中心網站線上數位學習查詢說明 (<https://www.soilmove.tw/soilmove/elearning>)

四、其他應注意之事項（逐項告知）

1. 車輛行經工區內外之轉彎處、有鋪設鐵板處、有人員作業處或洗車台通道時，應放慢車速以策安全，違規者記 0.2 點當日暫停再進場。

義力營造股份有限公司

職業安全衛生暨環保協議組織會議規範之事項

2. 進場車輛於管制站交單檢查後，必須覆蓋防塵網才能至傾卸區傾卸土方；空車出場必須駛出洗車台後才能覆蓋防塵網，以便錄影存查，違規者記 0.2 點當日暫停再進場
3. 載運車輛違反以下規定者，每次違規記點 0.2 點，該車輛將暫停當日再進場：
 - (1)人員與提送名冊不符(2)使用逾期通行證(3)司機隨意丟棄廢棄物(4)司機下車未穿戴合格個人防護具(5)車輛超載(未逾 40 公噸)(6)載運土石方溢滿、洩漏(7)車牌損毀、污損、變造無法辨識且不可即時修復(8)未覆蓋防塵網及防塵網未下拉至 15 公分以上(9)進場土質混雜，可即時分離(10)夾雜可分離廢棄物(11)含 10 公分以上 B5 類土石方，可即時分離 (12)未聽從現場管制人員指揮，任意傾倒(13)未遵守行車路線任意超車超速(14)出場車輛未清洗、未經洗車台(15)進出場未打開或未覆蓋防塵網並接受必要之檢查。
4. 載運車輛違反以下規定者，每次違規記點 1 點，原車退回，暫停該車輛進場，提供 GPS 後始得解除管制：
 - (1)進場土質與運送憑證不符(2)運送時間明顯不符且未能提供相關佐證資料(3)車輛未裝設即時追蹤系統或無正常運作(4)進場土質混雜且不可即時分離(5)夾雜不可收容物品(廢棄物)且不可即時分離 (6)土石方表面浮油(7)車輛嚴重超載(超載 40 公噸以上)違規記點，無退車(8)未辦理通行證(9)違反相關規定，屢犯或違規情節重大
5. 退車之車輛應依規定於隔日提供前往收土端及返回出土端之路線軌跡圖(彩色列印並加蓋其主辦機關章)，未能提供者將暫停進場至確實提供後再進場。
6. 累計違規記點達 3 點，該單位將暫停進場 3 天；第二次再累計違規記點達 3 點，則暫停進場 5 天；第三次即暫停進場 7 天，依此類推。當日同一違規事件退車達三車次，即暫停案件當日再進場(後續車輛取消進場、聯單作廢)。
7. 車輛進場須依「國際商港港區通行證申請及使用須知」申請人員及車輛港區通行證。
8. 出土期間應派自主管制人員至收土端辨識土方運送憑證真偽，並確認車載土方之土質與出土端相符、數量與憑證相符。
9. 派駐自主管制人員於進場前一日預先申報當日進場之轄管案件及車次後使得進場，當日進場轄管案件應以五件為限，自主管制人員代檢查非當日轄管之案件且經查屬實者，港公司得要求公共工程主辦機關更換自主管制人員。
10. 如經查證所載運之土石方來源非申請之工區，私自提供憑證予他案使用，或經抽驗確認土壤污染管制標準超標，則立即暫停該案土方收容，由公共工程主辦機關查證違規之土方全數運離並沒收全額保證金。
11. 本案環評承諾要求承包商所僱用之運輸車輛應符合 4 期、5 期排放標準，或符合 3 期排放標準並加裝濾煙器，請各出土單位管控進場車輛。
12. 內政部國土管理署於 114 年 7 月 18 日訂頒「營建剩餘土石方清除機具應裝置即時追蹤系統規範」，清運車輛裝置之即時追蹤系統(GPS 車機系統)應符合「全國營建剩餘土石方即時追蹤流向管控系統」規格規範型式，請各單位配合宣導辦理。詳「營建剩餘土石方資訊服務中心」網站最新消息 (<https://soilmove.nlma.gov.tw/>)
13. 本會議之會議紀錄及開會通知，請各收件單位務必轉達其營造廠商所屬出土端；協議組織開會通知單於土方交換平台、LINE 廠商群組及電子郵件上登載及寄發，請各單位自行下載。

義力營造股份有限公司

職業安全衛生暨環保協議組織會議規範之事項

五、各進場單位提出之反映事項

無

六、主席人員宣導及辦理之事項

1. 出土單位現場人員於電子聯單資訊輸入請再三確認，如下列狀況將以退車辦理：
 - (1). 車籍資料與進場車輛不符。
 - (2). 未執行出場完成電子聯單紀錄。
 - (3). 載運土質與電子聯單系統不符。
2. 本場區提供車斗清理區供卸土後有整理需求之土石方載運車輛進行簡易清理，使用單位應負職業安全衛生管理之責（如人員應著合格之安全防護裝備、使用合格上下之設備、自備清理工具並妥善保管等）；如經職業安全衛生主管機關裁罰，將移請違規之出土機關給付罰金（鍰），並暫停該案之清理作業。
3. 本場區僅提供場區執行土方收受及推整服務，出土機關應確保土石方載運車輛、司機及自主管制人員於臺北港執行土方交換作業時，皆有投保相關意外責任險；倘於本場區發生意外事件，應有保險公司負擔處理貴單位施工團隊應負之責。

七、主辦機關指示及辦理之事項

1. 為維持港區安寧，減少噪音源，土車進港後非必要，請勿亂鳴按喇叭。
2. 車輛進入港區，請依規定限速放慢行駛，司機應保持行車禮節，車輛匯流處應維持專注，勿急躁，以維護其他用路人安全。
3. 土方裝載切勿超過車斗高度，進場車輛應符合法規防塵網下拉 15cm 以上，並依場內規定留意防塵網開啟及覆蓋時機，違反規定車輛當日暫停再進場。清運車輛於道路行駛，應依相關規定定期清洗車輛，保持清潔，避免遭受民眾檢舉。
4. 台北港行政大樓 8 樓會議室租借不易，請與會人員保持環境衛生，禁止飲食，勿亂丟垃圾。
5. 如土車經地磅站過磅，出土機關應檢具過磅前、中、後照片，以證明未加減土方之行為。若查證未經上述條件進入中繼站將依臺北港收容土石方作業規定，第 1 次將暫停該案土方交換作業 15 天，第 2 次則拒絕該案土方交換作業。
6. 115 年 3 月正常收容，無停收日程。預計 4 月 4 日及 5 日，適逢清明連假暫停收容 2 日，請各單位預先規劃停收前準備。

下次協議組織會議預計於 115 年 4 月 1 日召開

吳振島 3/5


張景嵩 3/5

義力營造股份有限公司

臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程-

土方交換管制及推整委託專業服務

115年3月4日職業安全衛生暨環保協議組織會議照片

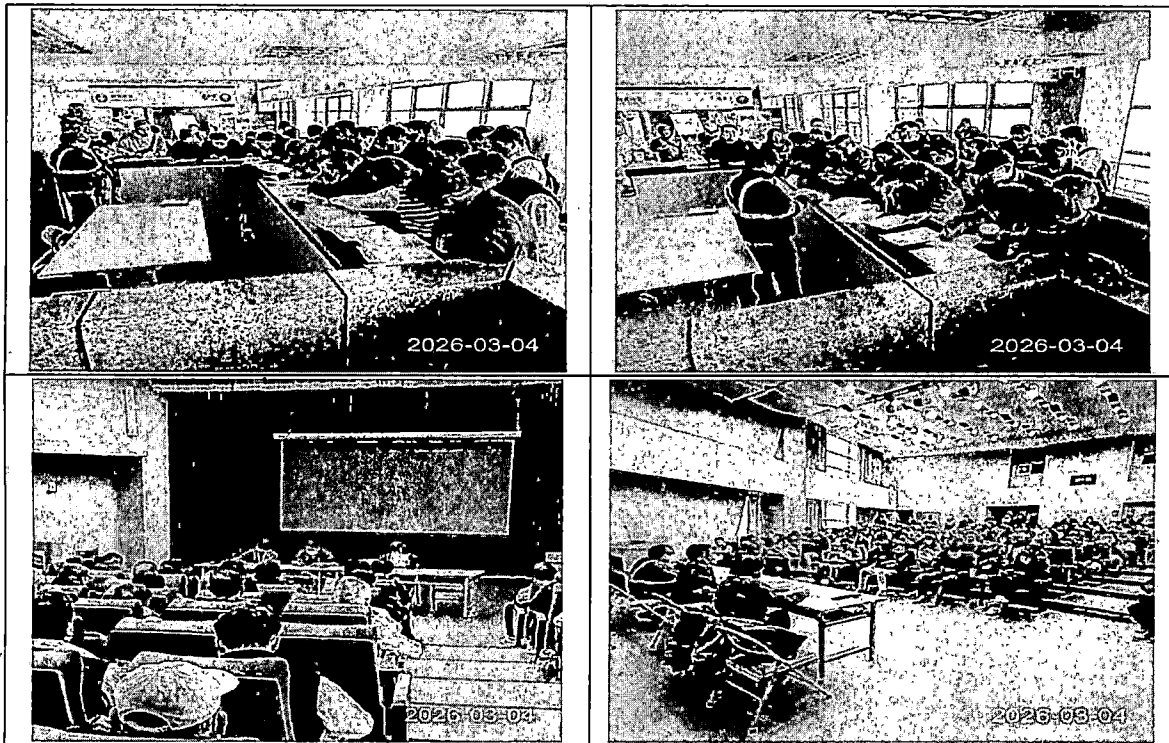

臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程

土方交換管制及推整委託專業服務

職業安全衛生暨環保協議組織會議簽到表

會議時間：115年3月4日(星期三)下午2點

會議地點：臺北港行政大樓8樓會議室

主席人員：工作小組負責人張景蒼

出席/進場單位(標案縮寫)：

Table with columns: 主辦機關, 監造單位, 承辦廠商, 出席人員簽到, 出席人員簽退. Includes entries for 臺灣港務股份有限公司, 宇泰工程顧問有限公司, 義力營造股份有限公司, etc.

臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程

土方交換管制及推整委託專業服務

職業安全衛生暨環保協議組織會議簽到表

會議時間：115年3月4日(星期三)下午2點

會議地點：臺北港行政大樓8樓會議室

主席人員：工作小組負責人張景蒼

出席/進場單位(標案縮寫)：

Table with columns: 出席人員簽到, 出席人員簽退. Includes entries for 久謙營造有限公司, 大陸工程股份有限公司, etc.

臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程

土方交換管制及推整委託專業服務

職業安全衛生暨環保協議組織會議簽到表

會議時間：115年3月4日(星期三)下午2點

會議地點：臺北港行政大樓8樓會議室

主席人員：工作小組負責人張景蒼

出席/進場單位(標案縮寫)：

Table with columns: 出席人員簽到, 出席人員簽退. Includes entries for 大陸工程股份有限公司, 山景營造股份有限公司, etc.

臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程

土方交換管制及推整委託專業服務

職業安全衛生暨環保協議組織會議簽到表

會議時間：115年3月4日(星期三)下午2點

會議地點：臺北港行政大樓8樓會議室

主席人員：工作小組負責人張景蒼

出席/進場單位(標案縮寫)：

Table with columns: 出席人員簽到, 出席人員簽退. Includes entries for 互勤營造-日商聯大林組, 互勤營造-日商聯大林組聯合承攬, etc.

臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程

土方交換管制及推整委託專業服務

職業安全衛生暨環保協議組織會議簽到表

會議時間：115年3月4日(星期三)下午2點

會議地點：臺北港行政大樓8樓會議室

主席人員：工作小組負責人張景蒼

Table with columns: 出席/進場單位(標案縮寫), 出席人員簽到, 出席人員簽退, 備委託書頁. Includes entries for various construction projects like '中興路/558路大安山161KV線路開關設備更新工程'.

臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程

土方交換管制及推整委託專業服務

職業安全衛生暨環保協議組織會議簽到表

會議時間：115年3月4日(星期三)下午2點

會議地點：臺北港行政大樓8樓會議室

主席人員：工作小組負責人張景蒼

Table with columns: 出席/進場單位(標案縮寫), 出席人員簽到, 出席人員簽退, 備委託書頁. Includes entries for projects like '114年度山區道路改善及修繕工程(士林、北投)'.

臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程

土方交換管制及推整委託專業服務

職業安全衛生暨環保協議組織會議簽到表

會議時間：115年3月4日(星期三)下午2點

會議地點：臺北港行政大樓8樓會議室

主席人員：工作小組負責人張景蒼

Table with columns: 出席/進場單位(標案縮寫), 出席人員簽到, 出席人員簽退, 備委託書頁. Includes entries for projects like '新北市林口區林林路392號林口原區(8區)東區全球能源全球綠建築設計新工程'.

臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程

土方交換管制及推整委託專業服務

職業安全衛生暨環保協議組織會議簽到表

會議時間：115年3月4日(星期三)下午2點

會議地點：臺北港行政大樓8樓會議室

主席人員：工作小組負責人張景蒼

Table with columns: 出席/進場單位(標案縮寫), 出席人員簽到, 出席人員簽退, 備委託書頁. Includes entries for projects like '桃園市八德區廣興路1486-1487地號公共化兒童、大成路88-1、93地號公共化兒童及大成國小後門新建工程'.

臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程

土方交換管制及推整委託專業服務

職業安全衛生暨環保協議組織會議簽到表

會議時間：115年3月4日(星期三)下午2點
會議地點：臺北港行政大樓8樓會議室
主席人員：工作小組負責人張景富

Table with columns: 出席/進場單位(標案縮寫), 出席人員簽到, 出席人員簽退, 委託書編號. Lists various construction units and their representatives.

臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程

土方交換管制及推整委託專業服務

職業安全衛生暨環保協議組織會議簽到表

會議時間：115年3月4日(星期三)下午2點
會議地點：臺北港行政大樓8樓會議室
主席人員：工作小組負責人張景富

Table with columns: 出席/進場單位(標案縮寫), 出席人員簽到, 出席人員簽退, 委託書編號. Lists various construction units and their representatives.

臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程

土方交換管制及推整委託專業服務

職業安全衛生暨環保協議組織會議簽到表

會議時間：115年3月4日(星期三)下午2點
會議地點：臺北港行政大樓8樓會議室
主席人員：工作小組負責人張景富

Table with columns: 出席/進場單位(標案縮寫), 出席人員簽到, 出席人員簽退, 委託書編號. Lists various construction units and their representatives.

臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程

土方交換管制及推整委託專業服務

職業安全衛生暨環保協議組織會議簽到表

會議時間：115年3月4日(星期三)下午2點
會議地點：臺北港行政大樓8樓會議室
主席人員：工作小組負責人張景富

Table with columns: 出席/進場單位(標案縮寫), 出席人員簽到, 出席人員簽退, 委託書編號. Lists various construction units and their representatives.

臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程
土方交換管制及推整委託專業服務

職業安全衛生暨環保協議組織會議簽到表

會議時間：115年3月4日(星期三)下午2點
會議地點：臺北港行政大樓8樓會議室
主席人員：工作小組負責人張景富

出席/進場單位(標案縮寫)：	出席人員簽到	出席人員簽退	委託書號
基隆區管區管段114年內工區(開口)工程	EYL11000	祥品水電工程股份有限公司	
114年-115年原文山捷運所轄管段管段管段	EZB03645	祥品水電工程股份有限公司	
113-114年度文山捷運所轄管段管段管段	EYL18189	祥品水電工程股份有限公司	
114西區A管段改善工程	EZA23751	祥成工程股份有限公司	
石門前溪及四項區段改善工程	EZA19737	祥成營造有限公司	
國立臺灣大學學生宿舍供水工程	EWK18801	統整營造股份有限公司	
臺北城市發展局第一階段住宅新建工程	LVC27452	統整營造股份有限公司	
臺北城市發展局五成社會住宅新建工程	EUA22056	統整營造股份有限公司	
陽明山地區公共住宅斷面工程	ETE08587	統整營造股份有限公司	
桃園區管段111年內工區管段管段工程	EVF24415	統整營造股份有限公司	
桃園區管段113年內工區管段管段工程	EWK15633	統整營造股份有限公司	
桃園區管段113年內工區管段管段工程	EKK04647	統整營造股份有限公司	
桃園區管段114年內工區管段管段工程	EYF18489	統整營造股份有限公司	
桃園區管段112年內工區管段管段工程	EKB20923	統整營造股份有限公司	
台北區管段114年內工區管段管段工程	EYG25397	統整營造股份有限公司	
台北區管段114年內工區管段管段工程	EYE08654	統整營造股份有限公司	
台北區管段114年內工區管段管段工程	EVC18232	統整營造股份有限公司	
台北市區管段114年內工區管段管段工程	EYE13048	統整營造股份有限公司	
桃園區管段113年內工區管段管段工程	EXJ09917	統整營造股份有限公司	

臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程
土方交換管制及推整委託專業服務

職業安全衛生暨環保協議組織會議簽到表

會議時間：115年3月4日(星期三)下午2點
會議地點：臺北港行政大樓8樓會議室
主席人員：工作小組負責人張景富

出席/進場單位(標案縮寫)：	出席人員簽到	出席人員簽退	委託書號
桃園區管段114年內工區管段管段工程	EYF17311	統整營造股份有限公司	
桃園區管段114年內工區管段管段工程	EYF20574	統整營造股份有限公司	
桃園區管段113年內工區管段管段工程	EKK22979	統整營造股份有限公司	
桃園區管段112年內工區管段管段工程	EWK17234	統整營造股份有限公司	
桃園區管段113年內工區管段管段工程	EXD16079	統整營造股份有限公司	
清華大學台北校區修、繕宿舍北校區學院大樓修繕工程	LXF18137	統整營造股份有限公司	
新莊體育園區局段改善及開闢工程	EYJ03695	統整營造股份有限公司	
臺中區管段114年內工區管段管段工程	EYC28848	統整營造股份有限公司	
114年度新市鎮管段內管段、管段管段工程	EYC03685	統整營造股份有限公司	
115年度新市鎮管段內管段、管段管段工程	EZA08510	統整營造股份有限公司	
115年度新市鎮管段內管段、管段管段工程	EZA08480	統整營造股份有限公司	
115年度新市鎮管段內管段、管段管段工程	EZA08510	統整營造股份有限公司	
115年度新市鎮管段內管段、管段管段工程	EZA08480	統整營造股份有限公司	
114-115年度大港區管段管段管段工程	EYF09902	統整營造股份有限公司	
114年度新市鎮管段內管段、管段管段工程	EKC22354	統整營造股份有限公司	
安南區中老舊宿舍拆除工程(正德)工程	EYJ07381	統整營造股份有限公司	
陽明山地區管段管段管段工程	EYK15309	統整營造股份有限公司	
陽明山地區管段管段管段工程	EYK15142	統整營造股份有限公司	

臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程
土方交換管制及推整委託專業服務

職業安全衛生暨環保協議組織會議簽到表

會議時間：115年3月4日(星期三)下午2點
會議地點：臺北港行政大樓8樓會議室
主席人員：工作小組負責人張景富

出席/進場單位(標案縮寫)：	出席人員簽到	出席人員簽退	委託書號
陽明山地區管段管段管段工程	EYK15142	統整營造股份有限公司	
陽明山地區管段管段管段工程	EYK15309	統整營造股份有限公司	
陽明山地區管段管段管段工程	EXG04838	統整營造股份有限公司	
陽明山地區管段管段管段工程	EZA21457	統整營造股份有限公司	
陽明山地區管段管段管段工程	EYD11376	統整營造股份有限公司	
陽明山地區管段管段管段工程	EYD11358	統整營造股份有限公司	
陽明山地區管段管段管段工程	EYG24450	統整營造股份有限公司	
陽明山地區管段管段管段工程	LYG08132	統整營造股份有限公司	
陽明山地區管段管段管段工程	EYL17105	統整營造股份有限公司	
陽明山地區管段管段管段工程	EWK14014	統整營造股份有限公司	
E12-3地政改良工程	EYL08600	統整營造股份有限公司	
陽明山地區管段管段管段工程	EZA21235	統整營造股份有限公司	
陽明山地區管段管段管段工程	EYG11611	統整營造股份有限公司	
陽明山地區管段管段管段工程	EYF02426	統整營造股份有限公司	
陽明山地區管段管段管段工程	LW21180	統整營造股份有限公司	
陽明山地區管段管段管段工程	EYG07695	統整營造股份有限公司	

臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程
土方交換管制及推整委託專業服務

職業安全衛生暨環保協議組織會議簽到表

會議時間：115年3月4日(星期三)下午2點
會議地點：臺北港行政大樓8樓會議室
主席人員：工作小組負責人張景富

出席/進場單位(標案縮寫)：	出席人員簽到	出席人員簽退	委託書號
陽明山地區管段管段管段工程	EVC20203	統整營造股份有限公司	
陽明山地區管段管段管段工程	EYK20841	統整營造股份有限公司	
陽明山地區管段管段管段工程	EYK17017	統整營造股份有限公司	
陽明山地區管段管段管段工程	EYK24200	統整營造股份有限公司	
陽明山地區管段管段管段工程	EYK13981	統整營造股份有限公司	
陽明山地區管段管段管段工程	EYK24026	統整營造股份有限公司	
陽明山地區管段管段管段工程	EYF25833	統整營造股份有限公司	
陽明山地區管段管段管段工程	EYK13555	統整營造股份有限公司	
陽明山地區管段管段管段工程	EZA19855	統整營造股份有限公司	
陽明山地區管段管段管段工程	EZA19387	統整營造股份有限公司	
陽明山地區管段管段管段工程	EYJ30186	統整營造股份有限公司	
陽明山地區管段管段管段工程	KY124674	統整營造股份有限公司	
陽明山地區管段管段管段工程	EZA02231	統整營造股份有限公司	
陽明山地區管段管段管段工程	EYK10600	統整營造股份有限公司	
陽明山地區管段管段管段工程	EYL31818	統整營造股份有限公司	
陽明山地區管段管段管段工程	EKB27975	統整營造股份有限公司	
陽明山地區管段管段管段工程	EKK04173	統整營造股份有限公司	
陽明山地區管段管段管段工程	EWL12823	統整營造股份有限公司	
陽明山地區管段管段管段工程	EYJ07577	統整營造股份有限公司	

臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程

土方交換管制及推整委託專業服務

職業安全衛生暨環保協議組織會議簽到表

會議時間：115年3月4日(星期三)下午2點

會議地點：臺北港行政大樓8樓會議室

主席人員：工作小組負責人張景富

出席/進場單位(標案編號)：

出席人員簽到

出席人員簽退

委託費打勾

Table with columns for project name, ID, company, and attendance status. Includes entries like EYM22546, LKX12603, EPC28131, etc.

臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程

土方交換管制及推整委託專業服務

職業安全衛生暨環保協議組織會議簽到表

會議時間：115年3月4日(星期三)下午2點

會議地點：臺北港行政大樓8樓會議室

主席人員：工作小組負責人張景富

出席/進場單位(標案編號)：

出席人員簽到

出席人員簽退

委託費打勾

Table with columns for project name, ID, company, and attendance status. Includes entries like EYL15577, EYL18319, EZB03699, etc.

臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程

土方交換管制及推整委託專業服務

職業安全衛生暨環保協議組織會議簽到表

會議時間：115年3月4日(星期三)下午2點

會議地點：臺北港行政大樓8樓會議室

主席人員：工作小組負責人張景富

出席/進場單位(標案編號)：

出席人員簽到

出席人員簽退

委託費打勾

Table with columns for project name, ID, company, and attendance status. Includes entries like EYJ17517, EYK09431, EYK10404, etc.

臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程

土方交換管制及推整委託專業服務

職業安全衛生暨環保協議組織會議簽到表

會議時間：115年3月4日(星期三)下午2點

會議地點：臺北港行政大樓8樓會議室

主席人員：工作小組負責人張景富

出席/進場單位(標案編號)：

出席人員簽到

出席人員簽退

委託費打勾

Table with columns for project name, ID, company, and attendance status. Includes entries like UXJ22821, BYL17070, BZA08590, etc.

