



臺灣港務股份有限公司
Taiwan International Ports Corporation Ltd.
108.10.16 新聞稿

主題：南方澳跨港大橋無畏蘇澳地區陣雨綿綿，持續進行豆腐岬側橋面版試切割作業，並加開工作面提前切割移山路側 Y 型鋼樑

港務公司今（16）日持續以鑽石鏈鋸進行豆腐岬側橋面版試切割作業，以檢視調整切割機具之情況，因過程遭遇油管等障礙物影響，於上午 9 時在港務消防隊戒護下，會同中油公司確認無油氣危險，並加強消防設備後繼續切割作業，橋面版第一條切割線截至下午 4 時為止完成約 6 成，待試切割完成後，相關經驗即可反饋至後續切割作業，將有利於接續拆除作業之推展。

另為如期於 10 月 24 日切換新臨時航道，新臺勝 33 及 366 號亦正進行打撈前置工作，且為加速拆除作業，施工團隊並同步加開工面，提前進行移山路側之 Y 型鋼樑切割作業，後續俟鋼樑移除後，即可進行下方橋面板切割作業；現階段各項作業正積極展開，以期如期如質完成拆除工程。

提供單位	聯絡人	聯絡電話	E-mail Address
臺灣港務股份有限公司	沈光青副總工程司	0926-228-946	Jack2000@twport.com.tw

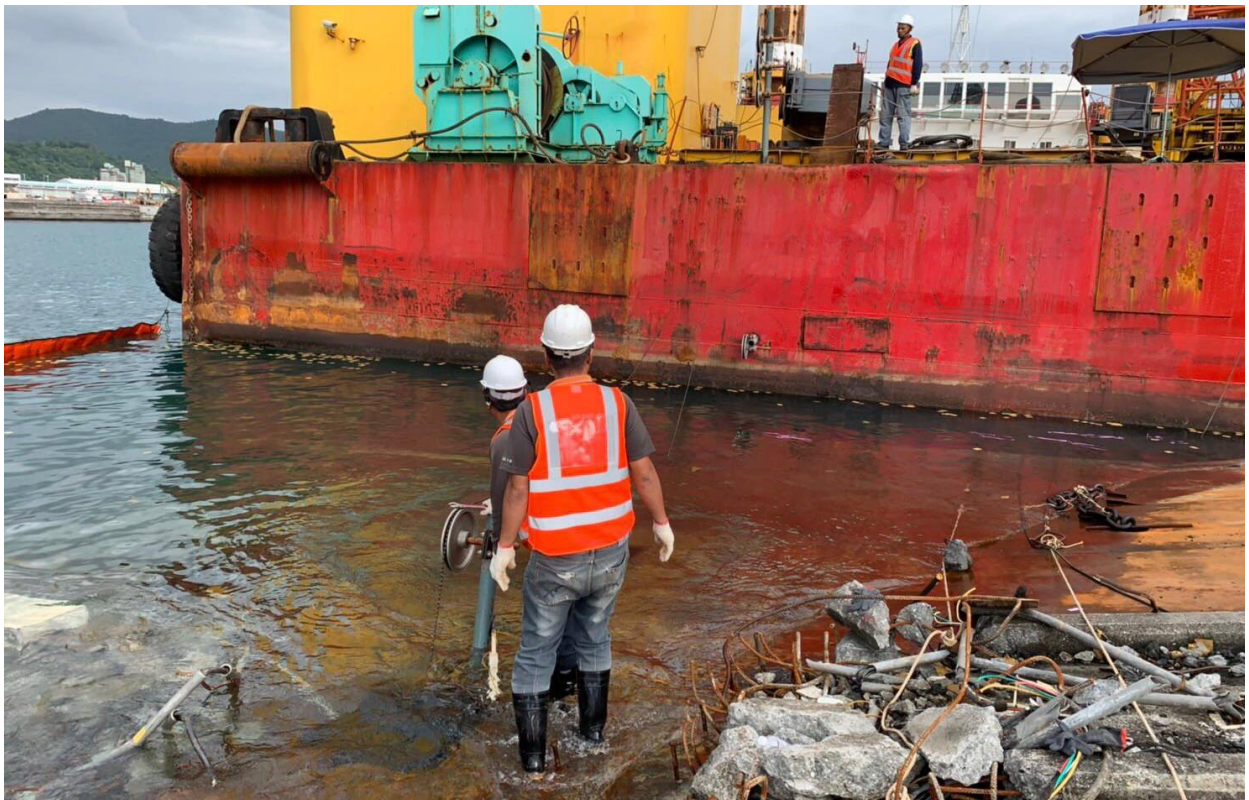


圖 1：鑽石鏈鋸切割橋面版施工狀況
