

抄本

檔 號：

保存年限：

臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司 函

機關地址：202202 基隆市中正區中正路1號

聯絡人：陳侑漢

聯絡電話：02-26196219

電子郵件：T04148@twport.com.tw

受文者：本分公司工程處

發文日期：中華民國115年6月2日

發文字號：基港工字第1152740536號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢送本分公司115年5月28日召開「臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程」收容營建剩餘土石方第19次會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本分公司115年5月20日基港工字第1152740480號開會通知單續辦。

正本：新北市政府工務局、新北市政府水利局、新北市政府農業局、新北市政府交通局、新北市政府消防局、新北市政府地政局、新北市政府體育局、新北市政府經濟發展局、新北市政府環境保護局、新北市政府城鄉發展局、新北市政府捷運工程局、新北市政府新建工程處、新北市政府養護工程處、新北市政府殯葬管理處、新北市政府警察局淡水分局、新北市政府違章建築拆除大隊、新北市政府漁業及漁港事業管理處、新北市板橋區公所、新北市汐止區公所、新北市新店區公所、新北市永和區公所、新北市中和區公所、新北市土城區公所、新北市三峽區公所、新北市樹林區公所、新北市林口區公所、新北市五股區公所、新北市八里區公所、新北市淡水區公所、新北市立圖書館、新北市立福和國民中學、新北市立新莊國民中學、新北市板橋區江翠國民小學、新北市板橋區板橋國民小學、新北市立新北高級工業職業學校、臺北市政府財政局、臺北市政府體育局、臺北市政府都市發展局、臺北市政府捷運工程局、臺北市政府捷運工程局第一區工程處、臺北市政府捷運工程局第二區工程處、臺北市政府工務局大地工程處、臺北市政府工務局水利工程處、臺北市政府工務局新建工程處、臺北市政府工務局衛生下水道工程處、臺北市政府工務局公園路燈工程管理處、臺北市政府地政局土地開發總隊、臺北市動物保護處、臺北市停車管理工程處、臺北市建築管理工程處、臺北自來水事業處、臺北自來水事業處工程總隊、臺北自來水事業處南區營業分處、臺北自來水事業處東區營業分處、臺北大眾捷運股份有限公司、臺北市住宅及都市更新中心、臺北市立動物園、臺北市立麗山國民中學、臺北市大同區大同國民小學、臺北市文山區永建國民小學、臺北市文山區興華國民小學、臺北市中山區大佳國民小學、桃園市政府水務局、桃園市政府地政局、桃園市政府經濟發展局、桃園市政府捷運工程局、桃園市政府新建工程處、桃園市政府養護工程處、桃園市政府建築管理處、桃園市政府住宅發展及都市更新處、桃園市中壢區公所、桃園市蘆竹區公所、桃園市桃園區會稽國民小學、桃園市觀音區草漯國

民小學、桃園市大溪區員樹林國民小學、基隆市政府、基隆市環境保護局、基隆市立體育場、基隆市中山區德和國民小學、基隆市立安樂高級中學、新竹市政府、新竹市政府工務處、臺灣臺北地方法院、經濟部、經濟部水利署北區水資源分署、經濟部水利署第十河川分署、經濟部中壢產業園區服務中心、台灣電力股份有限公司台北市區營業處、台灣電力股份有限公司台北北區營業處、台灣電力股份有限公司台北西區營業處、台灣電力股份有限公司台北南區營業處、台灣電力股份有限公司台北供電區營運處、台灣電力股份有限公司桃園區營業處、台灣電力股份有限公司新竹區營業處、台灣電力股份有限公司基隆區營業處、台灣電力股份有限公司綜合施工處、台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處北部施工處、台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處、台灣電力股份有限公司輸變電工程處中區施工處、台灣電力股份有限公司協和發電廠、台灣電力股份有限公司第二核能發電廠、台灣電力股份有限公司大潭發電廠、台灣自來水股份有限公司北區工程處、台灣自來水股份有限公司第一區管理處、台灣自來水股份有限公司第一區管理處文山營運所、台灣自來水股份有限公司第一區管理處基隆服務所、台灣自來水股份有限公司第一區管理處淡水營運所、台灣自來水股份有限公司第二區管理處、台灣自來水股份有限公司第二區管理處龜山服務所、台灣自來水股份有限公司第十二區管理處、台灣中油股份有限公司油品行銷事業部基隆營業處、台灣中油股份有限公司液化天然氣工程處、臺灣銀行股份有限公司、中華郵政股份有限公司、國營臺灣鐵路股份有限公司、農業部農田水利署瑠公管理處、交通部鐵道局、交通部鐵道局北部工程分局、交通部鐵道局北部工程分局第五工務段、交通部高速公路局第一新建工程分局、交通部高速公路局北區養護工程分局、交通部公路局北區公路新建工程分局、交通部公路局北區公路新建工程分局第三工務段、交通部公路局北區養護工程分局、交通部民用航空局臺北國際航空站、交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處、內政部、內政部資訊服務司、內政部土地重劃工程處、內政部國土管理署北區都市基礎工程分署、國防部憲兵指揮部、國防部政務辦公室、國防部軍備局工程營產中心北部地區工程營產處、陸軍第三地區支援指揮部、陸軍飛彈光電基地勤務廠、海軍陸戰隊指揮部、空軍松山基地指揮部、空軍通信航管資訊聯隊、國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家、國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家、國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局、國家人權博物館、國立歷史博物館、國家中山科學研究院、國家住宅及都市更新中心、國家鐵道博物館籌備處、國家表演藝術中心國家兩廳院、國立臺灣戲曲學院、國立故宮博物院、國立國父紀念館、衛生福利部樂生療養院、國立臺灣大學、國立臺灣大學醫學院附設醫院、國立臺灣藝術大學、國立臺北大學、國立臺北科技大學、國立清華大學、國立政治大學、國立陽明交通大學、國防大學、國立基隆高級商工職業學校、國防醫學大學三軍總醫院、國防醫學大學預防醫學研究所

副本：內政部國土管理署、宇泰工程顧問有限公司、義力營造股份有限公司、萬銘工程科技股份有限公司、臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司、本分公司臺北港營運處、工程處(均含附件)

「臺北商港物流倉儲區填海造地計畫第二期造地工程」

收容營建剩餘土石方第 19 次會議紀錄

壹、時間：115 年 5 月 28 日(星期四)上午 10 時

貳、地點：線上召開

參、主持人：本分公司工程處 章副處長伯全

紀錄：陳侑漢

肆、出席者：詳簽到單

伍、主辦單位報告：

一、本案土方交換執行情形報告：

- (一) 統計 114 年度臺北港收容各機關陸運營建餘土實際數量為 388.00 萬立方公尺；新北市政府 51.95 萬立方公尺、臺北市府 136.40 萬立方公尺、桃園市政府 21.64 萬立方公尺、基隆市政府 6.71 萬立方公尺及其他中央單位 171.30 萬立方公尺；其中收容非公共工程數量為 23.60 萬立方公尺；新北市政府 4.90 萬立方公尺、臺北市府 13.44 萬立方公尺及桃園市政府 5.26 萬立方公尺；各工程案件出土數量詳「附件 3-114 年度土石方收容數量一覽表」。
- (二) 本分公司對於各土方交換案件均無差別待遇且提供相同服務，爰請機關於各案申請土方交換數量時，應詳細評估需求後提出申請，切勿虛報，並依預定期程出土。
- (三) 已完成土方交換之案件，請來函申辦土方保證金退還並辦理結案；執行中土方交換案件詳「附件 4-執行中土方交換案件一覽表」。
- (四) 截至 115 年 4 月 30 日，臺北港已收容之陸運土石方達 140 萬方，可填築量能剩餘約 280 萬方，且 4 月起每日進場數量約 1.5 萬方（約 45 萬方／每月），如有提前達環評允收限額之虞，本分公司將啟動土方調節機制，採逐月評估土方實收狀況，以函文通知各單位調節時段（如周休 1 日、2 日等），避免衝擊北部地區工程推動。

二、土方交換作業優化說明：

- (一) 考量部分道挖作業出土量較低，及進場案件土石方基本數量一致性，本分公司自 115 年 7 月 1 日起以試辦方式，將公共工程及民間建案新案件基本數量皆下修為 600 立方公尺，其中資源處理場及混雜多土源之土方整理場維持為 600~9,600 立方公尺。

- (二) 本次下修係針對後續案件申請量放寬，舊有案件應依照土方交換同意書，基本數量維持 1,200 立方公尺；各案實際進場之數量如未達前述之基本數量，本分公司將於結案時開具土方差量繳費單，完成繳費後方可辦理退還土方保證金。
- (三) 考量每日皆有新土方交換案件申請進港填築，本分公司將於 6 月起，勞安協議組織會議由每週三召開調整為每上班日召開（線上會議），實際會議時間依本公司「臺北港物流倉儲區土方交換作業平台」公告為主；各單位應要求出席人員確實簽到，未簽到者視同未出席當次会议。
- (四) 「臺北港物流倉儲區土方交換作業平台」已啟動「申請土石方混雜土質收容」功能，自 115 年 7 月 1 日起將停止公文申請，全面改為線上平台審核作業，如工地有特殊情形無法確實分類者，請自平台進行申請；另本平台新增「申請工程案名變更」功能，如各案件有更名需求者，請善加利用本功能。
- (五) 本公司自 114 年 11 月起，增設土車車斗清理區供簡易清理、使用單位應負職業安全衛生管理之責；如經職業安全衛生主管機關裁罰，本分公司將移請違規之出土機關給付罰金（鍰），並暫停該案之清理作業。

三、宣導事項：

(一) 土石方收容管理：

- 1、臺北港可收容之公共工程營建剩餘土石方為 B1~B6 類土石方，不包括營建廢棄物，其中 B5 類剩餘土石方應破碎尺寸至 10 公分以下。
- 2、為配合中央土方去化政策，本分公司增設一處檢查站，用以緩解土車進場之尖峰時段，訂於 6 月 1 日起啟用；請各單位轄管案件之土方進場時，依收土端現場人員指揮排隊進場。
- 3、如轄管案件單日出土車次較多，請增派 1~2 名自主管制人員，確保進場作業順遂。
- 4、如司機於本公司收土作業區域有下車需求，應依規定戴有合格之安全帽及反光背心等安全裝備，違規者將依作業規定記點。

- 5、本公司僅提供場區執行土方收受及推整服務，出土單位應確保人員及車輛於臺北港執行土方交換作業時，皆有投保相關意外責任險；倘於本場區發生意外事件，應有保險公司負擔處理。
- 6、如本場區因異常天氣導致淹水時，將視情形通知進場車輛並公告於土方平台，更動收容區域或暫停收容，俟場區回復後重新啟動作業
- 7、如轄管工程（資源處理場除外）因故需至分類場或暫置場作業，應本於出土機關權責落實土源管理責任，避免非該工程或不合格土方運至臺北港，並土方運輸憑證之運輸路線起點應更改為該分類或暫置場。

（二）運輸管理：

- 1、土方進臺北港前之運送過程由出土機關負責管理，請各出土機關依規定執行車輛運輸管理，建議應自行辦理跟車查核作業；本場區嚴禁夾帶未經核准之土方進場，如檢查進場土方顏色及土質明顯不同，將視情況予以暫置並請出土機關說明，或逕予退車處理。
- 2、與本分公司進行土方交換之土方車輛駛離工區前，應先確認有無超載，運輸動線不得有至中繼站換土之行為，且進港前之路線應符合本造地計畫環評書件，原則以臺 61 及 64 線銜接臨港大道，由土車專用道駛入臺北港區，應避免中途轉入八里市區及重劃區等住宅區。
- 3、請各出土機關避免於上下班尖峰時段出土至臺北港填築，並規範土車行駛路徑應符合本案環評規定，如遇舉證車輛未依規定行駛，致影響八里區民眾生活，本分公司則視情節記點處理或暫停該案土方交換。
- 4、港區道路非僅供土車行駛，且設有會車路口，為確保港區行車安全，車輛於港區內行駛時應遵守限速，不得超速及違規超車。
- 5、本案設有即時現況影像，各單位可自本分公司「臺北港土方交換廉政平臺」參考使用：<https://kl.twport.com.tw/theme/Articles?a=2968>。
- 6、臺北港為空氣品質維護區，請各出土機關所轄工程用車輛，依公告事項管制措施辦理。
- 7、土方車輛運送軌跡紀錄依各公共工程主辦機關之文件保存規定存查以供調閱，本分公司將不定期抽查各土方交換案運送車輛之 GPS 行駛軌跡及派員參訪座談各案機關出土管理情形。

（三）其他事項：

- 1、各出土機關應於接獲本公司繳費單 15 天內，以繳款單繳納土方管理費，逾期未繳者將自次日起暫停收受，不另通知。本分公司僅接受一間繳納(代繳)單位，如一個工程案有數間清運商，應由出土機關協調一繳納(代繳)單位繳費。
- 2、響應無紙化政策，各單位於取得收容端流向管制編號後，請將補充資料 (工程基本資料表、無紅火蟻證明、土壤試驗報告、管制名冊...等)審訖後掃描成電子檔，依序上傳至本案資訊系統，經本分公司審查同意後即可啟動現場土方收容作業。
- 3、有關因工程估驗需檢附遠端監控輸出影像紀錄，非本分公司設立監控機制之目的，各工程餘土送達確認，應屬工程承攬廠商及監造單位之責。
- 4、進出港區之土方車輛應申辦定期/臨時通行證，並於進出港區時皆須感應通行證(定期)/身分證(臨時)條碼。

四、土方交換申請審查重點：詳「附件 5-臺北港土方交換案件申請審查重點」。

陸、廉政宣導

- 一、為避免臺北港填海造地工程發生土方收受弊端及不當外力干擾等情形，本分公司期藉由本廉政平臺之開設，建構跨域溝通管道，機先預防風險爭議，促進本公司與司法機構積極合作，排除不當外力干擾，確保公務員勇於任事，請各出土機關自律並遵守「公務員廉政倫理規範」，依法公正執行職務。
- 二、本分公司藉由廉政平臺(<https://kl.twport.com.tw/theme/Articles?a=679>)，供合理之解決方案，持續辦理資訊公開、定期集會、意見蒐集等作為，強化監督內控機制，防範可能弊端，建立透明廉能之土方收容作業環境，俾利臺北港長期發展及建設需求。

柒、會議結論

- 一、依主辦單位報告內容辦理。

二、本分公司自 115 年 7 月 1 日起以試辦方式，將新申請之公共工程及民間建案新案件基本數量皆下修為 600 立方公尺，其中資源處理場及混雜多土源之土方整理場維持為 600~9,600 立方公尺；舊有案件維持 1,200 立方公尺。

三、本分公司將於 6 月起，每上班日召開職業安全衛生協議組織會議（線上會議），實際會議時間依本公司「臺北港物流倉儲區土方交換作業平台」公告為主；各單位應要求出席人員確實簽到，未簽到者視同未出席當次會議。

四、「臺北港物流倉儲區土方交換作業平台」已啟動「申請土石方混雜土質收容」功能，自 115 年 7 月 1 日起將停止公文申請，如工地有特殊情形無法確實分類者，請至平台進行申請。

捌、散會：下午 11 時 30 分。(以下空白)

「臺北商港物流倉儲區填海造地計畫第二期造地工程」

收容營建剩餘土石方第 19 次會議紀錄

壹、時間：115 年 5 月 28 日(星期四)上午 10 時

貳、地點：線上召開

參、主持人：本分公司工程處 章副處長伯全

紀錄：陳侑漢

肆、出席者：詳簽到單

伍、主辦單位報告：

一、本案土方交換執行情形報告：

- (一) 統計 114 年度臺北港收容各機關陸運營建餘土實際數量為 388.00 萬立方公尺；新北市政府 51.95 萬立方公尺、臺北市府 136.40 萬立方公尺、桃園市政府 21.64 萬立方公尺、基隆市政府 6.71 萬立方公尺及其他中央單位 171.30 萬立方公尺；其中收容非公共工程數量為 23.60 萬立方公尺；新北市政府 4.90 萬立方公尺、臺北市府 13.44 萬立方公尺及桃園市政府 5.26 萬立方公尺；各工程案件出土數量詳「附件 3-114 年度土石方收容數量一覽表」。
- (二) 本分公司對於各土方交換案件均無差別待遇且提供相同服務，爰請機關於各案申請土方交換數量時，應詳細評估需求後提出申請，切勿虛報，並依預定期程出土。
- (三) 已完成土方交換之案件，請來函申辦土方保證金退還並辦理結案；執行中土方交換案件詳「附件 4-執行中土方交換案件一覽表」。
- (四) 截至 115 年 4 月 30 日，臺北港已收容之陸運土石方達 140 萬方，可填築量能剩餘約 280 萬方，且 4 月起每日進場數量約 1.5 萬方（約 45 萬方／每月），如有提前達環評允收限額之虞，本分公司將啟動土方調節機制，採逐月評估土方實收狀況，以函文通知各單位調節時段（如周休 1 日、2 日等），避免衝擊北部地區工程推動。

二、土方交換作業優化說明：

- (一) 考量部分道挖作業出土量較低，及進場案件土石方基本數量一致性，本分公司自 115 年 7 月 1 日起以試辦方式，將公共工程及民間建案新案件基本數量皆下修為 600 立方公尺，其中資源處理場及混雜多土源之土方整理場維持為 600~9,600 立方公尺。

- (二) 本次下修係針對後續案件申請量放寬，舊有案件應依照土方交換同意書，基本數量維持 1,200 立方公尺；各案實際進場之數量如未達前述之基本數量，本分公司將於結案時開具土方差量繳費單，完成繳費後方可辦理退還土方保證金。
- (三) 考量每日皆有新土方交換案件申請進港填築，本分公司將於 6 月起，勞安協議組織會議由每週三召開調整為每上班日召開（線上會議），實際會議時間依本公司「臺北港物流倉儲區土方交換作業平台」公告為主；各單位應要求出席人員確實簽到，未簽到者視同未出席當次会议。
- (四) 「臺北港物流倉儲區土方交換作業平台」已啟動「申請土石方混雜土質收容」功能，自 115 年 7 月 1 日起將停止公文申請，全面改為線上平台審核作業，如工地有特殊情形無法確實分類者，請自平台進行申請；另本平台新增「申請工程案名變更」功能，如各案件有更名需求者，請善加利用本功能。
- (五) 本公司自 114 年 11 月起，增設土車車斗清理區供簡易清理、使用單位應負職業安全衛生管理之責；如經職業安全衛生主管機關裁罰，本分公司將移請違規之出土機關給付罰金（鍰），並暫停該案之清理作業。

三、宣導事項：

(一) 土石方收容管理：

- 1、臺北港可收容之公共工程營建剩餘土石方為 B1~B6 類土石方，不包括營建廢棄物，其中 B5 類剩餘土石方應破碎尺寸至 10 公分以下。
- 2、為配合中央土方去化政策，本分公司增設一處檢查站，用以緩解土車進場之尖峰時段，訂於 6 月 1 日起啟用；請各單位轄管案件之土方進場時，依收土端現場人員指揮排隊進場。
- 3、如轄管案件單日出土車次較多，請增派 1~2 名自主管制人員，確保進場作業順遂。
- 4、如司機於本公司收土作業區域有下車需求，應依規定戴有合格之安全帽及反光背心等安全裝備，違規者將依作業規定記點。

- 5、本公司僅提供場區執行土方收受及推整服務，出土單位應確保人員及車輛於臺北港執行土方交換作業時，皆有投保相關意外責任險；倘於本場區發生意外事件，應有保險公司負擔處理。
- 6、如本場區因異常天氣導致淹水時，將視情形通知進場車輛並公告於土方平台，更動收容區域或暫停收容，俟場區回復後重新啟動作業
- 7、如轄管工程（資源處理場除外）因故需至分類場或暫置場作業，應本於出土機關權責落實土源管理責任，避免非該工程或不合格土方運至臺北港，並土方運輸憑證之運輸路線起點應更改為該分類或暫置場。

（二）運輸管理：

- 1、土方進臺北港前之運送過程由出土機關負責管理，請各出土機關依規定執行車輛運輸管理，建議應自行辦理跟車查核作業；本場區嚴禁夾帶未經核准之土方進場，如檢查進場土方顏色及土質明顯不同，將視情況予以暫置並請出土機關說明，或逕予退車處理。
- 2、與本分公司進行土方交換之土方車輛駛離工區前，應先確認有無超載，運輸動線不得有至中繼站換土之行為，且進港前之路線應符合本造地計畫環評書件，原則以臺 61 及 64 線銜接臨港大道，由土車專用道駛入臺北港區，應避免中途轉入八里市區及重劃區等住宅區。
- 3、請各出土機關避免於上下班尖峰時段出土至臺北港填築，並規範土車行駛路徑應符合本案環評規定，如遇舉證車輛未依規定行駛，致影響八里區民眾生活，本分公司則視情節記點處理或暫停該案土方交換。
- 4、港區道路非僅供土車行駛，且設有會車路口，為確保港區行車安全，車輛於港區內行駛時應遵守限速，不得超速及違規超車。
- 5、本案設有即時現況影像，各單位可自本分公司「臺北港土方交換廉政平臺」參考使用：<https://kl.twport.com.tw/theme/Articles?a=2968>。
- 6、臺北港為空氣品質維護區，請各出土機關所轄工程用車輛，依公告事項管制措施辦理。
- 7、土方車輛運送軌跡紀錄依各公共工程主辦機關之文件保存規定存查以供調閱，本分公司將不定期抽查各土方交換案運送車輛之 GPS 行駛軌跡及派員參訪座談各案機關出土管理情形。

（三）其他事項：

- 1、各出土機關應於接獲本公司繳費單 15 天內，以繳款單繳納土方管理費，逾期未繳者將自次日起暫停收受，不另通知。本分公司僅接受一間繳納(代繳)單位，如一個工程案有數間清運商，應由出土機關協調一繳納(代繳)單位繳費。
- 2、響應無紙化政策，各單位於取得收容端流向管制編號後，請將補充資料 (工程基本資料表、無紅火蟻證明、土壤試驗報告、管制名冊...等)審訖後掃描成電子檔，依序上傳至本案資訊系統，經本分公司審查同意後即可啟動現場土方收容作業。
- 3、有關因工程估驗需檢附遠端監控輸出影像紀錄，非本分公司設立監控機制之目的，各工程餘土送達確認，應屬工程承攬廠商及監造單位之責。
- 4、進出港區之土方車輛應申辦定期/臨時通行證，並於進出港區時皆須感應通行證(定期)/身分證(臨時)條碼。

四、土方交換申請審查重點：詳「附件 5-臺北港土方交換案件申請審查重點」。

陸、廉政宣導

- 一、為避免臺北港填海造地工程發生土方收受弊端及不當外力干擾等情形，本分公司期藉由本廉政平臺之開設，建構跨域溝通管道，機先預防風險爭議，促進本公司與司法機構積極合作，排除不當外力干擾，確保公務員勇於任事，請各出土機關自律並遵守「公務員廉政倫理規範」，依法公正執行職務。
- 二、本分公司藉由廉政平臺(<https://kl.twport.com.tw/theme/Articles?a=679>)，供合理之解決方案，持續辦理資訊公開、定期集會、意見蒐集等作為，強化監督內控機制，防範可能弊端，建立透明廉能之土方收容作業環境，俾利臺北港長期發展及建設需求。

柒、會議結論

- 一、依主辦單位報告內容辦理。

二、本分公司自 115 年 7 月 1 日起以試辦方式，將新申請之公共工程及民間建案新案件基本數量皆下修為 600 立方公尺，其中資源處理場及混雜多土源之土方整理場維持為 600~9,600 立方公尺；舊有案件維持 1,200 立方公尺。

三、本分公司將於 6 月起，每上班日召開職業安全衛生協議組織會議（線上會議），實際會議時間依本公司「臺北港物流倉儲區土方交換作業平台」公告為主；各單位應要求出席人員確實簽到，未簽到者視同未出席當次會議。

四、「臺北港物流倉儲區土方交換作業平台」已啟動「申請土石方混雜土質收容」功能，自 115 年 7 月 1 日起將停止公文申請，如工地有特殊情形無法確實分類者，請至平台進行申請。

捌、散會：下午 11 時 30 分。(以下空白)



臺灣港務股份有限公司

TAIWAN INTERNATIONAL PORTS CORP., LTD.

臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程

收容營建剩餘土石方第19次會議

主辦單位：基隆港務分公司

會議日期：115 年 5 月 28 日

簡報目錄

壹

收土狀況報告

貳

土方交換作業優化說明

參

宣導事項

肆

土方交換申請審查重點

伍

廉政宣導

壹、收土狀況報告(1/3)

一、個案收土數量

1. 統計 114 年臺北港收容各機關陸運營建餘土實際數量為388.00 萬立方公尺；新北市政府51.95 萬立方公尺、臺北市政府 136.40 萬立方公尺、桃園市政府21.64 萬立方公尺、基隆市政府 6.71 萬立方公尺及其他中央單位171.30 萬立方公尺。
2. 其中收容非公共工程數量為23.60 萬立方公尺；新北市政府4.90 萬立方公尺、臺北市政府 13.44 萬立方公尺及桃園市政府 5.26 萬立方公尺。
3. 各工程案詳細數量請參閱Google雲端檔案「114年度土石方進場數量.pdf」

壹、收土狀況報告(2/3)

一、個案收土數量

4. 本公司對於各土方交換案件均無差別待遇且提供相同服務，爰請機關於各案申請土方交換數量時，應詳細評估需求後提出申請，切勿虛報，並依預定期程出土。
5. 已完成土方交換之案件，請來函申辦土方保證金退還並辦理結案；目前仍在出土及尚未退還土方保證金之案件，請參考Google雲端檔案「執行中土方交換案件一覽表.pdf」。

壹、收土狀況報告(3/3)

一、個案收土數量

6. 截至115年4月30日，臺北港已收容之陸運土石方達140萬方，可填築量能剩餘約280萬方，且4月起每日進場數量約1.5萬方（約45萬方 / 每月），恐有提前達環評允收限額之虞。
7. 如經評估屬實，本分公司將**啟動土方調節機制**，採逐月評估土方實收狀況，以函文通知各單位調節時段（如周休1日、2日等），避免衝擊北部地區工程推動。

貳、土方交換作業優化說明(1/6)

一、下修土石方進場基本數量

1. 考量部分道挖作業出土量較低，及進場案件土石方基本數量一致性，本分公司自**115年7月1日**起以**試辦**方式，將**公共工程及民間建案新案件基本數量**皆下修為**600立方公尺**，其中資源處理場及混雜多土源之土方整理場維持為600～9,600立方公尺。
2. 本次下修係針對後續案件申請量放寬，**舊有案件**應依照土方交換同意書，基本數量維持1,200立方公尺。
3. 各案實際進場之數量如**未達前述之基本數量**，本分公司將於結案時開具**土方差量繳費單**，完成繳費後方可辦理退還土方保證金。

貳、土方交換作業優化說明(2/6)

二、職業安全衛生協議組織會議頻率調增

1. 考量每日皆有新土方交換案件申請進港填築，本公司將於6月起，由每週三召開**調整為每上班日召開（線上會議）**，實際會議時間依本公司「臺北港物流倉儲區土方交換作業平台>最新消息」公告為主。
2. 各單位應要求出席人員確實簽到，**未簽到者視同未出席當次會議**，依規定不得進場填築。

貳、土方交換作業優化說明(3/6)

二、職業安全衛生協議組織會議頻率調增 – 說明(1/2)

- 本案職業安全衛生協議組織會議主會於每月第1週三召開，未參加者，至下次主會召開前將不得進場。
- 如未出席但有進場需求者，需參加1次上班日召開之補簽會議，並確實簽到後使得進場。補簽會議係依據該主會內容及工區危害告知進行宣導。

例1：A工程案於115年8月5日參加協議組織會議（主會），隔日起至下次主會（9月2日）皆可進場。

公曆2026年八月 農曆丙午年 [馬年]						
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
十三 26	十四 27	十五 28	十六 29	十七 30	十八 31	十九 1
二十 2	廿一 3	廿二 4	廿三 5	廿四 6	立秋 廿五 7	廿六 8
廿七 9	廿八 10	廿九 11	三十 12	七月初一 13	初二 14	初三 15
初四 16	初五 17	初六 18	初七 19	初八 20	初九 21	初十 22
處暑 十一 23	十二 24	十三 25	十四 26	十五 27	十六 28	十七 29
十八 30	十九 31	二十 1	廿一 2	廿二 3	廿三 4	廿四 5

貳、土方交換作業優化說明(4/6)

二、職業安全衛生協議組織會議頻率調增 – 說明(2/2)

例 2：B 清淤案有進場需求，但未參加8月5日協議組織會議（主會），不得進場；爰於8月7日參加補簽會議並確實簽到，隔日(8/8)起使得進場，直至下主會(9月2日)。

公曆2026年八月 農曆丙午年 [馬年]						
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
十三 26	十四 27	十五 28	十六 29	十七 30	十八 31	十九 1
二十 2	廿一 3	廿二 4	廿三 5	廿四 6	廿五 7	廿六 8
廿七 9	廿八 10	廿九 11	三十 12	七月初一 13	初二 14	初三 15
初四 16	初五 17	初六 18	初七 19	初八 20	初九 21	初十 22
農曆十一 23	十二 24	十三 25	十四 26	十五 27	十六 28	十七 29
十八 30	十九 31	二十 1	廿一 2	廿二 3	廿三 4	廿四 5

例3：C 建案為新案件，於8月4日有進場需求，爰於8月3日參加補簽會議並確實簽到，隔日(8/4)得進廠填築，但僅限至8月5日，須參加8月5日之主會後，使得於8月6日繼續進場。

公曆2026年八月 農曆丙午年 [馬年]						
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
十三 26	十四 27	十五 28	十六 29	十七 30	十八 31	十九 1
二十 2	廿一 3	廿二 4	廿三 5	廿四 6	廿五 7	廿六 8
廿七 9	廿八 10	廿九 11	三十 12	七月初一 13	初二 14	初三 15
初四 16	初五 17	初六 18	初七 19	初八 20	初九 21	初十 22
農曆十一 23	十二 24	十三 25	十四 26	十五 27	十六 28	十七 29
十八 30	十九 31	二十 1	廿一 2	廿二 3	廿三 4	廿四 5

貳、土方交換作業優化說明(5/6)

三、土方平台新增 **土方混雜土質** 及 **工程案名變更** 申請功能

1. 本平台已啟動「申請土石方混雜土質收容」功能，自115年7月1日起將停止公文申請，全面改為線上平台審核作業，請自「臺北港物流倉儲區土方交換作業平台>各式申請>申請土石方混雜土質收容」進行申請。
2. 另本平台新增「申請工程案名變更」功能，如各案件有更名需求者，請善加利用本功能。

臺北港物流倉儲區土方交換作業平台

本年度剩餘量：2,519,028 M³



貳、土方交換作業優化說明(6/6)


四、增設車斗清理區

本公司自114年11月起，增設土車車斗清理區供簡易清理、使用單位應負職業安全衛生管理之責；如經職業安全衛生主管機關裁罰，本分公司將移請違規之出土機關給付罰金（鍰），並暫停該案之清理作業。



參、宣導事項(1/11)

一、土石方收容管理

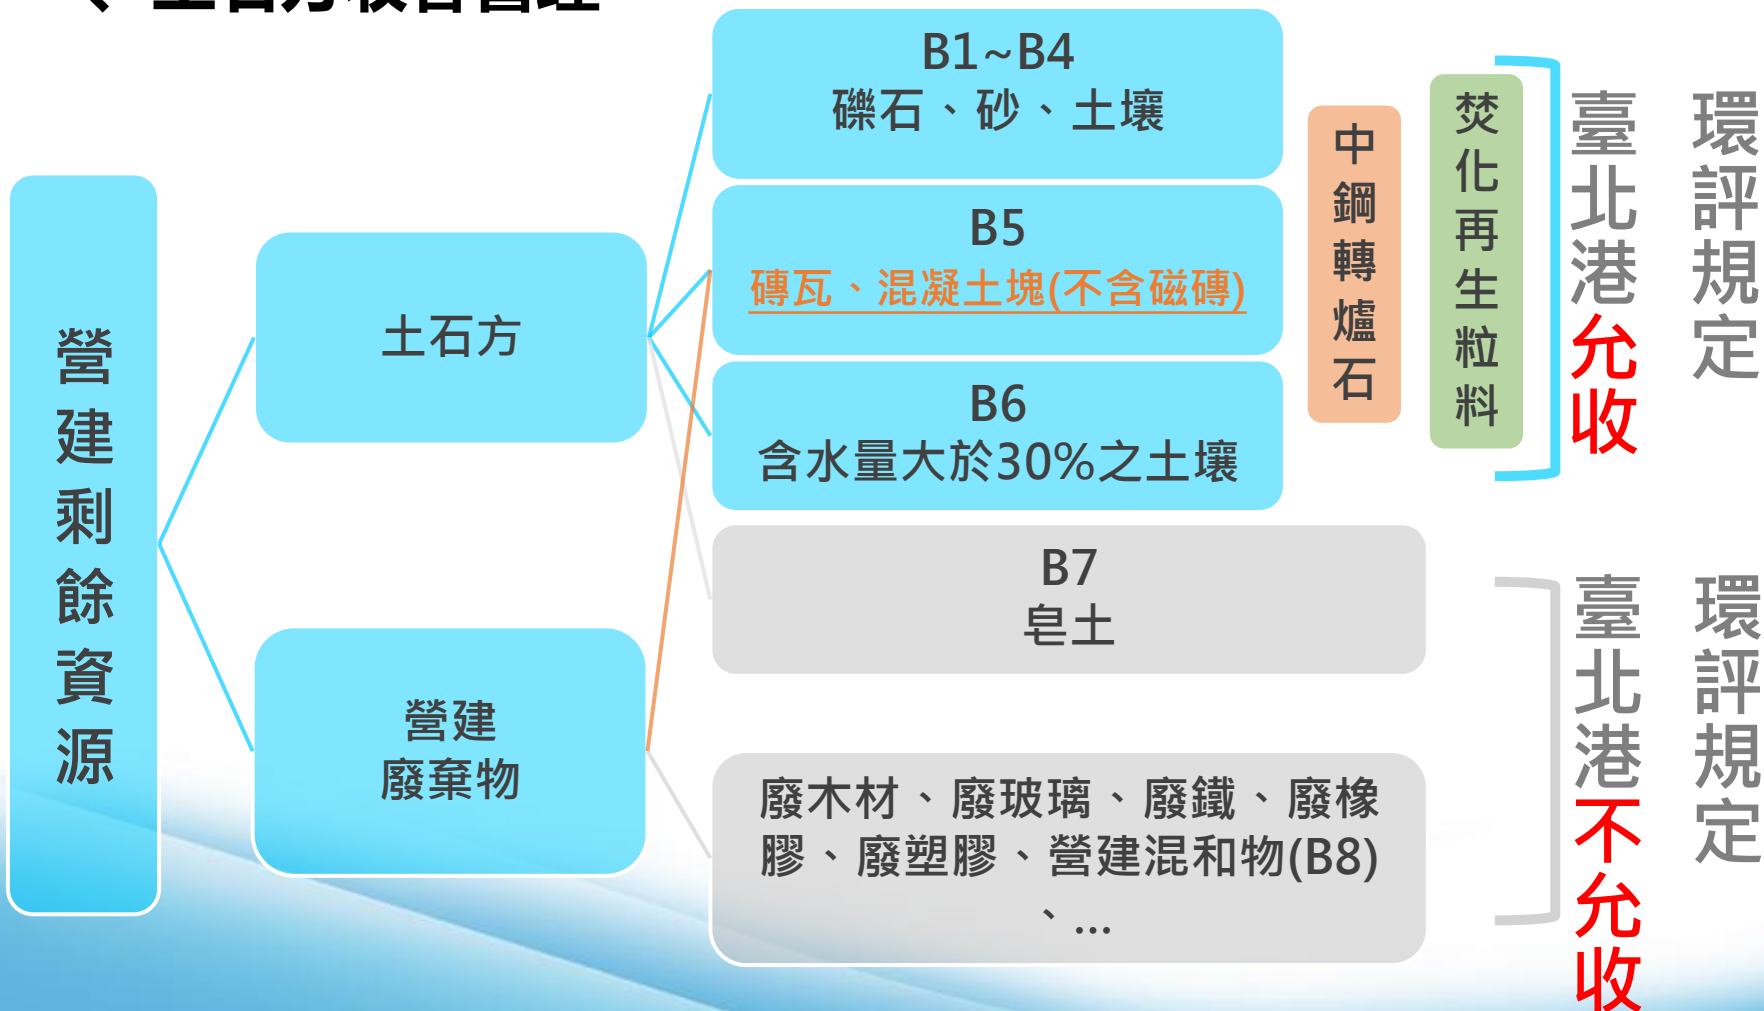

參、宣導事項(2/11)

一、土石方收容管理



B1

岩塊、礫石、碎石
或沙



B2-1

土壤與礫石及沙(土
壤體積<30%)



B2-2

土壤與礫石及沙(土
壤體積30%~50%)



B2-3

土壤與礫石及沙(土
壤體積>50%)



B3

粉土質土壤(沉泥)



B4

黏土質土壤



B5

磚塊、瓦或混凝土
塊



B6

淤泥或含水量大於
30%之土壤



B7

連續壁產生之皂土

不包含「磁磚」

臺北港不收容

參、宣導事項(3/11)

一、土石方收容管理

1. 為配合中央土方去化政策，本分公司**增設一處檢查站**，用以緩解土車進場之尖峰時段，預計於**6月1日起啟用**；請各單位轄管案件之土方進場時，依收土端現場人員指揮排隊進場，確保作業順遂。



參、宣導事項(4/11)

一、土石方收容管理

2. 如轄管案件單日出土車次較多，請增派1~2名自主管制人員確保進場作業順遂。
3. 如司機於本公司收土作業區域有下車需求，應依規定**戴有合格之安全帽及反光背心等安全裝備**，違規者將依作業規定記點。
4. 本公司僅提供場區執行土方收受及推整服務，出土單位應確保人員及車輛於臺北港執行土方交換作業時，皆有**投保相關意外責任險**；倘於本場區發生意外事件，應有保險公司負擔處理。

參、宣導事項(5/11)

一、土石方收容管理

5. 如本場區因異常天氣導致淹水時，將視情形通知進場車輛並公告於土方平台，更動收容區域或暫停收容，俟場區回復後重新啟動作業
6. 如轄管工程（資源處理場除外）因故需至分類場或暫置場作業，應本於出土機關權責**落實土源管理責任**，避免非該工程或不合格土方運至臺北港，並土方運輸憑證之運輸路線起點應更改為該分類或暫置場。

參、宣導事項(6/11)

二、運輸管理

收土機關

負責收土管理

收土品質確認、憑證檢核
、數量勾稽、收容證明

3



出土機關

負責出土土質及運輸管理

出土品質確認、運輸路線檢核、
跟車、避免中途換土

2


土方運輸



北北基桃

新增新竹縣市、宜蘭縣

1

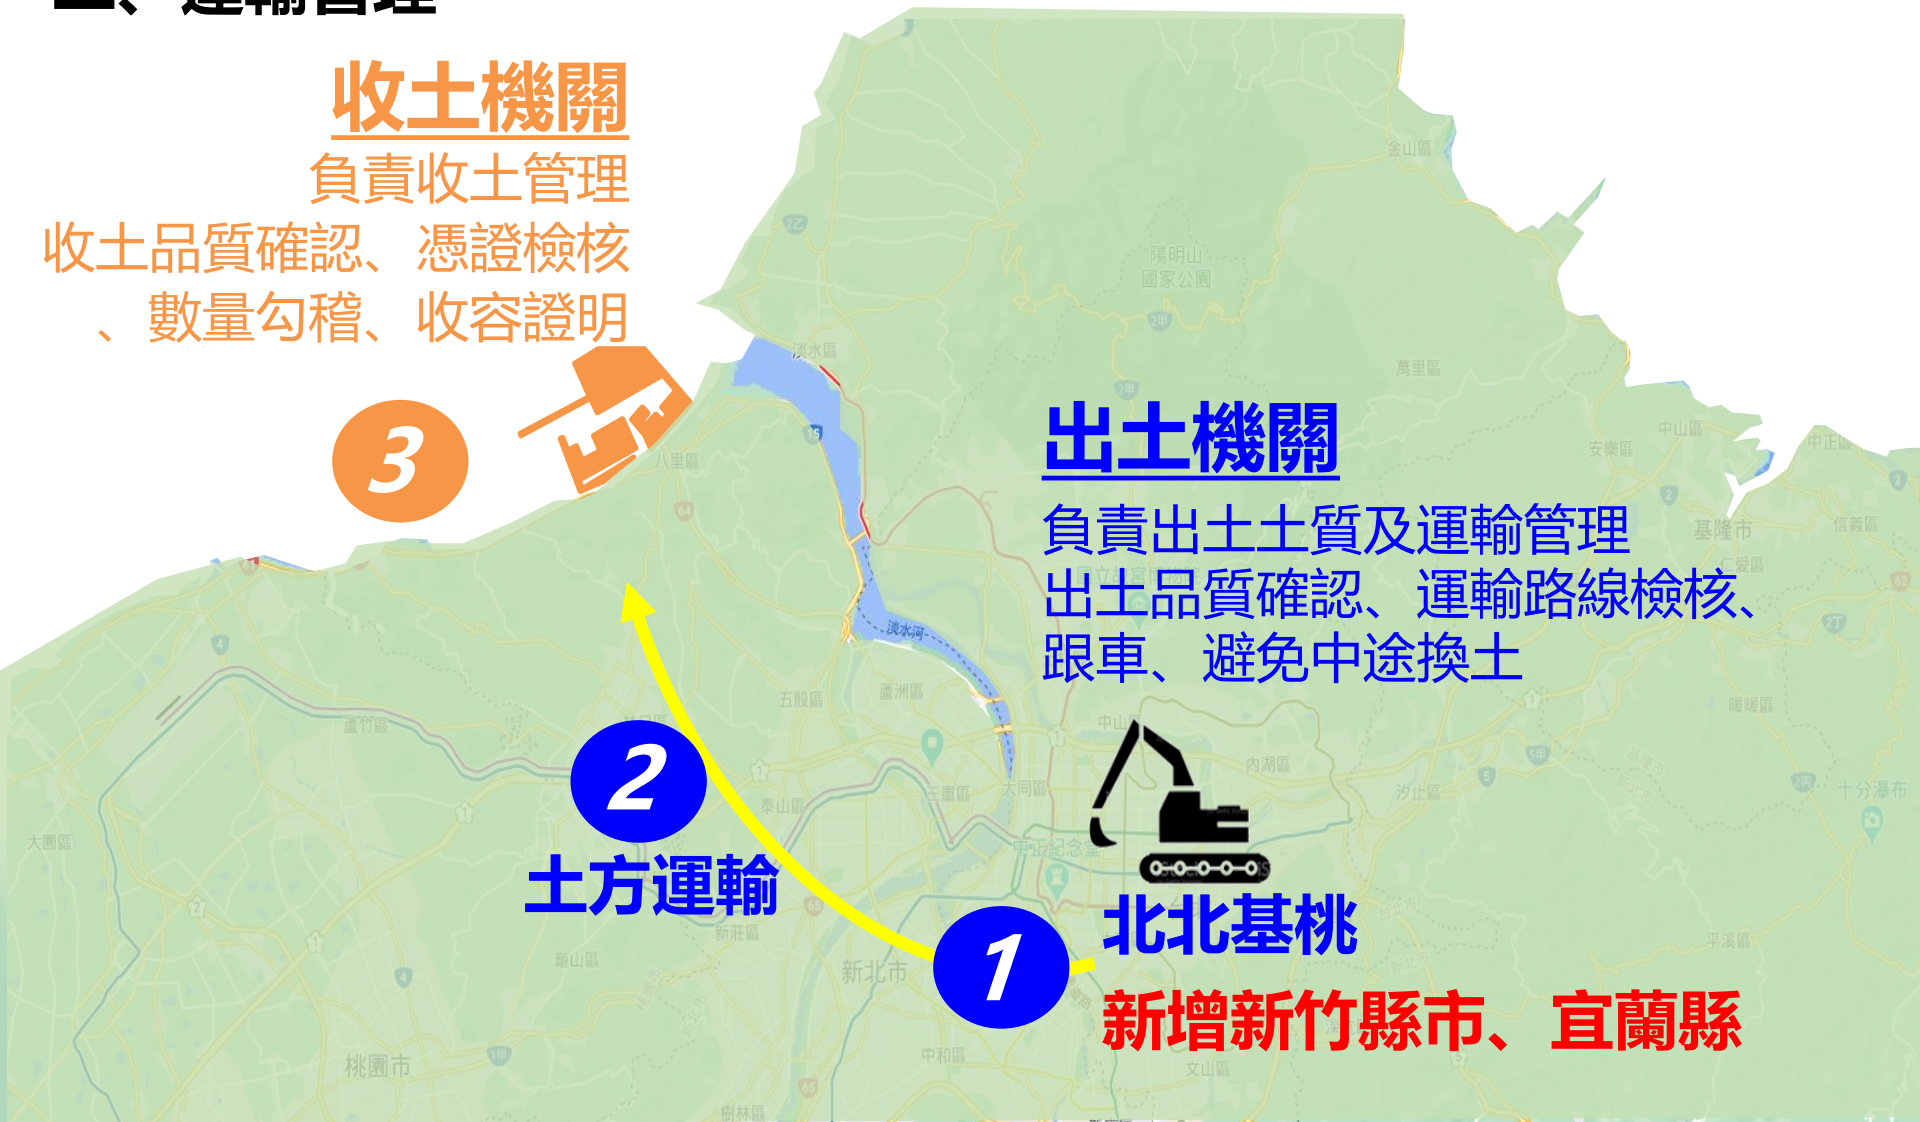

參、宣導事項(7/11)

二、運輸管理

1. **土方進臺北港前之運送過程由出土機關負責管理**，請各出土機關依規定執行車輛運輸管理，建議應自行辦理跟車查核作業；本場區嚴禁夾帶未經核准之土方進場，如檢查進場土方顏色及土質明顯不同，將視情況予以暫置並請出土機關說明，或逕予退車處理。
2. 與本分公司進行土方交換之土方車輛駛離工區前，應先確認有無超載，運輸動線**不得有至中繼站換土之行為**，且進港前之路線應符合本造地計畫環評書件，原則以臺61及64線銜接臨港大道，由土車專用道駛入臺北港區，**應避免中途轉入八里市區及重劃區等住宅區**。

。

參、宣導事項(8/11)

二、運輸管理

3. 請各出土機關**避免於上下班尖峰時段出土至臺北港填築**，並規範土車行駛路徑應符合本案環評規定，如遇舉證車輛未依規定行駛，致影響八里區民眾生活，本分公司則視情節記點處理或暫停該案土方交換。
4. 港區道路非僅供土車行駛，且設有會車路口，為確保港區行車安全，車輛於港區內行駛時應遵守限速，不得超速及違規超車。
5. 本案設有即時現況影像，各單位可自本分公司「臺北港土方交換廉政平臺>履約管理進度>土方收容進度」參考使用：

<https://kl.twport.com.tw/theme/Articles?a=2968>

參、宣導事項(9/11)

二、運輸管理

6. 臺北港為空氣品質維護區，請各出土機關所轄工程用車輛，依公告事項管制措施辦理。
7. 土方車輛運送軌跡紀錄依各公共工程主辦機關之文件保存規定存查以供調閱，**本分公司將不定期抽查各土方交換案運送車輛之GPS行駛軌跡及派員參訪座談各案機關出土管理情形**，請各出土機關自律並遵守「公務員廉政倫理規範」，依法公正執行職務。

參、宣導事項(10/11)

三、其他事項

1. 各出土機關應於接獲本公司繳費單15天內，以繳款單繳納土方管理費，**逾期未繳者將自次日起暫停收受**，不另通知。本分公司僅接受一間繳納(代繳)單位，如一個工程案有數間清運商，應由出土機關協調一繳納(代繳)單位繳費。
2. 響應無紙化政策，各單位於取得收容端流向管制編號後，請將補充資料 (工程基本資料表、無紅火蟻證明、土壤試驗報告、管制名冊...等)審訖後掃描成電子檔，依序上傳至本案資訊系統，經本分公司審查同意後即可啟動現場土方收容作業。

參、宣導事項(11/11)

三、其他事項

3. 有關因工程估驗需檢附遠端監控輸出影像紀錄，非本分公司設立監控機制之目的，各工程餘土送達確認，應屬工程承攬廠商及監造單位之責。

4. 進出港區之土方車輛**應申辦定期/臨時通行證**，並於進出港區時皆須感應通行證(定期)/身分證(臨時)條碼。



定期通行證




身分證

綠燈亮起後
方可通行

定期通行證
感應處

身分證感應處

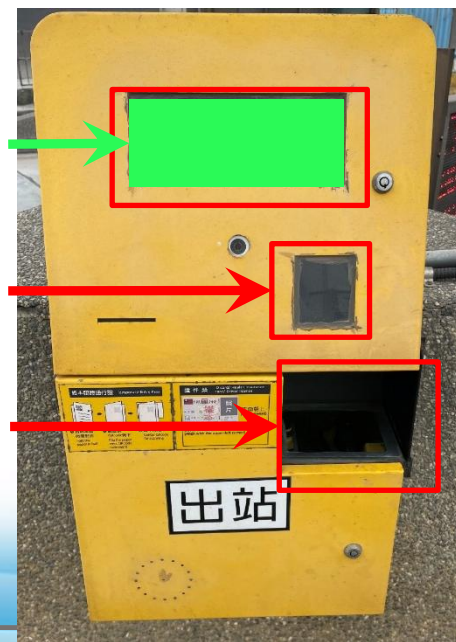

肆、土方交換申請審查重點(1/10)

- 近日土方交換案件申請量大增，其中不乏新竹縣市轄內之機關；本公司重申各項申請之審查標準，俾利申請案件審查順遂。
- 本分公司審查標準已公告於「臺北港物流倉儲區土方交換作業平台>最新消息」，請各單位酌參。

臺北港物流倉儲區土方交換作業平台

本年度剩餘量：2,504,616 M³

系統最新消息 |

2026/05/11

本平台各式申請審查重點

請依所提審查重點上傳相關文件

肆、土方交換申請審查重點 (2/10)

一、帳號申請 - 工程主辦（管）機關身分查核表

- 1、機關名稱應寫全名。
- 2、電子郵件信箱原則應為**機關信箱**，不得使用個人信箱（如G-mail、Yahoo信箱等）。
- 3、連絡電話應為**辦公室電話**。
- 4、申請人、主管應蓋用所屬**機關職章**，及**機關印信**（關防或單位章）。

※ 本平台**僅供工程主辦（管）機關 / 目的事業主管機關申請土方交換**，不提供PCM、監造單位、承攬廠商或清運業者申請。

基隆港務分公司臺北港公共工程土方交換資訊服務系統
工程主辦(管)機關身份查核表

申請人姓名	張	身分證字號	F1
機關名稱	1、新北市政府養護工程處		
E-mail	2、@ntpc.gov.tw		
連絡電話	3、02-29 #616		
新工程申請帳號。			

	申請人	二級 單位主管 ☑授權決行	一級 單位主管 ☐授權決行	機關印 (或單位章)
4、 蓋 章	 (請蓋職章)	 (請蓋職章)		 (請蓋職章)

肆、土方交換申請審查重點(3/10)

二、新案第1階段審查 - 臺北港土方交換申請表

1、應於空白處蓋用**機關印信**（關防 或 單位章）。

2、各年度申請各類土方數量原則應為**12之倍數**；

總計數量不得小於1,200 M³。（7月1日起為
600 M³）

3、應檢附「各工程流編申請土方詳細表」（系統
自動生成）；如該案件無特殊需求（如工區跨縣
市等），應以1個工程流向編號為原則。

臺北港土方交換申請表

出土案件基本資料									
出土工程名稱	115年新北市轄區公有土地管理維護及活化工程(第1區)								
建照號碼	(無則免填)								
基地地址	☐ 是 ☒ 否 關於環保單位所公告之「控制地號」或「限制地號」所產出土方								
工程性質	☒ 是 ☐ 否 屬公共工程								
出土機關全名	新北市政府養護工程處								
統一編號	31631087								
承辦人	張								
聯絡電話	02-299 #616								
聯絡地址	235 新北市中和區興山路471號6樓								
電子郵件信箱	ntpc.gov.tw								
預計出土數量(各土質數量應為12 M ³ 之倍數，且訂有最少總量1,200 M ³)									
土質 年度	B1	B2-1	B2-2	B2-3	B3	B4	B5	B6	小計
115 年				600			600		1,200
年									
年									
總計	0	0	0	600	0	0	600	0	1,200

3、附件：各工程流編申請土方詳細表

EZC04744 預計出土數量 (115年度基隆港港區圍墾整修工程(開口契約))									
土質 年度	B1	B2-1	B2-2	B2-3	B3	B4	B5	B6	小計
115 年							1,200		1,200
總計	0	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200

肆、土方交換申請審查重點(4/10)

三.1、新案第2階段審查 - 基本資料表

1、流向編號應與第一階段申請資料一致。

2、出土機關應至「營建剩餘土石方資訊服務中心」**查核**基本資料表。

3、工程名稱應與第一階段申請資料一致。

4、流向管制編號為**本分公司提供之收容流向編號**，去處名稱應為「**臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程**」；土質與土量應與第一階段申請資料一致。

5、應於空白處蓋用**機關印信**（關防 或 單位章）。

公共工程基本資料表				
申報日期：2026-03-16 列印時間：2026-04-08				
1、	流向編號	EZC16859	2、	查核狀態
	土方流向	出土		已查核
	工程興建管理單位	新北市政府營建工程處	工程興建管理單位代碼	382110300G
3、	工程名稱	115年新北市轄區公有土地管理維護及活化工程(第1區)		
	工程所在縣市	新北市	工程地點	新北市板橋、土城、中和、永和、新店、深坑、石碇、坪林、烏來、坪溪、雙溪、貢寮、瑞芳、金山、萬里等區
	工程所在鄉鎮	板橋區	地號	
	監造單位	和泰工程顧問有限公司		
	查核人	張子奕	工程員張子奕	022253299#616
	承包廠商	成錫營造股份有限公司		
	申報人	鄭建麒		
	清運業者	成錫營造股份有限公司		
4、	土方表處場所與工程名稱列表			
	編號	流向管制編號	去處名稱	土質 土量(M³)
	1	EZC19850	臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程	B2-3 600.000
	2	EZC19850	臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程	B5 600.000
	總土方量			1,200.000
	核准單位同意日期			1900-01-01
	核准單位同意文號			
	備註			
	可再利用物料			
	土質	土量(M³)	處理方式	去處 核准文號
	-			
	土方交換相關資訊			
	是否符合土方交換申報門檻	土方交換編號		
說明： 1. 工程經主辦機關核定後，工程興建管理單位、工程興建管理單位代碼與查核人、工程員資料應一致。				

肆、土方交換申請審查重點(5/10)

三.2、新案第2階段審查 -無紅火蟻證明文件

- 1、工程名稱應與第一階段申請資料一致。
- 2、證明文件應為**2年內**之有效文件。
- 3、應確認無紅火蟻入侵施工範圍。
- 4、應於空白處蓋用**機關印信**（關防 或 單位）。
- 5、應由**國家紅火蟻防治中心**或**合格機構**出具證明文件。

入侵紅火蟻偵查表

1、工程名稱：115 年新北市轄區公有土地管理維護及活化工程(第 1 區)

2、日期：115/01/13

檢測範圍：新北市金山區清水路 60 巷（工程施工區域）

面積：約 1500 平方公尺

地區型態：道路/雜草地

地型屬性：平地

氣候條件 天候：晴 氣溫：21 雨量：零

偵查方式 ☒目視法 ☒誘餌誘集法(原味洋芋片)

偵測日期：115/01/13 開始放餌時間：15:00 開始收餌時間：15:40

項次	偵測範圍	偵測位置	偵測結果
A	新北市金山區清水路 60 巷（工程施工區域）	01~10 點 如後圖標示於	未發現紅火蟻入侵跡象

3、

4、

5、

技術人員 莊博華 監督人員

承攬廠商：凡 公司

1

肆、土方交換申請審查重點(7/10)

三.4、新案第2階段審查 -保證金繳款證明

1、應註明保證金繳款日期。

2、收款帳號應與第一階段本分公司所提
繳款單相符。

企合成網 Super Solution		臺灣銀行	
交易處理狀態查詢		列印日期: 2026/04/09	
編放歷程			
步驟名稱	編放人員	執行日期時間	狀態
編輯	編輯	2026/04/09 14:11:13	已送呈
放行	編輯	2026/04/09 14:12:51	已放行
交易明細資訊			
處理狀態	交易成功		
處理序號	26040959108340		
資金安控機制	FXNL 透視		
交易類型	台幣單據 / 步單轉帳-單單		
登錄日期	2026/04/09 14:11:13		
預定轉帳日期	2026/04/09		
實際轉帳日期	2026/04/09		
轉出戶名	威能營造股份有限公司		
轉出帳號	148-001-01688-1 臺灣銀行淡水分行		
轉入戶名	臺灣港務股份有限公司		
轉入銀行/分行	004 臺灣銀行		
轉入帳號	3772960303112 臺灣銀行		
轉入戶帳號			
轉出金額	300,000.00		
手續費	0.00 (付款人負擔)		
實際扣款金額	300,000.00		
實際入帳金額	300,000.00		
轉出交易備註	保證金		
轉出戶別帳號參考資料			
轉入戶別帳號參考資料			
入帳通知	不通知 通知內容: 威能營造股份有限公司		
權證上傳格式名稱	nothing		
憑單資料			
筆次	憑單日期	憑單編號/明細	金額
無設定資料			
臺灣銀行 BANK OF TAIWAN 電子交易			
經辦	審核	審核	放行

肆、土方交換申請審查重點(8/10)

三.5、新案第2階段審查 -繳款授權同意書

- 1、工程名稱應與第一階段申請之名稱一致。
- 2、應確認統一發票抬頭與統一編號所對應之公司行號相符。
- 3、應於空白處蓋用機關印信（關防 或 單位章）。
- 4、應註明授權日期。

臺北港土方管理費繳款授權書

1、**新北市府養護工程處管115年新北市轄區公有土地管理維護及活化工程(第1區)與臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司臺北港物流倉儲區工程辦理土方交換作業，有關土方管理費之繳納資訊如下：**

1. 繳納單位：
☐ 本機關繳納。
■ 廠商：成鎰營造股份有限公司代本機關繳納。

2、**發票資訊：**
統一發票抬頭：成鎰營造股份有限公司
統一編號：94191609

3. 繳納單位聯絡資訊：
連絡人：劉
連絡電話：(02)2636-5292

4. 繳款單及發票領取方式：
☐ 自取
■ 郵寄地址：252005 新北市三芝區忠孝街148號

3、

4、**中華民國 115 年 4 月 8 日**

註1：臺北港物流倉儲區工程辦理收容公共工程剩餘土石方作業，係為臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司與各公務機關間之土方撮合，考量公務機關於各工程預算案編列之習性，茲以本同意書確立「土方管理費」之繳納單位，俾憑辦理，如遇廠商繳費爭議，則限定由機關繳納費用。
註2：依據臺北港收容公共工程營運剩餘土石方作業規定第七條規定，基隆港務分公司將定期檢討並調整費率。

肆、土方交換申請審查重點(9/10)

三.6、新案第2階段審查 - 協議組織會議證明

- 1、應上傳**出席證明**，實體會議為開會證明，線上會議為簽到表。
- 2、工程名稱、流向編號應與第一階段申請資料相符，並**註明與會日期**。
- 3、應上傳相關在職文件，確認與會人員仍在職（名片或投保資料等）。



1、

臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程-
土方交換管制及推整委託專業服務
115年4月份危害告知暨協議組織會議開會證明

2、

充分瞭解，並將負責詳細轉知該內容使承攬清運廠商瞭解，並要求遵守，且應備有記錄存查。
2. 協議組織會議未能詳列事項，應依相關法規規定辦理。
3. 安全衛生及危害告知事項進場單位務必遵守，若有違反依車輛進場管理辦法相關規定處分。

工程流向管制編號：LZB09890
營造廠商名稱：成鎰營造股份有限公司
出土工程名稱：新北市中區「德光里」危舊住宅新建統包工程

以上安全衛生事項，進場單位已確實明瞭，並允諾確實遵守。以上若法令另有規範者，亦應遵守。

(承辦人、負責人、代理人或委託人)簽名：[Signature] 日期：115.4.1

實體會議
應上傳開會證明

1、

臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程-
土方交換管制及推整委託專業服務
115年4月份協議組織會議紀錄暨危害告知單 簽到表

1. 崩塌、滑移	8. 土石流	15. 初學危害
2. 遺棄、廢棄	9. 爆炸	16. 異常危害
3. 崩塌、廢棄	10. 崩塌	17. 異常低溫之接觸
4. 物料掉落	11. 交通事故	18. 異常高熱之接觸
5. 滅絕	12. 中毒	19. 其他
6. 衝浪、碰撞	13. 溺水	
7. 交通、切割、磨、穿割傷	14. 物體破裂	

二、危害防止措施

1. 預防、減低

- 非土方車輛人員請勿進入工作範圍。
- 進行清污作業前，應確認作業環境安全，避免站立於石塊、車斗邊緣或其他不穩固位置；並應穿戴防護安全鞋及必要之個人防護具。作業期間應注意地面濕滑狀況。

3. 崩塌、廢棄

- 受檢樣式崩塌地，應依現場指示暫停作業避免危害。

6. 衝浪、碰撞

- 應於車輛後端設置警示，並隨時之功能正常。

11. 交通事故

- 車輛於工區內應依規定進行行駛。
- 人員於工區內行走時，應避免跑步，並注意行駛中之車輛。
- 應於車輛後端設置充分視線淨空。

13. 溺水

- 於作業場所或其附近設置救生圈、救生圈、救生衣等救生設備。

15. 初學危害

- 提供作業人員使用適當之呼吸防護具。

三、受告知進場單位基本資料

受告知單位：

1. 本月份協議組織會議紀錄暨之安全衛生及危害告知事項，經線上上傳影片告知內容已充分瞭解，並將負責詳細轉知該內容使承攬清運廠商瞭解，並要求遵守，且應備有記錄存查。

2. 線上協議組織會議紀錄暨之安全衛生及危害告知事項，應依相關法規規定辦理。

3. 安全衛生及危害告知事項進場單位務必遵守，違反依車輛進場管理辦法相關規定處分。

4. 應於進場前將上述協議組織會議紀錄暨之安全衛生及危害告知單簽到表並上傳簽到人員簽到表以備查核，如未簽到者，視為自行承擔後果。

進場單位名稱：115年新中區「德光里」危舊住宅新建統包工程
工程流向管制編號：E2C16859
營造廠商名稱：成鎰營造股份有限公司
(承辦人、負責人或代理人)簽名：[Signature] 日期：115年4月1日

線上會議
應上傳簽到表

肆、土方交換申請審查重點(10/10)

四、土方混雜土質申請 - 分類困難佐證資料

- 1、應註明申請土分混雜收容之工程名稱。
- 2、應於空白處蓋用**機關印信**（關防 或 單位章）。
- 3、申請時應輔以文字說明。

3、

土方分類困難/混雜原因說明

因本工程為埋管施工挖出之廢土，挖掘現場位於道路旁，因道路空間有限，現地土層交界也並非均一平整，經挖掘篩分後難有效分離各土質，土方仍混雜少量不同類別土石方，故申請B2-3、B5類土方混雜。

1、

工程名稱：三重區五谷王南街等巷弄汰換管線工程

人工撿拾分類



過篩機分類



2、



伍、廉政宣導



臺灣港務股份有限公司

TAIWAN INTERNATIONAL PORTS CORP., LTD.

簡 報 結 束
敬 請 指 教



臺灣港務股份有限公司
TAIWAN INTERNATIONAL PORTS CORP., LTD.

114年度臺北港物流倉儲區填海造地計畫收容營建剩餘土石方數量表								
申請單位	項次	工程名稱	數量	小計	單位合計			
新北市政府文化局	1	新北市美術館第二期戶外園區工程(第二階段)	48.00	48.00	43,620.00			
新北市政府工務局	2	淳家土石方資源堆置處理場(114年第1季第1批)	3,360.00					
	3	淳家土石方資源堆置處理場(114年第1季第2批)	3,360.00					
	4	淳家土石方資源堆置處理場(114年第2季第1批)	3,360.00					
	5	淳家土石方資源堆置處理場(114年第2季第2批)	3,360.00					
	6	太平營建混合物資源處理場(114年第2季)	600.00					
	7	長惟工業營建剩餘土石方資源處理場(114年第2季第1批)	1,500.00					
	8	長惟工業營建剩餘土石方資源處理場(114年第3季第1批)	1,500.00					
	9	世芳營建工程剩餘土石方處理場(114年第3季第1	900.00					
	10	長惟工業營建剩餘土石方資源處理場(114年第3季第2批)	1,500.00					
	11	興磊營建剩餘土石方資源處理場(114年第3季第1	3,000.00					
	12	淳家土石方資源堆置處理場(114年第4季第2批)	3,360.00					
	13	萬達發營建剩餘土石方資源處理場114年第4季第1	1,512.00					
	14	淳家土石方資源堆置處理場(114年度第4季第1批)	3,360.00					
	15	萬達發營建剩餘土石方資源處理場114年第4季第2	1,512.00					
	16	長惟工業營建剩餘土石方資源處理場(114年第4季第1批)	1,500.00					
	17	萬達發剩餘土石方資源處理場(114年第4季第3批)	1,512.00					
	18	世芳營建工程剩餘土石方處理場(114年第4季第1	900.00					
	19	萬達發營建剩餘土石方資源處理場114年第4季第4	1,512.00					
	20	興磊營建剩餘土石方資源處理場(114年第4季第1	3,000.00					
	21	萬達發營建剩餘土石方資源處理場114年第4季第5	1,512.00					
	22	長惟工業營建剩餘土石方資源處理場(114年第4季第2批)	1,500.00					
新北市政府水利局	23	新北市三峽區、鶯歌區污水下水道系統第二期工程污水管線第十標(次幹管、支(分)管及用戶接管)	2,316.00	162,732.00				
	24	磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合	6,780.00					
	25	磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(三合橋至奇岩抽水站)	4,176.00					
	26	新北市塭仔圳貴子坑溪南側低地排水設施新建工程	4,788.00					
	27	新北市塭仔圳塔寮坑溪南側低地排水設施新建工程	41,376.00					
	28	新北市政府水利局113年度災害緊急搶修工程、復建工程暨水利設施平時維護工程	372.00					
	29	新北市板橋地區污水下水道系統第三期工程第三標(支(分)管及用戶接管)	1,812.00					
	30	新北市土城地區污水下水道系統新建工程第十一標(分支管及用戶接管)	3,852.00					
	31	112年度全市污水下水道系統未納戶接管工程(開口契約)	204.00					
	32	新北市汐止區青山國民國中小透水保水工程	6,228.00					
	33	新北市樹林區學勤路系統排水改善工程	2,544.00					
	34	貴子坑溪河川環境營造計畫第一標(第1區)	17,244.00					
	35	貴子坑溪河川環境營造計畫第一標(第3區)	13,716.00					
	36	貴子坑溪河川環境營造計畫第一標(第4區)	7,716.00					
	37	貴子坑溪河川環境營造計畫第一標(第2區)	20,808.00					
	38	新北市樹林地區污水下水道系統第二期第十七標工	3,072.00					
	39	新北市中和地區污水下水道系統第三期工程第一標分支管線及用戶接管工程(含前期未納戶)	216.00					
	40	新北市永和地區污水下水道系統第二期第五-2標暨第六-1標後續工程	312.00					
	新北市政府交通局	41	國立華僑高中透水保水工程			576.00	56,040.00	
		42	二重疏洪道左岸加高工程			24,624.00		
43		三重區信義公園停車場新建工程	27,180.00					
44		板橋區信義國小停車場新建工程	28,548.00					
45		永和區永平國小(操場)停車場新建統包工程	312.00					

114年度臺北港物流倉儲區填海造地計畫收容營建剩餘土石方數量表					
申請單位	項次	工程名稱	數量	小計	單位合計
新北市政府地政局	46	新北市新店安坑輕軌K8站周邊地區(J單元)區段徵收開發工程	1,488.00	1,488.00	519,504.00
新北市政府衛生局	47	新北市瑞芳區醫療長照設施大樓新建工程	15,108.00	15,108.00	
新北市政府消防局	48	第一大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍興建工程	12,144.00	15,852.00	
	49	泰山分隊興建工程	3,708.00		
新北市政府體育局	50	板橋第一運動場、第二運動場及樹林體育園區無障礙設施改善工程	96.00	1,200.00	
	51	新莊體育園區無障礙設施及周邊環境改善工程	1,104.00		
新北市政府捷運工程局	52	捷運汐止東湖線要徑工程	13,788.00	22,800.00	
	53	三鶯線捷運系統計畫統包工程EQF15995（九億）	48.00		
	54	捷運新北環狀線新莊思源路排水改善統包工程	696.00		
	55	淡海輕軌運輸系統計畫第二期路網先期標統包工程	4,464.00		
	56	環狀線新埔民生站地下道工程	3,804.00		
新北市政府城鄉發展局	57	新北市三重公共服務園區暨周邊景觀整備工程	36.00	13,956.00	
	58	板橋區第一運動場暨周邊整體環境提升計畫-海山學區通學廊道品質提升計畫工程	360.00		
	59	新北市蘆洲區光華段停車場及青年社會住宅新建統包工程	6,540.00		
	60	土城員和社宅周邊人本環境(第一期)改善工程	2,400.00		
	61	三重區三重段停車場及青年社會住宅新建統包工程	3,336.00		
	62	新北市淡水海天段青年社會住宅新建工程	1,284.00		
新北市政府經濟發展局	63	新北市林口區建林段392地號林口媒體園區(B基地)東森全球集團全球營運總部新建工程	720.00	21,156.00	
	64	「南山新北市淡水沙崙園區暨停車場用地案停車場用地」新建工程	7,332.00		
	65	林口東森集團全球營運總部新建工程-廣場主體工	13,104.00		
新北市政府環境保護局	66	俊曜工程有限公司(114年第2季)	900.00	5,400.00	
	67	俊曜工程有限公司(114年第2季)第二批	900.00		
	68	鶯歌廢棄物處理場(114年第2季)	600.00		
	69	俊曜工程有限公司(114年第3季)	1,200.00		
	70	鶯歌廢棄物處理場(114年第4季第1批)	600.00		
	71	俊曜工程有限公司(114年第4季第1批)	1,200.00		
新北市政府市場處	72	汐止中正公有零售市場新建工程案	2,220.00	2,220.00	
新北市政府新建工程處	73	新北市淡水區淡水國民小學校舍新建及信義樓拆除工程	720.00	113,088.00	
	74	汐止區新社后橋園道段道路北延穿越高速公路至明峰街路段新闢道路工程(第一階段)	18,432.00		
	75	113年新北市轄內公共工程等相關設施新闢、改善工程(北區)	2,400.00		
	76	新北市立南勢國民中學校舍暨市民多元服務設施統包工程	16,524.00		
	77	新北市板橋第二國民運動中心興建統包工程	1,164.00		
	78	新北市瑞芳地政事務所暨瑞芳區衛生所辦公廳舍興建工程	408.00		
	79	淡水河北側沿河平面道路工程	16,944.00		
	80	113年新北市轄內公共工程等相關設施新闢、改善工程(南區)	408.00		
	81	新北市立義學國民中學多功能體育館共構地下停車場新建工程	56,088.00		
新北市政府養護工程處	82	汐止區康寧街三期道路改善工程	108.00	20,148.00	
	83	113年度新北市轄區內災害緊急搶修及復建工程(第	252.00		
	84	蘆洲區蘆洲國小周邊人行及通學環境改善工程	4,920.00		
	85	113年新北市轄內橋梁耐震補強暨維修改善工程-浮	1,044.00		
	86	114年度新北市轄區內災害緊急搶修及復建工程(第	312.00		
	87	蘆洲區民族路(三民路至民族路85巷)人行道改善工	2,196.00		
	88	瑞芳區三爪子坑路(瑞芳國中旁)人行環境改善工程	684.00		
	89	新北市政府前廣場周遭人行環境改善工程	1,104.00		
	90	林口區文化北路一段(忠福路至仁愛路二段)人行道改善工程	2,076.00		

114年度臺北港物流倉儲區填海造地計畫收容營建剩餘土石方數量表					
申請單位	項次	工程名稱	數量	小計	單位合計
	91	鶯歌區建國路(南昌街至中正一路)人行道改善工程	768.00		
	92	新北市美學示範基地人行空間完整計畫(府中雙城)都會區漢生東路人行道改善工程	252.00		
	93	三重區龍濱路(龍門路~長樂街)兩側人行道改善工	312.00		
	94	113年度新北市轄區內道路、橋梁改善工程(第2區)	96.00		
	95	114年度新北市轄區內道路、橋梁改善工程(第3區)	2,676.00		
	96	114年度新北市轄區內道路、橋梁改善工程(第4區)	3,348.00		
新北市政府 高灘地工程管理處	97	淡水河金色水岸竹圍金緞綠廊工程	540.00	540.00	
新北市政府 漁業及漁港事業管	98	114年龍洞漁港防坡堤改善工程(修正後)	2,136.00	2,292.00	
	99	淡水第二漁港設施改善工程	156.00		
新北市政府 殯葬管理處	100	新北市新店五城花園環保葬區設置工程案	1,080.00	1,080.00	
新北市政府 違章建築拆除大隊	101	新北市立漳和國民中學羽球館拆除重建多功能綜合大樓工程—拆除工程	4,260.00	4,260.00	
新北市八里區公所	102	113年度八里區雨水系統設施維護暨清疏工程(開口契約)	216.00	540.00	
	103	114年度八里區雨水系統設施維護暨清疏工程(開口契約)	324.00		
新北市汐止區公所	104	汐止區綜合運動場改善統包工程	2,700.00	2,700.00	
新北市立圖書館	105	三芝分館拆除暨新建工程	768.00	768.00	
新北市立板橋國民中學	106	新北市板橋區板橋國民小學增設板橋浮洲旗艦型非營利幼兒園興建工程(修正後)	12,468.00	12,468.00	
臺北市政府工務局	107	臺灣臺北地方檢察署暨臺灣高等檢察署擴遷建辦公廳舍工程拆除工程	6,096.00	6,096.00	
臺北市政府財政局	108	臺北市信義區信義段四小段32、33-2地號市有土地設定地上權案	36,948.00	55,416.00	
	109	臺北市中正區公園段三小段1地號等13筆市有土地設定地上權案(A區)	11,748.00		
	110	臺北市中正區公園段三小段1地號等13筆市有土地設定地上權案(E區)	6,720.00		
臺北市政府體育局	111	克強公園游泳池暨新生公園網球場改建全民運動館統包工程-克強館	22,572.00	22,572.00	
臺北市政府 都市發展局	112	臺北市北投區機一基地公共住宅統包工程	2,928.00	7,896.00	
	113	臺北市內湖區石壁潭社會住宅1區統包工程 EYB11066編號調整	684.00		
	114	臺北市內湖區石壁潭社會住宅1區統包工程_臺北市114雜字第0042號	4,284.00		
臺北市政府 產業發展局	115	台北市數位內容創新中心新建工程	32,844.00	32,844.00	
臺北市政府捷運工程局第一區工程處	116	萬大-中和-樹林線(第一期工程)CQ860區段標工	1,380.00	214,020.00	
	117	捷運萬大-中和-樹林線(第一期工程)-CQ870區段標工程	8,496.00		
	118	捷運萬大-中和-樹林線(第一期工程)連城錦和站(LG07)捷3土開基地捷運設施共構工程	37,332.00		
	119	環狀線北環段Y19(不含)~Y20(含)土建及水電環控區段標工程	15,396.00		
	120	環狀線北環段Y25站(含)~Y27站(含)土建及水電環控區段標工程	444.00		
	121	CF690C「環狀線北環段Y23站(不含)~Y25站(不含)土建及水電環控區段標工程」	8,064.00		
	122	環狀線北環段Y27站(不含)~Y29站(含尾軌)土建及水電環控CF690B區段標工程	624.00		
	123	(CF682標)北環段Y20站(不含)~Y23站(含)土建	32,088.00		
	124	環狀線北環段Y25站(含)~Y27站(含)土建及水電環控區段標工程(Y26、Y27站含潛盾段)	11,220.00		
	125	臺北市立浩然敬老院重建工程	76,488.00		
	126	CQ861標-萬大-中和-樹林線(第一期工程)LG06車站土建工程	22,488.00		

114年度臺北港物流倉儲區填海造地計畫收容營建剩餘土石方數量表					
申請單位	項次	工程名稱	數量	小計	單位合計
臺北市府捷運工程局第二區工程處	127	CQ842標LG02車站、LG02至LG03及LG02至LG01潛盾隧道土建工程	684.00	366,180.00	
	128	臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)CQ840區段標工程LG03站通風廊道	168.00		
	129	環狀線南環段CF672A施工標-Y3站出入口B及通風井Y與都市更新大樓A2基地共構結構體工程	96.00		
	130	臺北都會區大眾捷運系統信義東延段CR580C區段標工程CR285標土建工程	1,152.00		
	131	臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)CQ890區段標工程	48,696.00		
	132	臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)CQ880A區段標工程	19,524.00		
	133	臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)CQ840區段標工程-1650mm自來水幹管遷移代辦工程第二階段	24.00		
	134	捷運萬大線CQ850A區段標工程AASCQ85112(建鑫)AASCQ85101(沅駿)	4,140.00		
	135	臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段CF680C區段標工程	264,228.00		
	136	臺北都會區大眾捷運系統環狀線南環段CF670A區段標工程Y01施工標	4,692.00		
	137	臺北都會區大眾捷運系統環狀線南環段CF670A區段標工程CF671施工標	19,644.00		
	138	臺北都會區大眾捷運系統環狀線南環段CF670區段標工程之CF672子施工標土建工程	636.00		
	139	IQVU03子施工標共同管道工程及道路復舊工程	600.00		
臺北市公共運輸處	140	臺北都會區大眾捷運系統環狀線南環段CF670區段標CF673施工標-Y4(含)~Y6(不含)土建工程	1,044.00	1,356.00	
	141	臺北都會區大眾捷運系統環狀線東環段CF763施工標工程	852.00		
	142	中和調度站拆除工程	1,356.00		
臺北市府建築管理工程處	143	亞太營建工程賸餘土石方及營建混合物資源處理場(113年第4季第1批)	2,784.00	58,536.00	1,363,944.00
	144	亞太營建工程賸餘土石方及營建混合物資源處理場(114年第1季第1批)	7,752.00		
	145	亞太營建工程賸餘土石方及營建混合物資源處理場(114年第1季第2批)	9,600.00		
	146	亞太營建工程賸餘土石方及營建混合物資源處理場(114年第2季第1批)	9,600.00		
	147	亞太營建工程賸餘土石方及營建混合物資源處理場(114年第2季第2批)	9,600.00		
	148	亞太營建工程賸餘土石方及營建混合物資源處理場(114年第3季第1批)	9,600.00		
	149	亞太營建工程賸餘土石方及營建混合物資源處理場(114年第4季第1批)	9,600.00		
臺北市住宅及都市更新中心	150	臺北市南港區南港段二小段671-6地號等52筆土地公辦都市更新案	32,004.00	32,004.00	
臺北市府工務局水利工程處	151	磺港溪壓力箱涵清疏及檢修工程	8,952.00	135,948.00	
	152	大安區民族實中周邊排水及校園環境營造工程	1,428.00		
	153	114年度沉砂池及溝渠用地周邊清疏及維護工程	888.00		
	154	士林官邸北側滯洪池新建工程	12,780.00		
	155	大龍抽水站擴建站新建工程	15,828.00		
	156	美堤碼頭整建暨大稻埕碼頭清疏工程	12,996.00		
	157	114年度百齡橋至承德橋及錫口碼頭至麥帥二橋河道疏浚工程	78,144.00		
	158	內湖區大湖公園沉沙池清淤工程	4,932.00		
	159	113年度山區道路改善及維護工程(文山區)	156.00		
	160	臺北市動物之家暨動保處辦公廳舍新建工程	15,600.00		
	161	富德納骨設施新建工程	22,128.00		

114年度臺北港物流倉儲區填海造地計畫收容營建剩餘土石方數量表					
申請單位	項次	工程名稱	數量	小計	單位合計
臺北市府 工務局大地工程處	162	114年度臺北市山區道路預約式維護工程（大安及文山區）	1,152.00	41,484.00	
	163	113 年度山坡地住宅邊坡及老舊聚落預約式維護工程(114 年續約)	12.00		
	164	114年度臺北市山坡地邊坡改善與設施維護工程	888.00		
	165	114年度臺北市山坡地溪溝改善及設施維護工程	408.00		
	166	114年度山區道路改善及維護工程(文山、南港)	816.00		
	167	114年度山區道路改善及維護工程(士林、北投)	324.00		
臺北市府 工務局新建工程處	168	臺北市中山區錦州街基地公共住宅新建工程	744.00	250,620.00	
	169	中正橋改建工程及代辦管線附掛工程	3,540.00		
	170	第一果菜(含堤內中繼)及萬大魚類批發市場改建統包工程	7,128.00		
	171	113年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程開口契約(第2標)	1,836.00		
	172	臺北市府消防局大湖分隊新建工程	1,128.00		
	173	臺北藝術園區-臺北市立美術館擴建統包工程/第2階	94,632.00		
	174	臺北市文山區力行國民小學活動中心新建工程	12,528.00		
	175	臺北市府消防局關渡分隊與警察局北投分局關渡派出所新建工程	21,516.00		
	176	國家生技研究園區聯外道路工程	228.00		
	177	民權大橋跨河段上部結構改建工程	3,180.00		
	178	臺北市立大安國中綜合教學大樓新建工程(第2階段拆除工程)	5,640.00		
	179	113年度臺北市人行道改善工程開口契約(第六標)	1,920.00		
	180	臺北市立大安高級工業職業學校新建綜合教學大樓工程	936.00		
	181	台北市松山區西松國民小學學生活動中心新建工程	93,864.00		
	182	臺北市北投區石牌國民小學舊校區校舍改建工程（拆除工程部分）	1,800.00		
臺北市府工務局 衛生下水道工程處	183	臺北市信義區三興段資源回收廠基地公共住宅新建工程	36.00	34,800.00	
	184	「民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程」統包案	732.00		
	185	濱江水資源再生中心新建工程統包案	34,032.00		
臺北市府工務局 公園路燈工程管理	186	艋舺公園景觀改善工程-114建字第0010號	1,392.00	5,172.00	
	187	大安森林公園排水及鋪面改善工程	1,548.00		
	188	康樂綠地、天壽公園改善工程	900.00		
	189	114年度園藝工程隊所轄綠地、廣場整建工程	1,332.00		
臺北市動物保護處	190	114年度臺北市自然公園設施環境改善預約工程	3,000.00	3,000.00	
臺北市立動物園	191	鳥園繁殖籠區與丹頂鶴欄舍修繕維護工程	372.00	372.00	
臺北市停車管理工程處	192	公1公園附建地下停車場新建工程	576.00	1,260.00	
	193	振華公園附建地下停車場新建工程	684.00		
臺北自來水事業處 工程總隊	194	公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓新建工程	5,436.00	5,436.00	
臺北市府地政局 土地開發總隊	195	金仁寶北士科總部大樓新建工程	43,872.00	43,872.00	
台北大眾捷運 股份有限公司	196	捷運士林站TOD轉乘設施空間活化及多元服務建置案統包工程	1,500.00	45,060.00	
	197	劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案工程	40,728.00		
	198	捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務工程	2,832.00		
桃園市政府 捷運工程局	199	桃園捷運綠線GC02標南出土段至G07站(不含)間地下段土建統包工程	37,776.00	52,392.00	
	200	桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程-營建剩餘土石方處理計畫（第十二階段）潛盾隧道工程	8,472.00		
	201	「桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程」營建剩餘土石方處理計畫(第二十一階段)G07車站開挖工程	6,144.00		

114年度臺北港物流倉儲區填海造地計畫收容營建剩餘土石方數量表					
申請單位	項次	工程名稱	數量	小計	單位合計
桃園市政府經濟發展局	202	桃園市幼獅青年創業村暨智慧製造園區/(114)桃市都建執照字第會楊00611號	8,148.00	8,148.00	216,384.00
桃園市政府新建工程處	203	桃園市立環北國民中學新建校舍工程	1,596.00	58,584.00	
	204	桃園市龜山國民運動中心新建工程	25,596.00		
	205	桃園市龜山區文化一路至青山路道路新闢工程	23,508.00		
	206	桃園市八德區仁德國民小學新建校舍工程(第一期)	7,884.00		
桃園市政府養護工程處	207	桃園市中壢區人本示範道路-龍慈路(龍岡路三段-中山東路三段)人本環境多目標改善工程	3,624.00	3,624.00	
桃園市政府住宅發展處	208	桃園市龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程-善捷段	28,176.00	28,176.00	
桃園市政府建築管理處	209	上福土石方堆置處理場後端去化(運至台北港114年度第二季第1次)	9,600.00	52,560.00	
	210	上福土石方堆置處理場後端去化(運至台北港114年度第二季第2次)	9,600.00		
	211	上福土石方資源堆置處理場後端去化(運至臺北港114年第三季第1次)	9,600.00		
	212	上福土石方堆置處理場後端去化(運至台北港114年度第3季-2)	7,020.00		
	213	詠源土石方資源堆置轉運處理場後端去化(運至臺北港114年第三季第1次)	9,600.00		
	214	新品土石方堆置處理場後端去化(運至台北港114年度第3季-2)	2,796.00		
	215	上福土石方堆置處理場後端去化(運至台北港114年度第3季-3)	4,344.00		
桃園市蘆竹區公所	216	桃園市蘆竹區南工路一段KAE-L幹線雨水下水道工	4,236.00	4,236.00	
桃園市觀音區草漯國民小學	217	桃園市觀音區草漯國民小學增建校舍及周邊附屬工程(113)桃市都建執照字第會觀00586號	7,116.00	7,116.00	
桃園市桃園區會稽國民小學	218	天真樓拆除工程	1,548.00	1,548.00	
基隆市政府	219	110年提升道路品質公共環境改善計畫-南榮路周邊人行環境改善(第一期)工程	828.00	32,160.00	67,128
	220	基隆市污水下水道系統第三期實施計畫--北港系統管線新建工程-管線工程第九標	1,056.00		
	221	110年提升道路品質公共環境改善計畫-基隆市暖暖區過港路	3,588.00		
	222	基隆港東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程	216.00		
	223	基隆市污水下水道系統第三期實施計畫-北港系統管線新建工程-管線工程第十一標	540.00		
	224	基隆市暖暖區源遠路改善工程(第一期)	1,104.00		
	225	基隆市安樂區武隆街111巷雨水下水道工程	1,836.00		
	226	希望之丘中正公園天鵝洞周邊社區廊帶串聯計畫	888.00		
	227	基隆市南榮公墓生命典藏館新建工程	9,324.00		
	228	東光國小、深美國小、成功國中校園周邊改善工程	588.00		
	229	外木山濱海廊帶公共設施改善工程(湖海路2K+550~3K+369段)	432.00		
	230	南榮路周邊人行環境改善(第二期)工程	528.00		
	231	基隆市安樂區長庚生活圈人行環境改善工程_安樂路二段、安和一街及建德幼兒園	624.00		
	232	(113)新豐街人行環境改善工程	612.00		
	233	(113)基隆市中山區中和路雨水下水道工程	1,260.00		
	234	基隆市污水下水道系統第三期實施計畫-南河系統管線新建工程管線工程第十標	180.00		
	235	113年外木山漁港泊地浚深工程	1,356.00		
236	基隆市中山區淨因禪寺地上物強制拆除及廢棄物清運統包工程	1,740.00			
237	大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程	5,460.00			
基隆市立體育場	238	基隆市立田徑場主建築拆除重建(含停車場)及周邊運動服務設施改善工程(重新招標)	6,816.00	6,816.00	
基隆市立安樂高級中學	239	安樂高中老舊校舍拆除改建(正德樓)工程	19,788.00	19,788.00	

114年度臺北港物流倉儲區填海造地計畫收容營建剩餘土石方數量表					
申請單位	項次	工程名稱	數量	小計	單位合計
基隆市中山區 德和國民小學	240	德和國小老舊校舍拆除改建(德興樓)工程	3,612.00	3,612.00	
國立基隆 高級商工職業學校	241	行政教學綜合大樓新建工程	4,752.00	4,752.00	
外交部	242	外交部致遠新村職務宿舍及檔案大樓新建工程	876.00	876.00	
國家人權博物館	243	國家人權博物館（白色恐怖景美紀念園區）修增建 工程	22,140.00	22,140.00	
國家表演藝術中心 國家兩廳院	244	藝文推廣廊道暨地面景觀設施工程	552.00	552.00	
國立歷史博物館	245	國立歷史博物館典藏文物庫房新建工程	5,148.00	5,148.00	
經濟部水利署 第十河川分署	246	淡水河左岸蘆洲疏濬工程第二期第三標	98,592.00	106,200.00	
	247	橫溪溪南3號堤防加高及溪南5號堤防改善工程	5,892.00		
	248	114年度第十河川分署轄區(北區)構造物維修改善 暨區排堤防維護管理工程(開口合約)	1,716.00		
經濟部水利署 北區水資源分署	249	114年石門水庫沉澱池土方清運	104,880.53	104,880.53	
經濟部中壢產業園 區服務中心	250	114年度中壢產業園區自強一路排水系統改善工程	588.00	588.00	
台灣中油股份有限公司 油品行銷事業部 基隆營業處	251	汐止捷運換管工程(第一階段)	1,092.00	1,092.00	
台灣中油股份有限 公司煉製事業部桃 園煉油廠	252	113年桃廠沙崙儲運課土方清運及整地工作	2,364.00	2,364.00	
台灣電力股份有限 公司綜合施工處	253	淡水服務所及區域巡修中心新建工程(111淡建字第 00506號)	20,352.00	20,352.00	
台灣電力股份有限 公司台北供電區營	254	161kV板橋~青年線#1連接站遷移暨管路土建統包 工程	384.00	384.00	
台灣電力股份有限 公司基隆區營業處	255	基隆區營業處113年甲工區配電管路工程	1,440.00	12,768.00	
	256	基隆區營業處112年乙工區配電管路工程	2,028.00		
	257	基隆區營業處114年甲工區配電管路工程	6,900.00		
	258	基隆區營業處114年乙工區配電管路工程	2,400.00		
台灣電力股份有限 公司台北市區營業 處	259	台北市區營業處113年甲工區配電管路及零生外線綜合工 程	3,684.00	13,032.00	
	260	台北市區營業處113年甲工區配電管路及零生外線綜合工 程	1,980.00		
	261	台北市區營業處114年乙工區配電管路及零生外線綜合工 程	5,124.00		
	262	台北市區營業處114年甲工區配電管路及零生外線綜合工 程	1,776.00		
	263	台北市區營業處113年乙工區配電管路及零生外線綜合工 程	468.00		
台灣電力股份有限 公司台北西區營業 處	264	台北西區營業處113年甲工區配電管路工程	5,784.00	38,748.00	
	265	台北西區營業處113年乙工區配電管路工程	3,588.00		
	266	台北西區營業處113年丙工區零星配電管路工程	2,316.00		
	267	台北西區營業處林口區A3都市計畫道路(道路拓寬 路段)工程	3,120.00		
	268	台北西區營業處林口區A3都市計畫道路(道路拓寬 路段)工程	252.00		
	269	台北西區營業處114年丙工區配電管路工程	8,088.00		
	270	台北西區營業處114年乙工區配電管路工程	7,692.00		
	271	台北西區營業處114年甲工區配電管路工程	3,396.00		
	272	台北西區營業處坪頂DS新增4號主變零資添管工程	2,376.00		
	273	台北西區營業處114年丙工區零星配電管路工程	2,136.00		
台灣電力股份有限 公司台北南區營業 處	274	台北南區營業處113年甲工區配電管路工程	336.00	40,308.00	
	275	台北南區營業處113年乙工區配電管路工程	480.00		
	276	台北南區營業處113年甲工區配電零星管路工程	4,476.00		
	277	台北南區營業處113年乙工區配電零星管路工程	3,096.00		
	278	台北南區營業處114年乙工區配電管路工程	9,600.00		
	279	113年人、手孔蓋升降及周邊加固維護工作(甲工 區)承攬契約	6,000.00		
	280	台北南區營業處114年甲工區配電管路工程	13,320.00		
	281	台北南區營業處萬隆P/S電纜涵洞電力管路推管工 程	480.00		
	282	台北南區營業處114年乙工區零星配電管路工程	2,520.00		
	283	台北北區營業處113年丙工區配電管路及零生外線綜合工 程	948.00		

114年度臺北港物流倉儲區填海造地計畫收容營建剩餘土石方數量表					
申請單位	項次	工程名稱	數量	小計	單位合計
台灣電力股份有限公司台北北區營業處	284	台北北區營業處113年乙工區零星配電管路及零星外線綜合工程	2,844.00	22,608.00	
	285	台北北區營業處113年甲工區配電管路及零星外線綜合工程	5,052.00		
	286	台北北區營業處114年乙工區配電管路及零星外線綜合工程	6,060.00		
	287	台北北區營業處114年甲工區配電管路及零星外線綜合工程	6,108.00		
	288	台北北區營業處114年丙工區零星配電管路及零星外線綜合工程	804.00		
	289	台北北區營業處114年乙工區零星配電管路及零星外線綜合工程	792.00		
台灣電力股份有限公司桃園區營業處	290	桃園區營業處113年丙工區配電管路工程	15,912.00	82,752.00	
	291	桃擴031號平鎮區山峰自辦市地重劃管路埋設工程	2,172.00		
	292	桃擴030號平鎮區山峰自辦市地重劃管路埋設工程	420.00		
	293	桃園區營業處113年甲工區零星配電管路工程	8,184.00		
	294	桃園區營業處111年丁工區配電管路工程	5,412.00		
	295	桃園區營業處112年丁工區配電管路工程	4,392.00		
	296	桃供131號蘆竹區南山路三段地下化工程	924.00		
	297	桃園區營業處113年乙工區配電管路工程	4,704.00		
	298	桃園區營業處113年乙工區零星配電管路工程	9,096.00		
	299	桃園區營業處113年丁工區配電管路工程	10,284.00		
	300	桃擴226號大園區菓林重劃區區外銜接管路工程	2,376.00		
	301	桃園區營業處114年甲工區配電管路工程	7,440.00		
	302	桃園區營業處114年丙工區配電管路工程	168.00		
	303	桃園區營業處114年乙工區配電管路工程	11,268.00		
台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處	304	161kV聖亭~欣楊A電纜線路土木暨機電統包工程	19,080.00	223,956.00	
	305	161kV楊梅~景楊線地下電纜管路工程	3,876.00		
	306	161kV林口~東林雙分歧西濱管路暨附屬機電工程五工區	44,988.00		
	307	陽明P/S擴建工程(第1階段)	48.00		
	308	樹德P/S改建統包工程	13,272.00		
	309	161KV松樹~廣豐(航捷南)線電纜線路土木暨附屬機電統包工程	44,616.00		
	310	中山D/S改建暨大安~中山161kV線潛盾洞道新建統包工程	42,216.00		
	311	松湖超高壓變電所暨多目標大樓統包新建工程	1,440.00		
	312	161kV板城~遠信線等3案地下管路統包工程	960.00		
	313	161kV週美~潭美管路統包工程	15,636.00		
	314	345kV核一~汐止一進一出松湖線#29A連接站及銜接洞道土木統包工程	9,780.00		
	315	161kV樹林~南樹線等2案地下管路統包工程	4,164.00		
	316	松湖E/S地下變電所新建工程	8,988.00		
	317	頂湖E/S裝設土木工程	14,892.00		
台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處北部施工處	318	大潭電廠增建燃氣複循環發電計畫一般倉庫等四棟建築物新建工程(重件倉庫.消防器材設備間.廢棄物儲存場)	780.00	780.00	
台灣自來水股份有限公司北區工程處	319	板橋區南雅南路PSCP管線更生統包工程	636.00	17,532.00	
	320	石門淨水場廢水處理設備工程	7,440.00		
	321	浮洲加壓站至板新場管線工程(六)	1,584.00		
	322	浮洲加壓站至板新場管(七)潛盾工程	7,872.00		
台灣自來水股份有限公司第一區管理處	323	113年度基隆市中山、安樂、七堵區管線單價採購	564.00	12,744.00	
	324	113年度淡水所管線工程單價採購	2,280.00		
	325	伯爵一期高地社區供水管線改善工程	1,536.00		
	326	112年度汐止所管線工程單價採購	1,416.00		
	327	大慶大城高地社區供水管線改善工程	1,692.00		
	328	113年度基隆市中正、仁愛、信義、暖暖區管線單價採購工程	1,536.00		
	329	113年度萬金所轄區管線工程單價採購	564.00		
	330	114年度淡水所管線工程單價採購	684.00		
	331	114年度基隆市中山、安樂、七堵區管線單價採購	1,164.00		
	332	新北市石門區楓林路汰換管線工程	948.00		

114年度臺北港物流倉儲區填海造地計畫收容營建剩餘土石方數量表					
申請單位	項次	工程名稱	數量	小計	單位合計
台灣自來水股份有限公司第二區管理處	333	114年淡水營運所用用戶用水設備新改裝工作採購契	360.00	1,704.00	1,713,025
	334	114 年度龜山林口服務所管線工程單價採購(含給水廠)-開口契約	1,656.00		
	335	航空城龍安供水系統前端瓶頸段改善工程(管一)	48.00		
台灣自來水股份有限公司第二區管理處	336	龜山區光榮路及光明街等汰換管線工程	1,008.00	1,008.00	
台灣自來水股份有限公司第十二區管理處	337	樹林區中正路及大安路管線工程-管(二-3)	1,944.00	12,852.00	
	338	蘆洲服務所用用戶用水設備新裝工程單價採購112~113年度(開口契約)	888.00		
	339	新莊服務所用用戶用水設備新裝工程單價採購112-113年度(開口契約)	1,116.00		
	340	泰山營運所用用戶用水設備新裝工程單價採購113~114年度(開口契約)	1,140.00		
	341	龜山區萬壽路(中正路-G21站)配合捷運永遷工程	1,632.00		
	342	新莊區建安街等巷弄汰換管線工程	2,700.00		
	343	土城區員林街等汰換管線工程	336.00		
	344	管線工程單價採購-丁區(114年度)(開口契約)	1,200.00		
	345	新莊區環河路800mm管線工程	336.00		
	346	新北市八里區米倉里9、10鄰延管工程	1,500.00		
	347	新莊服務所用用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購114年度(開口契約)	24.00		
	348	泰山營運所用用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購114年度(開口契約)	36.00		
內政部(資訊中心)	349	內政部資訊服務大樓重建工程	12,960.00	12,960.00	
內政部國土管理署	350	資安園區統包工程	1,548.00	1,548.00	
內政部國土管理署北區都市基礎工程	351	新北市林口區A3計畫道路新闢工程	11,832.00	31,644.00	
	352	建置高生物安全檢驗及動物試驗中心新建工程	19,812.00		
內政部土地重劃工程處	353	機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第七標廣場地下停車場工程	9,480.00	18,744.00	
	354	機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第九標公滯六聯外排水及廢棄物清理工程	4,980.00		
	355	機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第七標廣場景觀工程	4,284.00		
法務部行政執行署宜蘭分署	356	基隆市義三路2號建築物拆除工程	900.00	900.00	
國家住宅及都市更新中心	357	臺北市大安區辛亥段四小段61地號等28筆土地公辦都市更新案	33,852.00	332,328.00	
	358	「新北市樹林區樹德安居社會住宅新建統包工程」(A基地)	2,892.00		
	359	「新北市樹林區樹德安居社會住宅新建統包工程」(B基地)	444.00		
	360	新北市泰山中山段社會住宅(一期)暨國軍職務宿舍新建統包工程(拆除)	1,152.00		
	361	臺北市南港區玉成段四小段303地號等6筆土地公辦都市更新案新建工程	36,672.00		
	362	新北市林口區「文仁安居」社會住宅新建統包工程	109,416.00		
	363	基隆市七堵區「光明安居」社會住宅新建統包工程	10,392.00		
	364	新北市汐止區「崇德好室」社會住宅新建統包工程(112汐建字第302號)	96.00		
	365	新北市淡水區『淡金安居』社會住宅新建統包工程	82,440.00		
	366	臺北市士林區芝山安居社會住宅新建統包工程	3,528.00		
	367	臺北市萬華區凌霄好室社會住宅新建統包工程	17,220.00		
	368	臺北市南港區「光華好室」社會住宅暨國軍職務宿舍新建統包工程	1,212.00		
	369	新北市中和區景新段63地號等6筆土地都市更新事業計畫暨權利變換計畫案(113中建字第00261號)	15,876.00		
	370	新北市中和區景新段63地號等6筆土地都市更新事業計畫暨權利變換計畫案(113中建字第00260號)	192.00		

114年度臺北港物流倉儲區填海造地計畫收容營建剩餘土石方數量表					
申請單位	項次	工程名稱	數量	小計	單位合計
	371	國家住宅及都市更新中心(113)桃市都建執照字第會壠00772號-桃園市中壢區振興安居社會住宅暨國軍職務宿舍新建統包工程(振興安居社會住宅)	3,432.00		
	372	新北市泰山區「貴和安居」(二期)社會住宅新建統包工程(拆除工程)	5,184.00		
	373	臺北市北投區稻香安居社會住宅新建工程/113建字第0117號	5,964.00		
	374	桃園市中壢區『富台安居』社會住宅新建統包工程	2,364.00		
交通部鐵道局 北部工程分局	375	臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫CJ16標中原車站路段鐵路地下化工程	1,068.00	32,544.00	
	376	臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫CJ18標平鎮車站路段地下化工程	10,788.00		
	377	「臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」CJ17標中壢車站路段鐵路地下化工程	3,384.00		
	378	臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫CJ12標桃園車站路段鐵路地下化工程營建剩餘土石方處理計畫-既有建物拆除工程	804.00		
	379	臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫 CJ13 標中路車站路段鐵路地下化工程	4,716.00		
	380	臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫CJ12標桃園車站路段鐵路地下化工程營建剩餘土石方處理計畫(第一階段)	11,784.00		
交通部民用航空局 臺北國際航空站	381	松山機場排水等設施改善工程	2,592.00	2,592.00	
交通部公路局 北區養護工程分局	382	台61線蘆竹路段增設北向地磅站工程	1,140.00	1,344.00	
	383	台15線竹園大橋改建工程	204.00		
交通部公路局 北區公路新建工程	384	台66線6K+500~9K+100平交路口高架化改善工程	4,872.00	10,560.00	
	385	淡江大橋及其連絡道路5K+000~7K+035新建工程	5,688.00		
交通部高速公路局 第一新建工程分局	386	國道1號林口交流道改善工程(第I104S標)	43,776.00	43,776.00	
交通部高速公路局 北區養護工程分局	387	國道1號北上5k+938m~7k+000m邊坡補強工程	1,356.00	1,896.00	
	388	基隆段114年台62線、台62甲線、台2線70K~98K、台2丁線預約及北分局轄區備援災害搶修工程	540.00		
國家鐵道博物館籌 備處	389	園區西側軌道復軌工程暨西宿舍周邊環境整備工程	3,204.00	4,416.00	
	390	國定古蹟臺北機廠軌道修復及再利用暨環境空間整備二期第一階段工程	1,212.00		
國營臺灣鐵路股份 有限公司	391	臺北市南港調車場都市更新事業計畫(單元一)新建	147,804.00	365,136.00	
	392	臺北市南港調車場都市更新事業計畫(單元二)新建	211,920.00		
	393	臺北市北投區員工訓練中心建物拆除工程	1,500.00		
	394	臺鐵車站美學及功能提升計畫—瑞芳車站廁所及無障礙環境改善工程	3,912.00		
國防部政務辦公室	395	國家軍事博物館新建工程	2,316.00	2,316.00	
國防部後備指揮部 北部地區後備指揮	396	新北市「台貿八村」不同意改建眷舍拆除暨圍籬工程	1,068.00	1,068.00	
國防部軍備局工程 營產中心北部地區	397	憲兵豐稔營區新建工程	3,612.00	15,672.00	
	398	復興崗職務宿舍新建統包工程-連續壁	12,060.00		
陸軍飛彈光電基地 勤務廠	399	臺北市萬華區九號基地暨楊榮宗散戶地上物拆圍工	960.00	1,452.00	
	400	臺北市大安區文昌街散戶地上物拆圍工程	492.00		
陸軍第三軍地區支 援指揮部	401	臺北市大安區「溫州街散戶」地上物拆圍工程	168.00	168.00	
海軍陸戰隊指揮部	402	下湖東營區步兵營二級廠整修工程	468.00	468.00	
空軍松山基地指揮	403	空軍K001統包新建工程	864.00	864.00	
國家中山科學研究 院	404	新北P071新建工程	372.00	2,916.00	
	405	桃園E120新建工程	2,544.00		
財政部關務署基隆	406	臺北港儀檢站軌道式貨櫃檢查儀建置	1,644.00	1,644.00	
臺灣銀行股份有限 公司	407	北安路報廢建築物拆除工程	768.00	768.00	
臺灣菸酒股份有限 公司	408	新北市深坑區埔新段958建號等9棟眷舍拆除統包工程案	228.00	228.00	

114年度臺北港物流倉儲區填海造地計畫收容營建剩餘土石方數量表					
申請單位	項次	工程名稱	數量	小計	單位合計
國立臺灣大學	409	國立臺灣大學教研實習大樓新建工程	6,408.00	24,036.00	
	410	國立臺灣大學南海段一小段263地號教職員宿舍新建工程(基地4)(第四次修正)	1,752.00		
	411	國立臺灣大學學生宿舍統包工程	4,872.00		
	412	台大敏盛護理健康大樓捐贈案新建工程結構體工程	6,804.00		
	413	機械系實習工廠拆除工程	4,200.00		
國立臺灣大學醫學院附設醫院	414	仁愛醫護大樓新建工程	468.00	468.00	
國立台北大學	415	臺北大學民生校區產學合作中心及校友會館新建營運移轉案	5,052.00	6,756.00	
	416	三峽校區「第二校門軸線及跨圳景觀橋改善工程」	1,704.00		
國立體育大學	417	志清湖戶外水域訓練基地工程	2,880.00	2,880.00	
國立臺北科技大學	418	職務宿舍新建工程	960.00	960.00	
國立清華大學	419	清華大學月涵堂遷移、修復暨台北政經學院大樓新建工程	4,164.00	4,164.00	
國立臺灣藝術大學	420	校區學生宿舍興建工程	6,456.00	6,456.00	
國立臺灣戲曲學院	421	國立臺灣戲曲學院內湖校區劇藝教學大樓新建工程	8,088.00	8,088.00	
臺灣警察專科學校	422	新北市新店區明德段982地號舊眷舍拆除工程	1,128.00	1,128.00	
臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司	423	財政部關務署基隆關西16私貨倉庫新建工程及周遭港區配合工程	684.00	24,768.00	
	424	基隆港西二、西三倉庫後線景觀工程	372.00		
	425	基隆港務警察總隊辦公廳舍新建工程	180.00		
	426	臺北港第二散雜貨儲運中心113年度水溝清淤及道路整修工程案	4,380.00		
	427	114年度臺北港區道路及公共設施維護工程	348.00		
	428	臺北港N7號貨櫃碼頭及後線貨櫃場新建工程	18,804.00		
			3,879,984.53	3,879,984.53	3,879,984.53

保證金收據日期	機關名稱	案件名稱
2021-12-29	中華郵政股份有限公司	桃園中壢郵局新建工程
2024-05-30	內政部(資訊中心)	內政部資訊服務大樓重建工程
2025-01-20	內政部土地重劃工程處	機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第九標公滯六聯外排水及廢棄物清理工程
2023-12-14	內政部國土管理署 北區都市基礎工程分署	忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程
2024-03-11		新北市林口區A3計畫道路新闢工程
2024-09-27		建置高生物安全檢驗及動物試驗中心新建工程
2025-09-08		衛生福利部防疫中心興建工程
2026-01-30		國家考試閱場及數位多功能考場大樓新建工程
2020-08-24	內政部國土管理署 (原內政部營建署)	新北市中和區警消社會住宅統包工程
2022-10-25		資安園區統包工程
2023-08-14		內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程
2022-03-03	內政部國土管理署北區工程處(臺北工務所)(原內政部營建署)	臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程
2022-06-29	內政部國土管理署北區工程處台北工務所(原內政部營建署)	現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程
2025-01-22	台灣中油股份有限公司	汐止捷運換管工程(第一階段)
2026-01-23	油品行銷事業部基隆營業處	北寧路加油站改建工程
2026-03-12	台灣中油股份有限公司桃園營業處	桃園處新富加油站管線設備汰換改善工作
2022-12-29	台灣中油股份有限公司 液化天然氣工程處	觀塘接收站外推方案之外廓防波堤新建工程(GAX1026002)
2024-03-13	台灣自來水股份有限公司 北區工程處	板橋區南雅南路PSCP管線更生統包工程
2024-04-29		浮洲加壓站至板新場管(七)潛盾工程
2024-05-27		浮洲加壓站至板新場管線工程(六)
2024-11-20		石門淨水場廢水處理設備工程
2026-03-26		蘆北配水池加壓站自來水管線工程(一)
2026-04-23		林莊淨水場重建工程
2022-08-05	台灣自來水股份有限公司 第一區管理處	新北市茂林里無自來水延管工程
2024-04-18		大慶大城高地社區供水管線改善工程
2024-06-14		113年度基隆市中山、安樂、七堵區管線單價採購工程
2024-09-19		113年度基隆市中正、仁愛、信義、暖暖區管線單價採購工程
2024-11-18		113年度淡水所管線工程單價採購
2025-02-21		113年度萬金所轄區管線工程單價採購
2025-07-10		114年度基隆市中山、安樂、七堵區管線單價採購工程
2025-07-24		114年度淡水所管線工程單價採購
2025-08-22		新北市石門區楓林路汰換管線工程
2025-09-05		114年淡水營運所用用戶用水設備新改裝工作採購契約
2026-01-15		淡水營運所114-115年度管線設備維修工程(開口契約)
2026-02-23		新北市深坑區北深路三段189巷、192巷、206巷、243巷、286巷汰換管線工程
2026-03-02		113至114年度文山營運所轄區管線單價採購
2026-03-13		114年度基隆市中正、仁愛、信義、暖暖區管線單價採購工程
2026-04-08		基隆市信義區深澳坑路200號至277號汰換管線工程
2026-04-27		基隆市中正區山海關高地社區管線工程
2018-05-31	台灣自來水股份有限公司 第二區管理處	龜山服務所105年度分區計量管網計畫工程
2025-05-09		114年度龜山林口服務所管線工程單價採購(含給水廠)-開口契約
2025-08-19		大園區中正東路配合航空城C2目標管線臨遷工程(經費補助)
2025-10-31		航空城龍安供水系統前端瓶頸段改善工程(管一)
2025-05-09	台灣自來水股份有限公司 第二區管理處龜山服務所	龜山區光榮路及光明街等汰換管線工程

保證金收據日期	機關名稱	案件名稱
2022-01-25	台灣自來水股份有限公司 第十二區管理處	樹林區中正路及大安路管線工程-管(二-1)
2023-08-17		樹林區中正路及大安路管線工程-管(二-3)
2024-01-17		鶯歌區中正二路1000mm管線工程
2024-03-13		泰山營運所用用戶用水設備新裝工程單價採購113~114年度(開口契約)
2025-03-19		新莊區環河路800mm管線工程
2025-03-20		新莊區建安街等巷弄汰換管線工程
2025-04-10		管線工程單價採購-新泰塹仔圳重劃區(114年度)
2025-04-29		五股區成泰路一段800mm汰換管線工程
2025-06-02		土城區員林街等汰換管線工程
2025-06-27		管線工程單價採購-丁區(114年度)(開口契約)
2025-08-27		新莊服務所用用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購114年度
2025-08-27		泰山營運所用用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購114年度
2025-09-09		蘆洲服務所114-115年管線設備維修工程
2026-01-07		樹林區大安路1350mm配合捷運永遷推進工程(一)
2026-01-20		中和區壽德街管線工程及捷運萬大線第一期CQ860標連城路600mm管線永遷工程
2026-02-09		八里區中華路二、三段等汰換管線工程
2026-02-11		管線工程單價採購-丙區(114年度)
2026-02-11		蘆洲區民生街、中山一路、鶯江街及信義路巷弄等汰換管線工程
2026-04-10		管線工程單價採購-新莊所轄區(115年度)(開口契約)
2026-04-17		三重區五谷王南街等巷弄汰換管線工程
2026-04-17		管線工程單價採購-板橋所轄區(115年度)(開口契約)
2026-04-28		管線工程單價採購-板新給水廠轄區(115年度)(開口契約)
2026-04-30		管線工程單價採購-土城所轄區(115年度)(開口契約)
2025-07-29	台灣電力公司協和發電廠	協和發電廠舊#1、2除役機組報廢設備拆除工作(含標售)
2026-03-19	台灣電力公司輸變電工程處 中區施工處	寶山E/S暨所內連接站新建土建統包工程
2023-12-18	台灣電力股份有限公司	淡水服務所及區域巡修中心新建工程(111淡建字第00506號)
2025-11-27	台灣電力股份有限公司大潭發電廠	114~115年度大潭發電廠循環水取水道維護作業
2021-11-08	台灣電力股份有限公司 台北北區營業處	110年丙工區配電管路及零星外線綜合工程
2022-01-12		台北北區營業處111年乙工區配電管路及零星外線綜合工程
2022-06-24		台北北區營業處111年丙工區配電管路及零星外線綜合工程
2023-04-25		台北北區營業處112年丙工區配電管路及零星外線綜合工程
2023-07-25		台北北區營業處112年甲工區配電管路及零星外線綜合工程
2024-03-08		台北北區營業處112年甲工區零星配電管路及零星外線綜合工程
2024-03-15		台北北區營業處113年乙工區配電管路及零星外線綜合工程
2024-05-17		台北北區營業處113年丙工區配電管路及零星外線綜合工程
2024-08-14		台北北區營業處113年甲工區配電管路及零星外線綜合工程
2024-11-15		台北北區營業處113年乙工區零星配電管路及零星外線綜合工程
2025-05-02		台北北區營業處114年乙工區配電管路及零星外線綜合工程
2025-05-23		台北北區營業處114年甲工區配電管路及零星外線綜合工程
2025-05-23		台北北區營業處114年丙工區零星配電管路及零星外線綜合工程
2025-11-12		台北北區營業處114年乙工區零星配電管路及零星外線綜合工程
2025-11-19		台北北區營業處114年丙工區零星配電管路及零星外線綜合工程(第二期)
2025-12-05		114年乙工區配電人、手孔蓋升降及周邊加固工作承攬契約
2026-03-11		114年甲工區配電人、手孔蓋升降及周邊加固工作承攬契約

保證金收據日期	機關名稱	案件名稱
2017-09-15	台灣電力股份有限公司 台北市區營業處	106年甲工區配電管路及零星外線綜合工程
2018-07-13		107年乙工區配電管路及零星外線綜合工程
2022-03-08		台北市區營業處111年甲工區配電管路及零星外線綜合工程
2024-01-23		台北市區營業處113年乙工區配電管路及零星外線綜合工程
2024-04-30		台北市區營業處113年北工區配電管路及零星外線綜合工程
2024-10-08		台北市區營業處113年甲工區配電管路及零星外線綜合工程
2024-10-08		台北市區營業處113年南工區配電管路及零星外線綜合工程
2025-05-23		台北市區營業處114年乙工區配電管路及零星外線綜合工程
2025-06-17		台北市區營業處114年甲工區配電管路及零星外線綜合工程
102年	台灣電力股份有限公司 台北西區營業處	台北西區營業處104年丙工區配電管路工程
2021-04-21		台北西區營業處110年丙工區配電管路工程
2022-02-25		台北西區營業處111年丙工區配電管路工程
2022-11-22		台北西區營業處112年丙工區配電管路工程
2023-01-07		東煒大型用電案管路先行(五股地區)工程
2023-06-20		台北西區營業處112年乙工區配電管路工程
2023-07-17		台北□區營業處112年丙□區零星配電管路□程
2023-12-14		台北西區營業處113年丙工區配電管路工程
2024-07-01		台北西區營業處南亞科技股份有限公司新增設用電工程(管路先行)
2024-08-12		台北西區營業處113年丙工區零星配電管路工程
2024-11-25		台北西區營業處林口區A3都市計劃道路新闢工程(管路預埋)
2025-03-03		台北西區營業處114年丙工區配電管路工程
2025-04-08		台北西區營業處114年乙工區配電管路工程
2025-04-30		台北西區營業處林口區A3都市計畫道路(道路拓寬路段管路工程)
2025-06-10		台北西區營業處坪頂DS新增4號主變零資添管工程
2025-09-04		台北西區營業處114年甲工區配電管路工程
2025-09-11		台北西區營業處114年丙工區零星配電管路工程
2026-03-10		台北西區營業處115年丙工區配電管路工程
2022-04-26	台灣電力股份有限公司 台北南區營業處	110年度人、手孔蓋升降及周邊加固維護工作承攬契約(甲工區)
2024-01-22		台北南區營業處113年乙工區配電管路工程
2024-04-24		台北南區營業處113年甲工區配電管路工程
2024-09-20		台北南區營業處113年乙工區配電零星管路工程
2024-10-25		台北南區營業處113年甲工區配電零星管路工程
2025-03-17		台北南區營業處114年乙工區配電管路工程
2025-05-20		台北南區營業處114年甲工區配電管路工程
2025-09-23		台北南區營業處114年乙工區零星配電管路工程
2025-09-23		台北南區營業處萬隆P/S電纜涵洞電力管路推管工程
2022-04-07	台灣電力股份有限公司 基隆區營業處	基隆區營業處111年甲工區配電管路工程
2022-10-13		基隆區營業處111年乙工區配電管路工程
2023-03-25		基隆區營業處112年甲工區零星配電管路工程
2024-01-09		基隆區營業處113年甲工區配電管路工程
2024-04-12		基隆區營業處112年乙工區配電管路工程
2025-03-20		基隆區營業處114年甲工區配電管路工程
2025-07-16		基隆區營業處114年乙工區配電管路工程
2026-04-14		基隆區營業處115年甲工區配電管路工程
2025-11-26	台灣電力股份有限公司 台北供電區營運處	345kV協和~深美線#3等7座基礎改建及補強工程

保證金收據日期	機關名稱	案件名稱
2018-07-30	台灣電力股份有限公司 桃園區營業處	107年戊工區配電管路及零星外線綜合工程
2020-03-16		109年丁工區配電管路及零星外線綜合工程
2020-08-20		109年甲工區零星配電管路工程
2021-01-12		桃園區營業處110年甲工區配電管路工程
2021-05-04		桃園區營業處110年丁工區配電管路及零星外線綜合工程
2021-08-24		110年甲工區零星配電管路工程
2021-12-24		桃園區營業處110年丁工區零星配電管路及外線綜合工程
2022-03-01		桃園區營業處111年乙工區配電管路工程
2022-03-02		桃園區營業處111年丙工區配電管路工程
2022-03-21		桃園區營業處111年甲工區配電管路工程
2022-07-26		桃供011號大溪區慈湖路地下化工程
2022-07-26		桃擴924號忠福D/S#3A主變改壓管路工程
2022-08-25		桃園區營業處111年丁工區配電管路工程
2022-09-22		台灣電力股份有限公司桃園區營業處111年丙工區零星配電管路工程
2022-10-24		桃園區營業處111年乙工區零星配電管路工程
2022-11-07		桃園區營業處111年甲工區零星配電管路工程
2022-11-17		桃擴031號平鎮區山峰自辦市地重劃管路埋設工程(3)
2022-12-30		桃擴030號平鎮區山峰自辦市地重劃管路埋設工程(1)
2023-04-17		桃園區營業處112年乙工區配電管路工程
2023-05-08		桃園區營業處112年丙工區配電管路工程
2023-05-10		桃園區營業處112年甲工區配電管路工程
2023-12-07		桃園區營業處112年乙工區零星配電管路工程
2024-01-03		桃園區營業處112年丁工區配電管路工程
2024-01-25		桃園區營業處112年甲工區零星配電管路工程
2024-02-06		桃園區營業處113年丙工區配電管路工程
2024-05-21		桃園區營業處113年乙工區配電管路工程
2024-07-01		桃供131號蘆竹區南山路三段地下化工程
2024-08-28		桃園區營業處113年甲工區零星配電管路工程
2024-12-02		桃園區營業處113年丙工區零星配電管路工程
2024-12-26		桃園區營業處113年乙工區零星配電管路工程
2025-01-03		桃擴226號大園區菓林重劃區區外銜接管路工程
2025-02-05		桃園區營業處113年丁工區配電管路工程
2025-06-13		桃園區營業處114年甲工區配電管路工程
2025-08-20		桃園區營業處114年乙工區配電管路工程
2025-09-01		桃園區營業處114年丙工區配電管路工程
2025-09-19		桃園區營業處114年丁工區零星配電管路工程
2026-01-29		桃供404號桃園市觀音區廣福(第五單元)自辦市地重劃區(2)管路新設工程
2026-03-19		桃園區營業處114年乙工區零星配電管路工程
2026-03-30		桃園區營業處114年度甲工區零星配電管路工程
2019-04-09	台灣電力股份有限公司 核能火力發電工程處北部施工處	大潭電廠7、8、9號機抽水機房暨進出水暗渠等新建工程
2021-05-03		大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫-7號機單循環擴建複循環發電機組設備採購帶安裝
2023-07-31		大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫重機械維修房及修理工場新建工程
2024-04-18		大潭電廠既有進水灣維護清淤工程
2025-12-02		大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫-7號機單循環擴建複循環發電機組設備採購帶安裝案
2024-12-13	台灣電力股份有限公司 第二核能發電廠	核二廠財產區土石清理工作
2026-04-17	台灣電力股份有限公司 新竹區營業處	新供403號經濟部水利署北區水資源分署線路遷移工程

保證金收據日期	機關名稱	案件名稱
105年	台灣電力股份有限公司 輸變電工程處北區施工處	福和D/S暨多目標綜合大樓新建工程
2022-05-12		161KV松樹~廣豐(航捷南)線電纜線路土木暨附屬機電統包工程
2019-03-14		161kV大潭新~林口線地下電纜管路統包工程(第二工區)
2022-09-12		中山D/S改建暨大安~中山161kV線潛盾洞道新建統包工程
2023-07-10		161kV 林口~東林雙分歧西濱管路暨附屬機電工程五工區
2023-08-15		樹德P/S改建統包工程
2023-10-20		161kV林口~東林雙分歧西濱管路暨附屬機電工程五工區
2023-10-25		161kV聖亭~欣揚A電纜線路土木暨機電統包工程
2023-11-29		161kV 板城~遠信線等3案地下管路統包工程
2024-03-01		松湖超高壓變電所暨多目標大樓統包新建工程
2024-06-04		345kV核一~汐止一進一出松湖線#29A連接站及銜接洞道土木 統包工程
2024-06-18		161kV週美~潭美管路統包工程
2024-06-19		161kV楊梅~景揚線地下電纜管路工程
2024-11-06		161kV樹林~南樹線等2案地下管路統包工程
2025-01-22		頂湖E/S裝設土木工程
2025-04-24		陽明PS擴建工程(第1階段)
2025-05-28		161kV埔心~五權線地下電纜管路工程
2026-02-04		161kV龍顯~聖亭線地下電纜管路統包工程(第五工區)
2026-02-09		蘆洲P/S改建土木工程(臨時69KV GIS及電纜支架)
2026-03-30		深美E/S 345kV終端設備裝設基礎土木工程
2024-08-21	交通部公路局 北區公路新建工程分局	台66線6K+500~9K+100平交路口高架化改善工程
2026-03-25		台61線(WH-1N)新北段15K+505~16K+800平交路口改善工程
2026-04-17		台66線0K+000-3K+200段平交路口高架化改善工程
2024-05-27	交通部公路局 北區養護工程分局	台61線蘆竹路段增設北向地磅站工程
2024-12-12		台15線竹圍大橋改建工程
2025-06-20		基隆段114年台62線、台62甲線、台2線70K~98K、台2丁線預約及北分局轄區備援災害搶修工程
2026-02-10		中和段115年台3、台7乙線預約及北分局轄區備援災害搶修工程
2026-02-10		中和段115年台3、台7乙線預約災害修復工程
2026-03-23		基隆段115年台62線、台62甲線、台2線70K~114K、台2丁線、台2丙線8K~30K預約災害修復工程
2019-04-17	交通部公路總局 西部濱海公路北區臨時工程處	淡江大橋及其連絡道路5K+000~7K+035新建工程
2022-04-13		台64線銜接台61線南向匝道改善工程
2018-06-14	交通部民用航空局臺北國際航空站	松山機場跑道整修工程
2024-10-28		松山機場排水等設施改善工程
2022-11-07	交通部高速公路局北區養護工程分局	汐止出口匝道坍滑搶災
2025-12-03		高速公路北區影像監視盲區補設CCTV設備採購案(現場標)
2026-03-13		國道5號北上5k+780m~5k+820m邊坡補強工程
2026-04-22		國道3甲逆向萬芳交流道左側出口環道0k+000m~0k+230m等2處邊坡地錨減量與退場補強工程
2021-05-11	交通部高速公路局第一新建工程處	國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工(區段2-2)第M38D1標-國3基隆汐止段
2023-11-15		國道1號林口交流道改善工程(第I104S標)
2024-04-19		國道3號增設金城交流道工程
2025-12-26		國道1號五股交流道增設北入及北出匝道工程(第I103S標)
2017-09-25	交通部高速鐵路工程局	高速鐵路桃園車站特定區產業專用區開發經營案(複合型大樓A基地新建工程)
2026-02-02	交通部鐵道局	高速鐵路桃園車站特定區事業發展用地開發經營案
2025-04-02	交通部鐵道局北部工程處 (原交通部鐵道局北部工程分局)	臺鐵都會區捷運化桃園段地下化設計計畫CJ12標桃園車站路段鐵路地下化工程營建剩餘土石方處理計畫(第一階段)
2025-06-11		臺鐵都會區捷運化桃園段地下化設計計畫CJ12標桃園車站路段鐵路地下化工程營建剩餘土石方處理計畫-既有建物拆除工程
2025-06-27		臺鐵都會區捷運化桃園段地下化設計計畫CJ16標中原車站路段鐵路地下化工程
2025-07-03		臺鐵都會區捷運化桃園段地下化設計計畫CJ13標中路車站路段鐵路地下化工程

保證金收據日期	機關名稱	案件名稱
2020-04-27	交通部鐵道局北部工程處	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統暨延伸中壢火車站建設計畫CM01區段標
2021-09-30		增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫 CH01標 鳳鳴臨時站工程
2024-11-20		臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫CJ18標平鎮車站路段地下化工程
2024-12-03		臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫-CJ17標中壢車站路段鐵路地下化工程
2026-03-09	交通部觀光署北海岸及 觀音山國家風景區管理處	石門洞據點及周邊景觀改善工程
2025-11-26	空軍松山基地指揮部	K002專案用地設施新建案
2023-02-23	空軍通信航管資訊聯隊	空軍K001營區統包工程
2026-04-08	桃園市大溪區員樹林國民小學	迎曦樓老舊校舍拆除環境整建暨新建教學大樓工程
2018-10-18	桃園市立新屋高級中等學校	桃園市立新屋國民中學改制新屋高中新建校舍及游泳池工程
105年	桃園市政府水務局	桃園市桃林鐵路（山鶯路）雨水下水道工程
2026-02-02		八德區和平路及重慶街RE-B幹線雨水下水道工程
2026-03-16		桃園區龍壽街、龍壽街86巷、龍山國小一帶排水改善工程(龍祥街－龍泉六街)
2025-02-26		桃園市龜山區善捷段及興安段新建社會住宅統包工程-善捷段
2021-09-23	桃園市政府建築管理處	上福土石方堆置處理場後端去化工程-運台北港110年度第3季-1
2021-09-23		新品土石方堆置處理場後端去化工程-運台北港110年度第3季-1
2021-11-12		詠源土石方資源堆置轉運處理場後端去化（運至臺北港110年第4季-1）
2021-11-24		保障土石方資源堆置處理場後端去化（運至臺北港110年第4季-1）
2026-03-18		詠源土石方資源堆置轉運處理場後端去化(運至臺北港115年第一季第1次)
2026-04-21		石鼎土石方資源堆置處理場後端去化(運至臺北港115年第二季第1次)
2026-04-23		上福土石方堆置處理場後端去化(運至臺北港115年度第2季-1)
2019-11-20	桃園市政府捷運工程局	臺鐵林口線路廊活化工程第四標(大坑路至南山路自行車道及橋梁工程)
2021-07-27		桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程-小圓潛盾隧道工程
2021-09-22		桃園捷運綠線 GC02 標南出土段至 G07 站(不含)間地下段土建統包工程-G04站既有結構物拆除
2022-06-30		桃園捷運綠線 GC02 標南出土段至 G07 站(不含)間地下段土建統包工程)
2024-05-21		「桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程」營建剩餘土石方處理計畫(第二十一階段)G07車站開挖工程
2025-07-24		桃園捷運綠線GC02標南出土段至G07站(不含)間地下段土建統包工程-G05站至G06站潛盾隧道工程
2025-08-12		桃園捷運綠線GC02標南出土段至G07站(不含)間地下段土建統包工程-G06站至G07站(不含)潛盾隧道工程
2026-02-02		打造市民友善無礙人行示範道路(中正北路320巷~蘆興街)
2017-12-29		中壢第一公有零售市場新建工程
2018-10-16		北景雲計畫(八德國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心暨公托日照中心)統包工程
2024-06-03	桃園市政府新建工程處	桃園市立環北國民中學新建校舍工程
2024-06-25		桃園市立龍興國民小學新建校舍工程
2024-12-03		桃園市龜山國民運動中心新建工程
2025-03-12		桃園市龜山區文化一路至青山路道路新闢工程
2025-05-14		桃園市八德區仁德國民小學新建校舍工程(第一期)
2025-08-20		桃園市八德區興豐段1486、1487地號公共化幼兒園、大成段88-1、93地號公共化幼兒園及大成國小後門新建工程
2025-11-28		桃園市中壢區自立國民小學新建活動中心工程
2026-01-20		桃園市大園區航科國民小學新建校舍工程(第一期)
2026-02-24		桃園市政府公教人員訓練中心(含警訓中心)新建工程
2025-10-07	桃園市政府經濟發展局	桃園市幼獅青年創業村暨智慧製造園區/(114)桃市都建執照字第會揚00611號
2019-06-18	桃園市政府養護工程處	桃園閃耀雙城飛翔-長庚新驛站亮點工程
2020-05-22		109年度人行道改善及修繕工程開口契約(第四工區)
2020-08-10		桃園市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案-北區路燈供電纜線工程)
2024-11-29		桃園市中壢區人本示範道路-龍慈路(龍岡路三段-中山東路三段)人本環境多目標改善工程)
2025-10-31	桃園市桃園區會稽國民小學	天真樓拆除工程
2024-12-27	桃園市蘆竹區公所	桃園市蘆竹區南工路一段KAE-L幹線雨水下水道工程
2024-11-05	桃園市觀音區草漯國民小學	桃園市觀音區草漯國民小學增建校舍及周邊附屬工程(113)桃市都建執照字第會觀00586號
2025-12-12	海軍陸戰隊指揮部	下湖東營區步兵營二級廠整修工程
2025-06-19	國立台北科技大學	職務宿舍新建工程

保證金收據日期	機關名稱	案件名稱
2026-04-28	國立台灣大學醫學院附設醫院	林森大樓新建工程
2025-09-22	國立政治大學	(國立政治大學指南校區學生宿舍新建工程(第三期))
2022-10-27	國立故宮博物院	國立故宮博物院北部院區行政大樓及圖書館新建工程
2026-04-27	國立國父紀念館	直轄市定古蹟國立國父紀念館大會堂暨周邊設施升級工程
2025-08-25	國立基隆高級商工職業學校	行政教學大樓新建工程
2024-08-21	國立清華大學	清華大學月涵堂遷移、修復暨台北政經學院大樓新建工程
2018-11-05	國立陽明大學	士林校區創新育成大樓興建工程
2025-07-16	國立臺北大學	臺北大學民生校區產學合作中心及校友會館新建營運移轉案
2026-04-16		玉山永續講堂新建工程
2019-03-22	國立臺灣大學	人文館新建工程
2023-11-01		國立臺灣大學龍泉段一小段447地號等四筆教職員宿舍新建工程(基地5)
2024-10-22		國立臺灣大學教研實習大樓新建工程
2025-01-22		國立臺灣大學學生宿舍統包工程
2025-03-24		台□敏盛護理健康□樓捐贈案新建□程結構體工程
2026-01-21		校園藍帶及瑠公圳意象再造工程(修正後)
2026-01-21		小福樓拆除工程
2023-06-15		國立臺灣戲曲學院內湖校區劇藝教學大樓新建工程
2025-04-14	國立臺灣藝術大學	校區學生宿舍興建工程
2025-12-15		北側回收房舍大觀路一段39巷3號拆除整建工程
2025-04-08	國立歷史博物館	國立歷史博物館典藏文物庫房新建工程
2021-01-07	國防大學	復興崗校區衛生下水道工程(第二期)
2021-06-18	國防部政務辦公室	國家軍事博物館新建工程
2021-11-15	國防部軍備局工程營產中心 北部地區工程營產處	「大直營區綜合大樓新建工程」
2022-11-14		復興崗職務宿舍新建統包工程
2024-01-31		復興崗職務宿舍新建統包工程-連續壁
2024-04-11		憲兵豐稔營區新建工程
2024-04-16		國醫中心營區宿舍大樓新建統包工程-土方工程(臺北港)
2026-02-24		陸軍「漢陽營區新建工程」
2026-04-13		國軍忠靈二殿興建工程
2021-03-18	國防部憲兵指揮部	堅實營區特種作戰綜合訓練場新建工程
2023-06-07	國防醫學院三軍總醫院	三軍總醫院新建重症醫療大樓計畫統包工程
2024-04-11		汀州院區麥範德建築物拆除工程
2023-05-08	國防醫學院預防醫學研究所	實驗室設備暨設施
2023-12-01	國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家	八德榮家新建失智專區統包工程
2024-03-12	國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家	板橋榮民之家失智專區新建統包工程
2024-06-24	國家人權博物館	國家人權博物館(白色恐怖景美紀念園區)修增建工程
2025-03-13	國家中山科學研究院	新北P071新建工程
2025-08-13		桃園E120新建工程
2024-10-07	國家表演藝術中心國家兩廳院	藝文推廣廊道暨地面景觀設施工程
2018-03-23	國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 (原科技部科技部新竹科學工業園區管理局)	園區龍潭基地開發工程—污水處理廠第二期第一階段工程後續工程
2026-03-19	國家科學及技術委員會 新竹科學園區管理局	新竹科學園區湖濱一路宿舍新建工程
2026-04-10		新竹科學園區X基地第二及第三軟體大樓新建工程
2026-04-27		台灣積體電路股份有限公司寶山二期新建工程
2024-04-17	國家鐵道博物館籌備處	園區西側軌道復軌工程暨西宿舍周邊環境整備工程
2025-06-30		國定古蹟臺北機廠軌道修復及再利用暨環境空間整備二期工程
2026-05-04		國定古蹟臺北機廠軌道修復及再利用暨環境空間整備二期第二階段工程

保證金收據日期	機關名稱	案件名稱
2022-01-03	國家住宅及都市更新中心	台北市松山延吉段社會住宅新建統包工程
2022-02-17		新北市泰山中山段社會住宅(一期)暨國軍職務宿舍新建統包工程
2022-05-25		台北市信義區兒童福利中心B1-1號基地（永吉段三小段869-3地號等13筆土地）都市更新事業-臺北市111建字第0087號
2022-11-25		新北市淡水區「淡海安居」社會住宅新建統包工程
2023-05-20		新北市土城區「頂福安居」2處基地社會住宅新建統包工程
2023-11-16		新北市汐止區「崇德好室」社會住宅新建統包工程(112汐建字第302號)
2023-12-05		新北市中和區連城安居社會住宅新建統包工程
2023-12-07		新北市林口區「文仁安居」社會住宅新建統包工程
2024-03-04		基隆市七堵區「光明安居」社會住宅新建統包工程
2024-08-29		新北市淡水區『淡金安居』社會住宅新建統包工程
2024-10-15		新北市樹林區樹德安居社會住宅新建統包工程(A基地)
2024-10-18		新北市樹林區樹德安居社會住宅新建統包工程(B基地)
2024-12-06		臺北市大安區辛亥段四小段61地號等28筆土地公辦都市更新案
2024-12-31		臺北市萬華區凌霄好室社會住宅新建統包工程
2025-01-23		新北市中和區景新段63地號等6筆土地都市更新事業計畫暨權利變換計畫案(113中建字第00260號)
2025-01-23		新北市中和區景新段63地號等6筆土地都市更新事業計畫暨權利變換計畫案(113中建字第00261號)
2025-03-20		桃園市中壢區振興安居社會住宅暨國軍職務宿舍新建統包工程-國軍職務宿舍(113)桃市都建執照字第會壘00769號
2025-03-20		桃園市中壢區振興安居社會住宅暨國軍職務宿舍新建統包工程振興安居社會住宅(113)桃市都建執照字第會壘00772號
2025-04-24		臺北市南港區「光華好室」社會住宅暨國軍職務宿舍新建統包工程
2025-07-25		新北市泰山區「貴和安居」(二期)社會住宅新建統包工程
2025-08-12		臺北市北投區稻香安居社會住宅新建工程
2025-08-27		國家住宅及都市更新中心(114)桃市都建執照字第會壘00786號-桃園市中壢區「過嶺安居」社會住宅新建統包工程
2025-10-02		桃園市中壢區『富台安居』社會住宅新建統包工程
2025-11-03		臺北市士林區「芝山安居」社會住宅新建統包工程(社宅區)
2025-12-17		臺北市文山區保儀安居社會住宅新建統包工程
2025-12-23		新北市三重區「五谷好室B」社會住宅新建統包工程
2026-03-10		新北市中和區「德穗安居」社會住宅暨板橋監理站新建統包工程
2026-03-16		新北市泰山區貴和安居(二期)社會住宅新建統包工程)
2026-04-01		新北市中和區「德光安居」社會住宅新建統包工程
2024-03-13	國營臺灣鐵路股份有限公司	臺北市南港調車場都市更新事業計畫(單元一)新建工程
2024-03-13	(原交通部台灣鐵路管理局)	臺北市南港調車場都市更新事業計畫(單元二)新建工程
2024-11-18	國營臺灣鐵路股份有限公司	臺鐵車站美學與功能提升計畫－瑞芳車站廁所及無障礙環境改善工程案
2025-03-12	基隆市中山區德和國民小學	德和國小老舊校舍拆除改建(德興樓)工程)
2021-08-30	基隆市中山國民小學	基隆市中山國小-專科教室A拆除工程
2024-08-13	基隆市立安樂高級中學	安樂高中老舊校舍拆除改建(正德樓)工程)
2023-01-11	基隆市立體育場	基隆市立田徑場主建築拆除重建（含停車場）及周邊運動服務設施改善工程（重新招標）
2020-06-17	基隆市環境保護局	基隆市環境保護局(旭川水質改善現地處理工程)

保證金收據日期	機關名稱	案件名稱
2019-10-02	基隆市政府	基隆山海城串聯再造計畫工程
2022-07-26		基隆市污水下水道系統第三期實施計畫--北港系統管線新建工程-管線工程第九標
2023-04-17		基隆港東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程
2024-03-27		希望之丘中正公園天鵝洞周邊社區廊帶串聯計畫
2024-07-09		110年提升道路品質公共環境改善計畫-南榮路周邊人行環境改善(第一期)工程
2024-08-05		基隆市暖暖區源遠路改善工程(第一期)
2024-08-14		110年提升道路品質公共環境改善計畫-基隆市暖暖區過港路
2024-09-11		基隆市安樂區武隆街111巷雨水下水道工程
2025-01-20		基隆市南榮公墓生命典藏館新建工程
2025-05-14		南榮路周邊人行環境改善(第二期)工程
2025-07-04		基隆市安樂區基金三路雨水下水道工程
2025-07-14		基隆市安樂區長庚生活圈人行環境改善工程_安樂路二段、安和一街及建德幼兒園
2025-08-25		(113)基隆市中山區中和路雨水下水道工程
2025-09-05		(113)新豐街人行環境改善工程
2025-10-13		基隆市污水下水道系統第三期實施計畫-南河系統管線新建工程管線工程第十標
2026-02-05		基隆市鄰里停車空間建置及改善統包工程
2026-03-05		基隆市中正區舊公車維修廠頂棚、鐵皮拆除及營建廢棄物與垃圾清運統包工程
2026-03-27		暖暖區過港路、寧靜街宿舍拆除工程
2026-04-13		明德二路光明路口至七堵火車站前人行環境改善工程
2026-04-13		長興國小周邊通學步道改善工程計畫
2026-04-22		基隆市原深澳國小校舍建築物拆除工程
2025-04-21	陸軍飛彈光電基地勤務廠	臺北市萬華區九號基地暨楊榮宗散戶地上物拆圍工程
2025-11-03		臺北市大安區文昌街散戶地上物拆圍工程
2025-08-05	陸軍第三地區支援指揮部	台北市大安區溫州街散戶地上物拆圍工程
2024-02-27	陸軍第六軍團指揮部	新北市「昊天嶺營區」空置眷地遭占用拆屋還地工程
2026-04-02	新北市樹林區公所	115年度樹林區道路橋梁及附屬設施改善工程
2026-04-10		樹林區114年度道路橋梁及附屬設施改善工程(重新發包)
2021-12-27	新北市淡水區公所	淡水區公23公園及公8公園特色共融設施新設工程(第2次修正)
2023-06-20		淡水區崁頂市民活動中心暨公共化幼兒園新建工程
2026-02-04		115年度新北市淡水區道路橋梁及其附屬設施、災害搶修工程(開口合約)
2026-03-10		淡水區油車里沙崙路起至新民隧道上方前人行道改善工程
2026-03-10		115年度新北市淡水區道路橋梁及其附屬設施、災害搶修工程(開口合約)第2區
2026-03-30	新北市新店區公所	新店區115年度道路橋樑及附屬設施改善工程(開口合約)-第3區
2026-05-04		新店區115年度道路橋梁及附屬設施改善工程(開口合約)-第4區
2025-06-16	新北市八里區公所	114年度八里區雨水系統設施維護暨清疏工程(開口契約)
2026-04-13		115年度八里區道路附屬設施及排水等改善工程開口契約(北區)
2026-04-23		115年度八里區市管區域及其他排水維護改善工程(開口契約)
2026-03-25	新北市土城區公所	115年度新北市土城區人行道、橋梁、道路附屬設施急需、廳舍修繕及災害搶修復建工程-第1區
2026-02-10	新北市中和區公所	中和區115年度雨水系統清疏工程(開口契約)
2026-03-30	新北市中和區公所	中和區115年度道路橋梁及附屬設施零星修復工程(開口契約)-第4區
2026-04-23	新北市五股區公所	115年度五股區天然災害緊急搶修及復建工程(開口契約)
2026-03-20	新北市永和區公所	115年度永和區轄區道路橋梁、附屬設施及水利設施等改善工程(第A區)(含搶災工程)
2026-04-15		115年度永和區轄區道路橋梁、附屬設施及水利設施等改善工程(第B區)(含搶災工程)
2025-04-25	新北市汐止區公所	汐止區綜合運動場改善統包工程
2026-03-17		115年度汐止區雨水下水道及水利溝渠清疏、維護管理工程(開口契約)
2025-03-31	新北市板橋區板橋國民小學	新北市板橋區板橋國民小學增設板橋浮洲旗艦型非營利幼兒園興建工程(修正後)
2026-04-22	新北市立新莊國民中學	新北市立新莊國民中學114莊建字第196號-中正樓穿堂拆除整建工程
2024-09-24	新北市立福和國民中學	懿德樓拆除工程採購案
2025-10-15	新北市政府市場處	汐止中正公有零售市場新建工程案

保證金收據日期	機關名稱	案件名稱
2020-05-12	新北市政府交通局	(新莊運動公園地下停車場新建統包工程)
2023-05-24		板橋區溪北公園停車場新建工程
2023-12-05		板橋區信義國小停車場新建工程
2024-02-02		三重區信義公園停車場新建工程
2024-05-07		永和區永平國小(操場)停車場新建統包工程
2025-09-03	新北市政府地政局	新北市新店安坑輕軌K8站周邊地區(J單元)區段徵收開發工程
2025-02-14	新北市政府城鄉發展局	新北市蘆洲區光華段停車場及青年社會住宅新建統包工程
2025-03-05		土城員和社宅周邊人本環境(第一期)改善工程)
2025-04-21		三重區三重段停車場及青年社會住宅新建統包工程
2025-09-24		新北市淡水海天段青年社會住宅新建工程
2023-12-06	新北市政府消防局	特搜大隊、第六大隊、汐止分隊暨市民活動中心共構興建工程
2024-01-11		第一大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍興建工程
2024-11-26		泰山分隊興建工程
2020-12-11	新北市政府工務局	樹林聯安營建廢棄物資源再利用處理場(109年第4季)
2020-12-14		太平營建混合物資源處理場(110年第2季第1批)
2021-06-02		長惟營建剩餘土石方資源處理場(110年第2季第1批)
2021-06-25		淳家土石方資源堆置場(110年第2季第1批)
2021-07-02		淳家土石方資源堆置場(110年第2季第2批)
2021-09-15		世芳營建工程剩餘土石方處理場(110年第3季第1批)
2026-01-15		萬達發營建剩餘土石方資源處理場115年第1季第1批
2026-01-20		長惟工業營建剩餘土石方資源處理場(115年第1季第1批)
2026-01-27		(萬達發營建剩餘土石方資源處理場115年第1季第2批)
2026-02-02		淳家土石方資源堆置處理場(115年度第1季第1批)
2026-02-02		淳家土石方資源堆置處理場115年度第1季第1批
2026-03-05		元智大學新北分部校園土建工程-111林建字第351號建照工程
2026-03-09		興磊營建剩餘土石方資源處理場(115年第1季第2批)
2026-04-08		興磊營建剩餘土石方資源處理場(115年第2季第1批第2區)
2026-03-11		109中建字第179號建照工程
2026-03-19		109淡建字第336號建照工程
2026-03-25		113中建字第372號建照工程
2026-03-26		112土建字第442號建照工程
2026-03-27		113板建字第342號建照工程
2026-04-02		114莊建字第323號建照工程
2026-04-08		112土建字第0368號建照工程
2026-04-14		110中建字第0530號建照工程
2026-04-15		114莊建字第006號建照工程
2026-04-23		109中建字第356號建照工程
2026-04-28		114板建字第085號建照工程
2026-05-13		113重建字第419號建照工程
2026-05-13		114汐建字第076號建照工程

保證金收據日期	機關名稱	案件名稱
2020-07-01	新北市政府水利局	新北市新店區大鵬抽水站新建工程(修正後)
2021-07-12		新北市中和區壽德公園滯洪池工程
2022-08-15		新北市瓦礫溝清水引入工程
2022-11-24		新北市板橋地區污水下水道系統第三期工程第三標(支(分)管及用戶接管)
2022-12-22		新北市土城區土城抽水站機組擴建工程
2023-02-14		新北市蘆洲區水涵溝排水改善暨環境優化工程
2023-05-12		112年度全市污水下水道系統未納戶接管工程
2023-05-25		新北市土城地區污水下水道系統新建工程第十一標(分支管及用戶接管)
2023-06-29		新北市政府水利局111-112年度災害復建暨水利相關設施平時維護工程（北1區）
2024-08-01		新北市三峽區、鶯歌區污水下水道系統第二期工程污水管線第十標(次幹管、支(分)管及用戶接管)
2024-08-14		113年度新北市轄河川區排河道整治疏濬及相關設施維護工程(北2區)
2024-09-30		新北市塹仔圳貴子坑溪南側低地排水設施新建工程
2024-10-05		新北市塹仔圳塔寮坑溪南側低地排水設施新建工程
2024-11-14		新北市政府水利局113年度災害緊急搶修工程、復建工程暨水利設施平時維護工程
2024-12-13		新北市樹林地區污水下水道系統第二期第十七標工程
2025-06-02		貴子坑溪河川環境營造計畫第一標(第4區)
2025-08-08		新北市瑞芳地區污水下水道系統第一期第一標主幹管及瑞芳水資源回收中心進流管工程
2025-08-12		新北市中和地區污水下水道系統第三期工程第一標支管線及用戶接管工程(含前期未納戶)
2025-09-17		二重疏洪道左岸加高工程
2025-09-18		新北市永和地區污水下水道系統第二期第五-2標暨第六-1標後續工程
2025-10-20		國立華僑高中透水保水工程
2025-12-15		三重高中透水保水優化工程
2026-02-12		新北市新店地區污水下水道系統(第二期)新建工程第七標分支管網及用戶接管
2026-03-04		新北市永和地區污水下水道系統第二期第五-1標工程
2026-03-17		114~117年度新北市污水下水道系統未納戶接管工程(開口契約)第一標
2026-04-29		新北市政府水利局114-115年度災害復建暨水利相關設施平時維護工程(南1區)
2026-04-29		貴子坑溪河川環境營造計畫(第3-3標)
2025-08-13	新北市政府高灘地工程管理處	淡水河金色水岸竹圍金緞綠廊工程
104年	新北市政府捷運工程局	淡海輕軌運輸系統計畫第一期統包工程
2016-11-08		三鶯線捷運系統計畫統包工程
2020-12-14		環狀線新埔民生地下道工程
2023-12-25		捷運汐止東湖線要徑工程
2025-05-09		捷運新北環狀線新莊思源路排水改善統包工程
2025-07-14		淡海輕軌運輸系統計畫第二期路網先期標統包工程
2025-07-16		捷運汐止東湖線統包工程
2026-01-30		三鶯線永吉公園站捷運開發案
2026-02-09		臺北大學第二校門(警衛亭及校名柱工程)
2026-04-15		基隆捷運先期工程

保證金收據日期	機關名稱	案件名稱
105年	新北市政府新建工程處	新北市蘆洲區仁愛停車場多功能大樓新建工程
2018-10-29		新北市五股區更寮國民小學老舊校舍整建統包工程
2018-11-13		新北市板橋區江翠國民中學老舊校舍整建統包工程
2019-07-18		新北市板橋區中山國民小學老舊校舍改建暨地下停車場新建工程
2020-04-10		汐止區新社后橋園道段道路北延穿越高速公路至明峰街路段新闢道路工程(第一階段)
2020-10-22		新北市林口區東湖國民小學校舍暨市民多元服務設施新建工程處
2021-07-29		新北市三重區光榮國民小學老舊校舍整建統包工程(107重拆字第152號)
2021-08-24		新北市三重區五谷王北段305、308地號土地內暫屯土方處理清運工程
2022-07-04		110年新北市轄內公共工程等相關設施新闢、改善工程(第2區)
2022-11-30		新北市三鶯大橋改建工程-第二期工程
2023-02-18		新北湧蓮寺慈善公益大樓新建統包工程
2023-07-10		新北市汐止區秀峰高級中學老舊校舍(含忠孝樓及仁愛樓拆除)整建統包工程
2023-08-18		新北市三重區興穀國民小學操場興建地下停車場統包工程
2023-08-31		新北市立南勢國民中學校舍暨市民多元服務設施統包工程
2024-02-01		新北市板橋第二國民運動中心興建統包工程
2024-06-14		淡水河北側沿河平面道路工程
2024-06-18		113年新北市轄內公共工程等相關設施新闢、改善工程(南區)
2024-06-26		113年新北市轄內公共工程等相關設施新闢、改善工程(北區)
2024-09-13		新北市淡水區淡水國民小學校舍新建及信義樓拆除工程
2025-11-18		新北市瑞芳地政事務所暨瑞芳區衛生所辦公廳舍興建工程
2026-02-02		新北市瑞芳地政事務所暨瑞芳區衛生所辦公廳舍興建工程(主體工程)
2026-04-02		新北市立義學國民中學多功能體育館共構地下停車場新建工程(水溝出土)
2022-03-23	新北市政府經濟發展局	新北市林口區建林段392地號林口媒體園區(B基地)東森全球集團全球營運總部新建工程
2023-11-08		新北市林口區建林段386.387.388地號等3筆土地林口媒體園區複合式商業設施(A基地)
2025-08-07		林口東森集團全球營運總部新建工程-廣場主體工程
2025-10-02		(「南山新北市淡水沙崙園區暨停車場用地案停車場用地」新建工程)
2023-06-26	新北市政府農業局	111年度新北市天然災害緊急搶修復建工程及農業工程(第七區)-瑞芳區魚寮路(農北端007)尼莎颱風豪雨災害搶修及復建工程
2026-01-09	新北市政府違章建築拆除大隊	新北市三重區厚德國小和平樓拆除工程
2022-02-14	新北市政府養護工程處	(111年度新北市轄區內道路、橋梁改善工程(第4區))
2024-05-09		113年度新北市轄區內災害緊急搶修及復建工程(第3區)
2024-09-05		汐止區康寧街三期道路改善工程
2025-03-13		114年度新北市轄區內災害緊急搶修及復建工程(第2區)
2025-03-19		114年度新北市轄區內道路、橋梁改善工程(第3區)
2025-04-29		114年度新北市轄區內道路、橋梁改善工程(第4區)
2025-05-05		瑞芳區三瓜子坑路(瑞芳國中旁)人行環境改善工程
2025-09-09		鶯歌區建國路(南昌街至中正一路)人行道改善工程
2025-10-30		新北市美學示範基地人行空間完整計畫(府中雙城)都會區漢生東路人行道改善工程
2025-10-31		中和區橋和路(華中橋~中山路)橋和站周邊人行道改善工程
2025-11-05		三重區龍濱路(龍門路~長樂街)兩側人行道改善工程
2026-01-02		中和區興南路一段(景新街~南山路)南勢角站周邊人行道改善工程(A段)
2026-01-16		115年度新北市轄區內災害緊急搶修及復建工程(第4區)
2026-01-16		115年度新北市轄區內道路、橋梁改善工程(第4區)
2026-01-21		115年度新北市轄區內道路、橋梁改善工程(第1區)
2026-01-22		115年度新北市轄區內災害緊急搶修及復建工程(第3區)
2026-01-23		115年度新北市轄區內道路、橋梁改善工程(第3區)
2026-02-11		115年度新北市轄區內災害緊急搶修及復建工程(第2區)
2026-03-10		新莊區思源路跨越新北大道人行天橋新建工程(
2026-04-09		115年新北市轄區公有土地管理維護及活化工程(第1區)
2026-04-20		115年新北市轄區公有土地管理維護及活化工程(第2區)
2026-04-23		115年新北市人行陸橋暨人行地下道拆除預約式契約工程

保證金收據日期	機關名稱	案件名稱
2021-09-02	新北市政府漁業及漁港事業管理處	110年萬里區漁港疏浚改善工程
2021-01-06	新北市政府環境保護局	鶯歌廠廢棄物處理機構(110年第1季)
2026-02-26		鶯歌廢棄物處理場(115年第1季第1批)
2026-04-17		俊曜工程有限公司(115年第2季第1批)
2026-04-30		俊曜工程有限公司(115年第2季第2批)
2026-05-05		新莊區域性資源循環中心新建工程
2025-11-05	新北市政府殯葬管理處	淡水第一公園化公墓附設納骨塔及附屬建物拆除工程
2025-11-27		新北市新店五城花園環保葬區設置工程案
104年	新北市政府警察局	中和第二分局錦和派出所與財政部北區國稅局中和稽徵所新建工程共構案
2025-08-25	新北市政府警察局淡水分局	新北市政府警察局淡水分局新市派出所、淡海捷運分隊及消防局淡海分隊共構新建工程
2025-11-05	新北市政府體育局	新莊體育園區無障礙設施及周邊環境改善工程
2025-11-14		板橋第一運動場、第二運動場及樹林體育園區無障礙設施改善工程
2026-04-10	新竹市政府工務處	新竹市溪埔子排水第二分線水環境改善工程
2026-03-30	經濟部	先進半導體研發基地建置_建築主體工程
2026-05-07		財團法人中華經濟研究院興建院舍大樓統包工程(114建字第0052號)
2025-09-24	經濟部中壢產業園區服務中心	114年度中壢產業園區自強一路排水系統改善工程
2025-05-14	經濟部水利署北區水資源分署	(114年石門水庫沉澱池土方清運)
2026-04-13		石門水庫後池堰橋及周邊景觀改善
2025-02-18	經濟部水利署第十河川分署	大漢溪右岸城林橋至鐵路橋河段疏濬及環境營造工程
2026-03-04		淡水河左岸蘆洲疏濬工程第二期第四標
2026-03-13		新店溪福和橋至秀朗橋河段(新北市段)疏濬工程第四期
2023-07-10	經濟部水利署第十河川分署 (原經濟部水利署第十河川局)	(112年度橫溪溪南1號護岸構造物維修改善工程)
2020-12-11	臺北市建築管理工程處	好名贖餘土石方及營建混和物資源處理場(109年第4季)
2021-08-02		亞太營建工程贖餘土石方及營建混合物資源處理場(110年第3季第1批)
2024-04-08		磊駿土石方餘土堆置處理場(113年第1季第1批)
2026-03-04		亞太營建工程贖餘土石方及營建混合物資源處理場(115年第1季第2批)
2026-04-01		112建字第8888號建照工程(地下室工程)
2026-04-01		112建字第8888號建照工程(周邊整地工程)
2026-04-07		114建字第0068號建造工程
2026-04-08		113建字第0080號建照工程
2026-04-08		113建字第0168號建照工程
2026-04-09		114建字第0009號建照工程
2026-04-14		113建字第0031號建照工程
2026-04-14		111建字第0342號建造工程
2026-04-14		112建字第0097號建照工程
2026-04-21		107建字第0092號建照工程
2026-04-23		113建字第0099號建照工程
2026-04-23		113建字第0121號建照工程
2026-04-24		113建字第8888號建照工程
2026-04-30		114建字第0056號建照工程
2026-04-30		111建字第0276號建造工程
2026-05-05		110建字第0231號建照工程
2026-05-05		113建字第0177號建照工程
2026-05-05		114建字第0029號建照工程
2026-05-06		112建字第0170號建照工程
2026-05-06		113建字第0222號建照工程

保證金收據日期	機關名稱	案件名稱
2021-06-08	臺北大眾捷運股份有限公司	捷運士林站TOD轉乘設施空間活化及多元服務建置案統包工程
2024-07-30		劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案工程
2024-12-26		捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務工程
2025-08-18		捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務工程(建照階段)
2026-03-16	臺北市中山區大佳國民小學	風雨操場新建工程
2026-04-17	臺北市文山區永建國民小學	(永建國小舊校址建物拆除工程)
2026-03-16	臺北市文山區興華國民小學	114年度新建風雨操場工程
2026-01-12	臺北市立麗山國民中學	風雨操場新建工程暨114年度運動場及跑道整修工程採購案
2023-10-30	臺北市住宅及都市更新中心	臺北市南港區南港段二小段671-6地號等52筆土地公辦都市更新案
2024-10-01	臺北市政府工務局大地工程處	臺北市動物之家暨動保處辦公廳舍新建工程
2025-02-25		富德納骨設施新建工程
2025-04-21		114年度臺北市山區道路預約式維護工程（大安及文山區）
2025-07-16		113年度山坡地住宅邊坡及老舊聚落預約式維護工程(114年續約)
2025-07-21		113年度臺北市山坡地邊坡（南區）暨農業環境維護預約式工程(114年續約)
2025-07-28		114年度臺北市山坡地邊坡改善與設施維護工程
2025-08-08		114年度山區道路改善及維護工程(文山、南港)
2025-08-08		114年度臺北市山坡地溪溝改善及設施維護工程
2025-09-10		114年度山區道路改善及維護工程(士林、北投)
2026-03-23		115年度臺北市山坡地溪溝更新預約式工程（北區）
2023-03-14	臺北市政府工務局 公園路燈工程管理處	110年度各管理所所轄公園天然災害搶修預約工程(土木標)112續約
2025-05-20		艋舺公園景觀改善工程-114建字第0010號
2025-08-11		大安森林公園排水及鋪面改善工程
2025-08-26		康樂綠地、天壽公園改善工程
2025-09-12		114年度園藝工程隊所轄綠地、廣場整建工程
2017-03-28	臺北市政府工務局水利工程處	代辦臺北市市場處所屬公有環南市場改建工程主體工程
2021-08-26		美堤河濱公園自然親水灣周邊環境整建工程（第二期）
2023-07-10		景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程
2023-10-16		磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋)
2024-04-10		士林官邸北側滯洪池新建工程
2024-07-10		大安區民族實中周邊排水及校園環境營造工程
2024-08-26		大龍抽水站擴建站新建工程
2025-05-28		新店溪及景美溪匯流口護岸及景觀改善工程
2025-08-08		114年度百齡橋至承德橋及錫口碼頭至麥帥二橋河道疏浚工程
2025-10-03		內湖區大湖公園沉沙池清淤工程
2026-01-08		百齡抽水站新建工程
2026-02-25		百齡右岸越堤坡道新建工程
2026-03-09		114年度雨水下水道緊急搶修預約維護工程(臺北市全區)
2026-03-09		磺港溪壓力箱涵下游出口段清淤及維護改善工程
2026-03-17		115年度沉砂池及溝渠用地周邊疏浚及維護工程
2026-04-13		代辦臺北市音樂與圖書中心新建工程

保證金收據日期	機關名稱	案件名稱
2016-10-11	臺北市府工務局新建工程處	北部流行音樂中心興建工程(南基地)
2019-07-19		臺北市內湖國小新孝悌樓新建工程
2019-08-27		中正橋改建工程及代辦管線附掛工程
2019-09-03		成功市場改建工程(北市都授建字第10634986500)
2020-05-12		臺北市中山區錦州街基地公共住宅新建工程
2020-05-27		第一果菜(含堤內中繼)及萬大魚類批發市場改建統包工程
2020-06-29		臺北市萬華區新和國民小學校舍整體改建工程
2020-11-19		臺北市南港區經貿段社會住宅新建工程
2020-12-01		臺北市敦化國小校舍拆除改建工程
2021-04-23		110年度臺北市人行道改善工程開口契約(第二標)(松山、信義區)
2022-03-09		民權大橋跨河段上部結構改建工程
2022-05-05		國家生技研究園區聯外道路工程
2022-05-24		110年度臺北市道路興建及改善工程開口契約(第2標)(中正、萬華、大安、文山、松山、信義區)
2023-03-22		臺北市立和平高級中學教學大樓新建工程
2023-07-27		臺北藝術園區-臺北市立美術館擴建統包工程/第2階段
2023-07-27		臺北市職能發展學院原機工大樓及學員宿舍用地改建工程
2023-09-22		臺北市立南港高級中學綜合教學大樓新建工程
2024-04-26		臺北市文山區力行國民小學活動中心新建工程
2024-05-16		臺北市松山區西松國民小學學生活動中心新建工程
2024-05-20		臺北市府消防局關渡分隊與警察局北投分局關渡派出所新建工程
2024-08-14		臺北市府消防局大湖分隊新建工程
2024-10-09		113年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程開口契約第2標
2025-04-22		臺北市立大安國中綜合教學大樓新建工程(第2階段拆除工程)
2025-08-04		臺北市北投區石牌國民小學舊校區校舍改建工程（拆除工程部分）
2025-11-20		114年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程開口契約(第2標)
2025-11-26		臺北市大安路一段(仁愛路四段至市民大道四段)人行環境改善工程
2025-12-30		114年度道路附屬設施改善工程開口契約(第2標)(松山、信義區)
2026-01-09		114年度臺北市人行道改善工程開口契約(第二標)
2026-01-14		114年度道路附屬設施改善工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)
2026-01-14		114年度災害搶修暨防災工程開口契約(第3標)(內湖、南港、松山、信義)
2026-01-26		114年度臺北市人行道改善工程開口契約(第六標)
2026-02-09		萬華區中興橋引道拆除及拓寬工程
2026-03-04		臺北市立陽明教養院永福之家重建工程
2026-04-14		中正橋改建工程及代辦管線附掛工程-川端橋拆除工程
2026-05-05		114年度道路附屬設施改善工程開口契約(第2標)
2020-01-17	臺北市府工務局 衛生下水道工程處	臺北市信義區三興段資源回收廠基地公共住宅新建工程
2025-07-25		濱江水資源再生中心新建工程統包案
2026-03-02		114-115年東區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程
2024-06-28	臺北市府地政局土地開發總隊	金仁寶北士科總部大樓新建工程
2022-07-04	臺北市府財政局	臺北市中正區公園段三小段1地號等13筆市有土地設定地上權案
2022-10-19		臺北市中正區公園段三小段13地號等5筆市有土地設定地上權案
2023-03-30		臺北市信義區信義段四小段32、33-2地號市有土地設定地上權案
2024-08-12		臺北市中正區公園段三〇段1地號等13筆市有〇地設定地上權案(E區)
2024-08-12		臺北市中正區公園段三小段1地號等13筆市有土地設定地上權案(A區)
2022-12-28	臺北市府捷運工程局	臺北市文山區木柵段三小段623地號等39筆土地都市更新計畫案甲區段A1基地新建工程
2022-12-28		臺北市木柵區木柵段三小段623地號等39筆土地都市更新計畫案甲區段B基地新建工程
2026-03-25		臺北市西區門戶計畫臺北車站特定專用區C1土地開發案新建工程
2026-03-25		臺北市西區門戶計畫臺北車站特定專用區D1土地開發案新建工程

保證金收據日期	機關名稱	案件名稱
105年	臺北市府捷運工程局 第一區工程處	萬大-中和-樹林線（第一期工程）CQ860區段標工程
2017-02-18		萬大-中和-樹林線(第一期工程)LG06車站土建工程
2018-09-27		捷運萬大-中和-樹林線（第一期工程）- CQ870區段標工程
2023-06-30		（CF682標）北環段Y20站(不含)~Y23站(含)土建工程)
2024-02-15		環狀線北環段Y19（不含）~Y20（含）土建及水電環控區段標工程)
2024-05-06		CF690C「環狀線北環段Y23站（不含）~Y25站（不含）土建及水電環控區段標工程」
2024-08-28		臺北市立浩然敬老院重建工程
2025-06-04		環狀線北環段Y25站(含)~Y27站(含)土建及水電環控區段標工程(Y26、Y27站含潛盾段)
2025-06-11		環狀線北環段Y25站(含)~Y27站(含)土建及水電環控區段標工程
2025-08-27		環狀線北環段Y27站(不含)~Y29站(含尾軌)土建及水電環控CF690B區段標工程
2026-03-05		臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段Y21站出入口C捷運開發區捷運設施工程
2017-03-16	臺北市府捷運工程局 第二區工程處	臺北都會區大眾捷運系統信義東延段CR580C區段標工程CR285標土建工程
2017-09-21		捷運萬大線CQ850A區段標工程
2017-10-30		CQ842標LG02車站、LG02至LG03及LG02至LG01潛盾隧道土建工程-CQ842土建工程
2018-03-23		臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）CQ840區段標工程-LG03站站構開挖第二階段
2018-06-28		臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）CQ840區段標工程-1650mm自來水幹管遷移代辦工程第二階段
2018-08-03		臺北都會區大眾捷運系統信義東延段CR580C區段標工程CR285標土建工程
2021-07-12		CQ840區段標-忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程（第二階段）
2022-04-18		臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段CF680C區段標工程
2023-03-22		臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)CQ890區段標工程
2023-09-06		IQVU03子施工標共同管道工程及道路復舊工程
2023-11-23		臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)CQ890區段標工程建築物拆除工程
2024-04-10		臺北都會區大眾捷運系統環狀線南環段CF670A區段標工程Y01施工標
2024-04-19		臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)CQ840區段標工程LG03站通風廊道
2024-09-06		臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)JCQ880A區段標工程
2024-10-01		環狀線南環段CF672A施工標-Y3站出入口B及通風井Y與都市更新大樓A2基地共構結構體工程
2025-04-17		臺北都會區大眾捷運系統環狀線南環段CF670A區段標工程CF671施工標
2025-07-24		臺北都會區大眾捷運系統新店線新店區公所站（捷23）用地土地開發共構之捷運設施工程
2025-07-24		臺北都會區大眾捷運系統環狀線東環段CF763施工標工程
2025-08-07		臺北都會區大眾捷運系統環狀線南環段CF670區段標CF673施工標-Y4(含)~Y6(不含)土建工程
2025-10-28		臺北都會區大眾捷運系統環狀線南環段CF670區段標工程之CF672子施工標土建工程
2025-12-05		臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）CQ850區段標工程-永久管線復舊工程(第一階段)
2025-12-10		臺北都會區大眾捷運系統環狀線南環段CF670區段標工程-Y04站
2025-12-30		臺北都會區大眾捷運系統環狀線東環段CF760區段標工程
2026-03-09		臺北都會區大眾捷運系統環狀線南環段CF670區段標CF673施工標Y04站(含)~Y6(不含)土建工程
2026-04-27		臺北都會區大眾捷運系統環狀線南環段CF670區段標CF672施工標-Y2A(含)~Y4(不含)土建工程
2026-05-05		臺北市信義區雙永國民小學校舍暨地下公共停車場新建工程
2017-06-12	臺北市府都市發展局	臺北市北投區奇岩公共住宅統包工程
2018-01-18		臺北市萬華區莒光段公共住宅新建工程
2018-04-18		臺北市南港區小彎基地公共住宅新建工程
2018-10-09		廣慈博愛園區整體開發計畫行政大樓第A標及社福大樓第B標統包工程
2020-09-16		臺北市北投區機一基地公共住宅統包工程
2021-03-04		臺北市南港區玉成公共住宅統包工程
2022-06-22		臺北市萬華區福民一期社會住宅新建工程
2022-12-21		臺北市信義區松信社會住宅新建工程
2023-06-05		臺北市文山區景美女中調車場基地公共住宅統包工程(景觀工程)
2025-03-12		臺北市內湖區石壁潭社會住宅1區統包工程
2025-11-05		臺北市內湖區石壁潭社會住宅1區統包工程_臺北市114雜字第0042號
2026-04-29		臺北市內湖區石壁潭社會住宅1區統包工程_臺北市114建字第0186號

保證金收據日期	機關名稱	案件名稱
2024-08-05	臺北市政府體育局	克強公園游泳池暨新生公園網球場改建全民運動館統包工程-克強館
2024-08-05		克強公園游泳池暨新生公園網球場改建全民運動館統包工程-新生館
2017-12-08	臺北市停車管理工程處	信義414號防災公園附建地下停車場新建工程
2021-09-01		公1公園附建地下停車場新建工程
2026-03-10	臺北市都市更新處	臺北市南港區玉成段三小段560地號等5筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案
2026-03-31		變更臺北市南港區玉成段一小段169地號等4筆(原20筆)土地都市更新事業計畫案
2026-04-01		擬訂臺北市中山區吉林段三小段801地號等10筆土地都市更新事業計畫案
2026-04-01		變更臺北市信義區雅祥段一小段578地號等15筆土地都市更新事業計畫及擬訂權利變換計畫案
2026-04-27		擬訂臺北市南港區玉成段二小段732地號1筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案
2026-05-04		擬訂臺北市士林區百齡段三小段212-1地號等8筆（原7筆）土地都市更新事業計畫案
2026-05-05		擬訂臺北市松山區敦化段一小段385地號等8筆(原7筆)土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案
2020-10-28	臺北自來水事業處	一清幹線(中、永和成功路PCCP)備援幹管統包工程
2021-04-16		翡翠原水管工程
2022-10-24		三重二號配水池暨加壓站新建工程
2025-08-14		114北區C管網改善工程
2025-10-22		關渡三重支線輸水幹管潛盾統包工程
2025-12-15		114南區C管網改善工程
2025-12-15		114南區B管網改善工程
2025-12-15		114南區A管網改善工程
2026-01-05		114陽明B管網改善工程
2026-01-26		115年陽明B管線配合工程採購（開口契約含後續擴充）
2026-01-27		114年東區延性鑄鐵管耐震接頭(NS型)管網改善工程
2026-01-27		士林區溪山里高地供水管線新設工程
2026-01-29		士林區東山社區及燒庚寮聚落供水設備改善工程
2026-02-03		大同加壓站二座進水閘及旁通閘改善工程
2026-02-03		115年南區A管線配合工程採購(開口契約含後續擴充)
2026-02-09		114西區B管網改善工程
2026-02-12		115年南區給水裝置工程採購(開口契約含後續擴充)
2026-03-03		115年南區B管線配合工程採購(開口契約含後續擴充)
2026-03-09		115年北區B管線配合工程採購(開口契約含後續擴充)
2026-03-10		永福橋至華中橋φ800mm備援管線統包工程
2026-03-13		114陽明A管網改善工程
2026-03-20		115年陽明A管線配合工程採購(開口契約含後續擴充)
2026-03-20		115北區A管線配合工程及115北區A管線設備維修工程
2026-04-20		115年東區A管線配合工程採購(開口契約含後續擴充)及115年東區A管線設備維修工程採購(開口契約含後續擴充)
2026-04-20		115年東區B管線配合工程採購(開口契約含後續擴充)及115年東區B管線設備維修工程採購(開口契約含後續擴充)
2026-04-30		115年西區A管線配合工程及115年西區A管線設備維修工程
2026-05-04		115年陽明B給水裝置工程採購(開口契約含後續擴充)
2026-05-06		115年陽明A給水裝置工程採購(開口契約含後續擴充)

保證金收據日期	機關名稱	案件名稱
2020-09-01	臺北自來水事業處工程總隊	公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓新建工程
2026-01-13		直潭淨水場第一三座進水管備援銜接工程
2026-01-29		士林區平等里高地供水管線新設工程
2026-04-07		113至115年臺北西區供水管網改善配合工程
2024-03-25	臺灣港務股份有限公司 基隆港務分公司	臺北港南碼頭C填區公共設施及永久護岸暨S04-S05碼頭工程
2024-06-12		基隆港西二、西三倉庫後線景觀工程
2026-03-13		115年度基隆港港區道路整修工程(開口契約)
2023-12-06	臺灣港務股份有限公司基隆港務分 公司臺北港營運處	臺北港N7號貨櫃碼頭及後線貨櫃場新建工程
2026-01-13		E12-3地質改良工程
2026-05-06		臺北港第二散雜貨儲運中心水溝清淤及滯洪池清淤工程
2025-08-01	臺灣菸酒股份有限公司	新北市深坑區埔新段958建號等9棟眷舍拆除統包工程案
2025-12-09	臺灣臺北地方法院	華山基地櫛型月台拆遷保存暨發掘遺構提取工程採購案
2025-09-02	臺灣銀行股份有限公司	仁愛分行行舍新建工程（建築、水電共同投標）
2023-07-28	衛生福利部臺北醫院	衛生福利部臺北醫院興建急重症大樓統包工程(112莊拆字第00052號)
2023-12-22		衛生福利部臺北醫院興建急重症大樓統包工程(112莊建字第00158號)
2021-09-24	衛生福利部樂生療養院	都會原住民長照大樓新建統包工程

臺北港物流倉儲區土方交換作業平台

申請文件審查重點說明

臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司

115年4月29日

目錄

01

帳號申請審查重點

02

第一階段申請審查重點

03

第二階段補件審查重點

04

土方變更申請審查重點

05

土方混雜進場申請審查重點

01

帳號申請審查重點

01.帳號申請審查重點 工程主辦（管）機關身分查核表

1、電子郵件信箱原則應為**機關信箱**，不得使用個人信箱（如G-mail、Yahoo信箱等）。

2、連絡電話應為**辦公室電話**。

3、申請人、主管應蓋用所屬**機關職章**，及**機關印信**（關防或單位章）。

※ 本平台**僅供工程主辦（管）機關 / 目的事業主管機關申請土方交換**，不提供PCM、監造單位、承攬廠商或清運業者申請。

基隆港務分公司臺北港公共工程土方交換資訊服務系統

工程主辦(管)機關身份查核表

申請人姓名	張■■■■	身分證字號	F1■■■■
機關名稱	新北市政府養護工程處		
E-mail	1、■■■■@ntpc.gov.tw		
連絡電話	2、02-2■■■■99 #616		
新工程申請帳號。			

	申請人	二級 單位主管 □授權決行	一級 單位主管 □授權決行	機關印 (或單位章)
3、 蓋 章	 (請蓋職章)	 (請蓋職章)		

02

**第一階段申請
審查重點**

02.第一階段申請審查重點(1/17) 臺北港土方交換申請表

本分公司審查重點：

1、應於空白處蓋用**機關印信**（關防 或 單位章）。

2、各年度申請各類土方數量原則應為**12之倍數**；

總計數量不得小於1,200 M³，自115年7月1日起以試辦方式，將公共工程及民間建案新案件基本數量皆下修為600立方公尺（舊案維持1,200 M³不變）。

3、應檢附「各工程流編申請土方詳細表」（系統自動生成）；如該案件無特殊需求（如工區跨縣市等），應以1個工程流向編號為原則。

臺北港土方交換申請表

出土案件基本資料									
出土工程名稱	115年新北市轄區公有土地管理維護及活化工程(第1區)								
建照號碼	(無則免填)								
基地地址	□是 ■否 屬於環保單位所公告之「控制場址」或「整治場址」所產出土者								
工程性質	■是 □否 屬公共工程								
出土機關全名	新北市政府養護工程處								
統一編號	31631087								
承辦人	張■■■■								
聯絡電話	02■■■■3299 #616								
聯絡地址	235 新北市中和區興山路471號6樓								
電子郵件信箱	■■■■@ntpc.gov.tw								
預計出土數量(各土質數量應為 12 M ³ 之倍數，且訂有最少總量 1,200 M ³)									
土質 年度	B1	B2-1	B2-2	B2-3	B3	B4	B5	B6	小計
115 年				600			600		1,200
年									
年									
總計	0	0	0	600	0	0	600	0	1,200

3、

附件：各工程流編申請土方詳細表

EZC04744 預計出土數量 (115年度基隆港港區道路整修工程(開口契約))									
土質 年度	B1	B2-1	B2-2	B2-3	B3	B4	B5	B6	小計
115 年							1,200		1,200
總計	0	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200

03

**第二階段補件
審查重點**

03.第二階段補件審查重點(1/6) 基本資料表

本分公司審查重點：

- 1、流向編號應與第一階段申請資料一致。
- 2、出土機關應至「營建剩餘土石方資訊服務中心」**查核**基本資料表。
- 3、工程名稱應與第一階段申請資料一致。
- 4、流向管制編號為**本分公司提供之收容流向編號**，去處名稱應為「**臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程**」；土質與土量應與第一階段申請資料一致。
- 5、應於空白處蓋用**機關印信**（關防 或 單位章）。

公共工程基本資料表

申報日期：2026-03-16 列印時間：2026-04-08

1、	流向編號	EZC16859	2、	查核狀態	已查核
	土方流向	出土			
	工程興建管理單位	新北市政府養護工程處		工程興建管理單位代碼	382110300G
3、	工程名稱	115年新北市轄區公有土地管理維護及活化工程(第1區)			
	工程所在縣市	新北市	工程地點	新北市板橋、土城、中和、永和、新店、深坑、石碇、坪林、烏來、坪溪、雙溪、貢寮、瑞芳、金山、萬里等區	
	工程所在鄉鎮	板橋區	地號		
	監造單位	和泰工程顧問有限公司			
	查核人	張	工程師		6
	承包廠商	成鎰營造股份有限公司			
	申報人	鄭			92
	清運業者	成鎰營造股份有限公司			
4、	土方去處場所與工程名稱列表				
	編號	流向管制編號	去處名稱	土質	土量(M³)
	1	EZC19850	臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程	B2-3	600.000
	2	EZC19850	臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程	B5	600.000
	總土方量				1,200.000
	核准單位同意日期			1900-01-01	
	核准單位同意文號				
	備註				
	可再利用物料				
	土質	土量(M³)	處理方式	去處	核准文號
	-				
	土方交換相關資訊				
	是否符合土方交換申報門檻		土方交換編號		
	說明：				
	1. 工程經主辦機關綁定後，工程興建管理單位、工程興建管理單位代碼與查核人等資料將自動				


5、

8

03.第二階段補件審查重點(2/6) 無紅火蟻證明文件

本分公司審查重點：

- 1、工程名稱應與第一階段申請資料一致。
- 2、證明文件應為**2年內**之有效文件。
- 3、應確認無紅火蟻入侵施工範圍。
- 4、應於空白處蓋用**機關印信**（關防 或 單位）。
- 5、應由**國家紅火蟻防治中心**或**合格機構**出具證明文件。

入侵紅火蟻偵查表			
			2、日期：115/01/13
1、工程名稱： 115 年新北市轄區公有土地管理 維護及活化工程(第 1 區)		檢測範圍： 新北市金山區清水路 60 巷（工程 施工區域）	
面積：約 1500 平方公尺	地區型態：道路/雜 草地	地型屬性：平地	
氣候條件	天候：晴	氣溫：21	雨量：零
偵查方式	☒ 目視法 ☒ 誘餌誘集法(原味洋芋片)		
偵測日期:115/01/13 開始放餌時間: 15:00 開始收餌時間: 15:40			
項 次	偵測範圍	偵測位置	3、偵測結果
A	新北市金山區清 水路 60 巷（工 程施工區域）	01~10 點 如後圖標示 於	4、未發現紅火蟻入侵跡象 
技術人員 莊		監督人員	
5、承攬廠商：凡公司 			

03.第二階段補件審查重點(3/6) 土壤檢驗報告

本分公司審查重點：

- 1、計畫名稱應與第一階段申請資料一致。
- 2、檢驗報告應為**2年內**之有效證明文件。
- 3、應於空白處蓋用**機關印信**（關防 或 單位）。
- 4、檢驗報告應符合相關標準。

台灣檢驗科技股份有限公司
環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

土壤樣品檢測報告

1、 計畫名稱：115年新北市轄區公有土地管理維護及活化工程(第1區)

樣品編號：NPL26200149001

樣品特性：土壤

採樣單位：成錫營造股份有限公司

採樣方法：----

採樣地點：金山區月眉路25號(委託單位提供)

2、 檢測目的：翻耕土石方交換計畫

採樣時間：115年02月26日08時10分

收樣時間：115年02月26日17時05分

報告日期：115年03月12日

報告編號：NPL26200149

聯絡人：周

電話/傳真：02- 661

3、 備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測：郭旭勻(F11-25)；有機檢測：謝淑敏(F10-03)/林東蓮(F10-11)/陳漢庭(F10-10)。
2. 本報告共9頁，分離使用無效。
3. 測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND”表示，並註明方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量最低濃度時，以“<檢量最低濃度值”表示，並註明註明測值。
4. 本樣品由委託單位自行送樣，本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 本採樣時間由委託單位提供。
6. 樣品未貼封條。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：李仁傑
檢驗室主管：葉峻銘

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁傑

檢驗室主管：謝淑敏代

(第1頁，共9頁)

TWE 5662660

台灣檢驗科技股份有限公司
環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

樣品檢測報告

樣品編號：NPL26200149001

序號	樣品編號	檢測項目	檢測方法	MDL	單位	土壤污染管制標準	土壤污染監測標準	NPL26200149001	-	-	-	-	-	-	-
26	灰-1,2-二氯乙烷	NIEA M711.04C/NIEA M155.02C	0.0099	mg/kg	50	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
27	三氯乙烷	NIEA M711.04C/NIEA M155.02C	0.0095	mg/kg	60	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
28	氯乙烷	NIEA M711.04C/NIEA M155.02C	0.0093	mg/kg	10	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
29	二甲苯	NIEA M711.04C/NIEA M155.02C	0.0296	mg/kg	500	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
30	2,4,5-三氯酚	NIEA M711.02C / NIEA M155.01C	0.07	mg/kg	350	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
31	2,4,6-三氯酚	NIEA M711.02C / NIEA M155.01C	0.07	mg/kg	40	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
32	3,3'-二氯聯苯	NIEA M711.02C / NIEA M155.01C	0.06	mg/kg	2	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
33	六氯苯	NIEA M711.02C / NIEA M155.01C	0.07	mg/kg	500	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
34	五氯酚	NIEA M711.02C / NIEA M155.01C	0.07	mg/kg	200	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
35	殺蟲率	NIEA M801.13B	-	mg/100g	1000	-	1.73	-	-	-	-	-	-	-	-
36	砷	NIEA S310.64B	0.112	mg/kg	60	30	15.4	-	-	-	-	-	-	-	-
37	鎘	NIEA S321.65B/M104.02C	0.08	mg/kg	20	10	<0.33(0.298)	-	-	-	-	-	-	-	-
38	鉻	NIEA S321.65B/M104.02C	2.34	mg/kg	250	175	51.2	-	-	-	-	-	-	-	-
39	銅	NIEA S321.65B/M104.02C	1.86	mg/kg	400	220	39.0	-	-	-	-	-	-	-	-
40	鉛	NIEA S321.65B/M104.02C	1.97	mg/kg	2000	1000	29.7	-	-	-	-	-	-	-	-
41	鎳	NIEA S321.65B/M104.02C	2.15	mg/kg	200	130	46.0	-	-	-	-	-	-	-	-
42	鉍	NIEA S321.65B/M104.02C	2.38	mg/kg	2000	1000	119	-	-	-	-	-	-	-	-
43	總石油烴氫化合物	NIEA S310.64B	63.5	mg/kg	1000	-	<160(94.6)	-	-	-	-	-	-	-	-
	以下空白														

備註

(第3頁，共9頁)

03.第二階段補件審查重點(4/6) 保證金繳款證明

本分公司審查重點：

- 1、應註明保證金繳款日期。
- 2、收款帳號應與第一階段本分公司所提繳款單相符。





交易處理狀態查詢

列印日期：2026/04/09

審核放歷程

步驟名稱	審核放人員	執行日期時間	狀態
編輯	編輯	2026/04/09 14:11:13	已送呈
放行	編輯	2026/04/09 14:12:51	已放行

交易明細資訊

處理狀態	交易成功
處理序號	26040959108340
資金安控機制	FX/IL 憑證
交易類型	台幣單筆 / 多筆轉帳-單筆
登錄日期	2026/04/09 14:11:13
預定轉帳日期	2026/04/09
實際轉帳日期	2026/04/09
轉出戶名	94191609 威能營造股份有限公司
轉出帳號	1 8-1 臺灣銀行淡水分行
轉入戶名	臺灣港務股份有限公司
轉入銀行/分行	004 臺灣銀行
轉入帳號	37772960303112 臺灣銀行
轉入戶號碼	
轉出金額	300,000.00
手續費	0.00 (付款人員擔)
實際扣款金額	300,000.00
實際入帳金額	300,000.00
轉出交易備註	保證金
轉出戶銷帳參考資料	
轉入戶銷帳參考資料	
入帳通知	不通知 通知內容： 威能營造股份有限公司
複索上傳格式名稱	nothing

憑單資料

筆次	憑單日期	憑單編號/明細	金額
無設定資料			

經辦

編輯

審核

編輯

放行

編輯



03.第二階段補件審查重點(5/6) 繳款授權同意書

本分公司審查重點：

- 1、工程名稱應與第一階段申請之名稱一致。
- 2、應確認統一發票抬頭與統一編號所對應之公司行號相符
- 3、應於空白處蓋用**機關印信**（關防 或 單位章）。。
- 4、應註明**授權日期**。

1、 臺北港土方管理費繳款授權書

1、 新北市政府養護工程處業管115年新北市轄區公有土地管理維護及活化工程
(第1區)與臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司臺北港物流倉儲區工程辦理
土方交換作業，有關土方管理費之繳納資訊如下：

1. 繳納單位：
☐ 本機關繳納。
☒ 廠商：成鑑營造股份有限公司代本機關繳納。

2. 發票資訊：
 統一發票抬頭：成鑑營造股份有限公司
 統一編號：94191609

3. 繳納單位聯絡資訊：
 連絡人：鄭■■■■
 連絡電話：(02)2636-5292

4. 繳款單及發票領取方式：
☐ 自取
☒ 郵寄地址：252005 新北市三芝區忠孝街148號



中 華 民 國 115 年 4 月 8 日

註1：臺北港物流倉儲區工程辦理收容公共工程剩餘土石方作業，係為臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司與各公務機關間之土方撮合，考量公務機關於各工程預算案編列之習性，茲以本同意書確立「土方管理費」之繳納單位，俾憑辦理。如遇廠商繳費爭議，則限定由機關繳納費用。

註2：依據臺北港收容公共工程營運剩餘土石方作業規定第七條規定，基隆港務分公司將定期檢討並調整費率。

03.第二階段補件審查重點(6/6) 協議組織會議證明

本分公司審查重點:

- 1、應上傳**出席證明**，實體會議為開會證明，線上會議為簽到表。
- 2、工程名稱、流向編號應與第一階段申請資料相符，並**註明與會日期**。
- 3、應上傳相關在職文件，確認與會人員仍在職（名片或投保資料等）。

3、



1. 臺北商港工務所
臺北商港工務所
臺北商港工務所

臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程-
土方交換管制及推整委託專業服務
115年4月份危害告知暨協議組織會議開會證明

1. 本月份協議組織會議之安全衛生及危害告知事項，經本大會議告知內容已充分瞭解，並將負責詳細轉知該內容使承攬清運廠商瞭解，並要求遵守，且應備有記錄存查。

2. 協議組織會議未能詳列事項，應依相關法規規定辦理。

3. 安全衛生及危害告知事項進場單位務必遵守，若有違反依車輛進場管理辦法相關規定處份。

2. 工程流向管制編號: LZB 09890
營造廠商名稱: 成鎰營造工程股份有限公司
出土工程名稱: 新北市中和區德光里居住宅新建統包工程

以上安全衛生事項，進場單位已確實明瞭，並允諾確實遵守。以上若法令另有規範者，亦應遵守。

(承辦人、負責人、代理人或委託人)簽名: [Signature] 日期: 115.4.1

實體會議 - 應上傳開會證明

1. 臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程-
土方交換管制及推整委託專業服務
115年4月份協議組織會議紀錄宣導暨危害因素告知單 簽到表

1. 墜落、滾落	8. 火災	15. 粉塵危害
2. 感電	9. 爆炸	16. 異常氣壓
3. 倒塌、崩塌	10. 缺氧	17. 與高低溫之接觸
4. 物料掉落	11. 交通事故	18. 與有害物之接觸
5. 跌倒	12. 中毒	19. 其他
6. 衝撞、被撞	13. 溺水	
7. 夾、捲、切、割、擦、穿刺傷	14. 物體破裂	

二、危害防止措施

1. 墜落、滾落
• 非土方車輛人員請勿進入工作範圍。
• 進行清斗作業前，應確認作業環境安全，避免站立於石塊、車斗邊緣或其他不穩固位置，並應穿戴防滑安全鞋及必要之個人防護具。作業期間應注意地面濕滑狀況。

3. 倒塌、崩塌
• 突發性天氣變化，應依現場指示暫停作業避免災害。

6. 衝撞、被撞
• 應將車輛後退警報器、後退燈之功能正常。

11. 交通事故
• 車輛於工區內應按規定時速行駛。
• 人員於工區行走時，應避免跑步，並注意行駛中之車輛。
• 應將車輛後退燈出有充分視線淨空。

13. 溺水
• 於作業場所或其附近設置救生繩、救生圈、救生衣等救生設備。

15. 粉塵危害
• 提供作業人員使用適當之呼吸防護具。

三、受告知進場單位基本資料

受告知單位:
1. 本月份協議組織會議紀錄宣導之安全衛生及危害告知事項，經線上宣導影片告知內容且已充分瞭解，並將負責詳細轉知該內容使承攬清運廠商瞭解，並要求遵守，且應備有記錄存查。
2. 線上協議組織會議紀錄宣導未能詳列事項，應依相關法規規定辦理。
3. 安全衛生及危害告知事項進場單位務必遵守，違反依車輛進場管理辦法相關規定處份。
4. 營造單位同意線上簽核協議組織會議紀錄宣導暨危害因素告知簽到表並上傳審核人員資料以供查核，如有資料不實，願自行承擔後果。

2. 進場單位工程名稱: 115年新北市中和區公有土地管理維護及治地工程 (C816)
工程流向管制編號: E2C16859
營造廠商名稱: 成鎰營造(股)公司
(承辦人、負責人或代理人)簽名: [Signature] 日期: 115年4月8日

線上會議 - 應上傳簽到表

04

**土方變更申請
審查重點**

02.土方變更申請審查重點(1/2) 臺北港土方交換變更申請表

本分公司審查重點：

1、應於空白處蓋用**機關印信**（關防 或 單位章）。

2、各年度申請各類土方數量原則應為**12之倍數**；

總計數量不得小於1,200 M³，自115年7月1日起以試辦方式，將公共工程及民間建案新案件基本數量皆下修為600立方公尺（舊案維持1,200 M³不變）。

3、應檢附「各工程流編申請土方詳細表」（系統自動生成）；如該案件無特殊需求（如工區跨縣市等），應以1個工程流向編號為原則。

臺北港土方交換變更申請表

出土案件基本資料									
出土工程名稱	115年度汐止區雨水下水道及水利溝渠疏通、維護管理工程(開口契約)								
建照號碼	(無則免填)								
基地場址	☐ 是 ■否 屬於環保單位所公告之「控制場址」或「限制場址」所填出土方								
工程性質	☒ 是 ☐ 否 屬公共工程								
出土機關全名	新北市汐止區公所								
統一編號	39300700								
承辦人	廖								
聯絡電話	26-1#213								
聯絡地址	207 新北市汐止區新台五路一段268號2樓								
電子郵件信箱	@ntpc.gov.tw								
預計出土數量(各土質數量應為 12 M ³ 之倍數，且訂有最少總量 1,200 M ³)									
土質 年度	B1	B2-1	B2-2	B2-3	B3	B4	B5	B6	小計
115 年				3,000		120	120		3,240
總計	0	0	0	3,000	0	120	120	0	3,240

3、附件：各工程流編申請土方詳細表


EZC08722 預計出土數量 (115年度汐止區雨水下水道及水利溝渠疏通、維護管理工程(開口契約))									
土質 年度	B1	B2-1	B2-2	B2-3	B3	B4	B5	B6	小計
115 年				3,000		120	120		3,240
總計	0	0	0	3,000	0	120	120	0	3,240

02.土方變更申請審查重點(1/2) 基本資料表

本分公司審查重點：

- 1、流向編號應與原案一致。
- 2、出土機關應至「營建剩餘土石方資訊服務中心」**查核**基本資料表。
- 3、工程名稱應與原案一致。
- 4、流向管制編號為**本分公司提供之收容流向編號**，去處名稱應為「**臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程**」；土質與土量應與申請表一致。
- 5、應於空白處蓋用**機關印信**（關防 或 單位章）。

公共工程基本資料表				
申報日期：2026-03-16 列印時間：2026-04-08				
1、	流向編號	EZC16859	2、	查核狀態
	土方流向	出土		已查核
	工程興建管理單位	新北市政府養護工程處	工程興建管理單位代碼	382110300G
3、	工程名稱	115年新北市轄區公有土地管理維護及活化工程(第1區)		
	工程所在縣市	新北市	工程地點	新北市板橋、土城、中和、永和、新店、深坑、石碇、坪林、烏來、坪溪、雙溪、貢寮、瑞芳、金山、萬里等區
	工程所在鄉鎮	板橋區	地號	
	監造單位	和泰工程顧問有限公司		
	查核人	張	工程師	6
	承包廠商	成錙營造股份有限公司		
	申報人	鄭		92
	清運業者	成錙營造股份有限公司		
4、	土方去處場所與工程名稱列表			
	編號	流向管制編號	去處名稱	土質 土量(M³)
	1	EZC19850	臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程	B2-3 600.000
	2	EZC19850	臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程	B5 600.000
	總土方量			1,200.000
	核准單位同意日期		1900-01-01	
	核准單位同意文號			
	備註			
	可再利用物料			
	土質	土量(M³)	處理方式	去處 核准文號
	-			
	土方交換相關資訊			
	是否符合土方交換申報門檻		土方交換編號	5、
	說明：			
	1. 工程經主辦機關綁定後，工程興建管理單位、工程興建管理單位代碼與查核人等資料將自動			



05

**土方混雜收容申請
審查重點**

05.土方混雜收容申請審查重點(1/1) 土方分類困難佐證資料

本分公司審查重點：

- 1、應註明申請土分混雜收容之工程名稱。
- 2、應於空白處蓋用**機關印信**（關防 或 單位章）。
- 3、申請時應輔以文字說明。

3、

土方分類困難/混雜原因說明

因本工程為埋管施工挖出之廢土，挖掘現場位於道路旁，因道路空間有限，現地土層交界也並非均一平整，經挖掘篩分後難有效分離各土質，土方仍混雜少量不同類別土石方，故申請B2-3、B5類土方混雜。

1、工程名稱：三重區五谷王南街等巷弄汰換管線工程

人工撿拾分類



過篩機分類



2、



「臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程」

收容營建剩餘土石方第 19 次會議

一、會議時間：115 年 5 月 28 日(星期二)上午 10 時

二、會議地點：線上召開

三、主持人：本分公司工程處 章副處長伯全

紀錄：陳侑漢

四、出（列）席單位（人員）：

出（列）席單位	職稱	簽名
宇泰工程顧問有限公司	主任	張富峰
義力營造股份有限公司/ 萬銘工程科技股份有限公司	主任	張景葛
本分公司政風處	代理 副理	何聰敏
本分公司臺北港營運處		
本分公司工程處	指導	易序良
	高工師	黃以知
	工程師	許家盛
	副工	賴威宇
	助工	彭南勛 李晉東
	高員	連弘壽、郭俊羽

**「臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程」
收容營建剩餘土石方第19次會議線上簽到表**

時間戳記	機關名稱	職稱	姓名	簽到(退)
2026/5/28 08:46	臺北自來水事業處	二級工程師兼股長	張正忠	簽到
2026/5/28 08:48	國防部政務辦公室國家軍事博物館籌備處	聘員	朱思樺	簽到
2026/5/28 09:14	臺北自來水事業處南區營業分處	三級工程師	梁文政	簽到
2026/5/28 09:16	交通部高速公路局第一新建工程分局	助理工程員	林盈穎	簽到
2026/5/28 09:30	臺北市政府捷運工程局第二區工程處	助理規劃師	王明裕	簽到
2026/5/28 09:30	捷運工程局第二區工程處	助理規劃師	龔家鵬	簽到
2026/5/28 09:30	台電協和電廠	土木維護專員	李傑祐	簽到
2026/5/28 09:30	交通部高速公路局第一新建工程分局	幫工程司	李奕霆	簽到
2026/5/28 09:31	臺北市政府捷運工程局第二區工程處	助理規劃師	王明裕	簽到
2026/5/28 09:31	台灣自來水股份有限公司第二區管理處龜山服務所	技術士	徐有駿	簽到
2026/5/28 09:31	國營臺灣鐵路股份有限公司(資產開發處)	助理工程師	王竣賢	簽到
2026/5/28 09:31	臺北市政府財政局	股長	林振暘	簽到
2026/5/28 09:32	新北市環保局	科員	張玉涵	簽到
2026/5/28 09:33	新北市政府水利局	副工程司	呂孟宸	簽到
2026/5/28 09:34	新北市政府板橋區公所	書記	劉又瑄	簽到
2026/5/28 09:35	桃園市政府養護工程處	股長	陳俊宏	簽到
2026/5/28 09:35	新北市立新北高級工業職業學校	行政人員	曾鈴惠	簽到
2026/5/28 09:35	臺北市政府工務局大地工程處	幫工程司	柯亭羽	簽到
2026/5/28 09:37	蘆竹區公所	約僱	邱世傑	簽到
2026/5/28 09:37	國立臺灣大學	行政專員	游志豪	簽到
2026/5/28 09:38	自來水公司第二區管理處龜山服務所	技術士	林育承	簽到
2026/5/28 09:38	內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	工程司	李明俊	簽到

**「臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程」
收容營建剩餘土石方第19次會議線上簽到表**

時間戳記	機關名稱	職稱	姓名	簽到(退)
2026/5/28 09:38	臺北市政府地政局土地開發總隊	約聘人員	陳正翰	簽到
2026/5/28 09:39	新北勢汐止區公所	技士	林哲全	簽到
2026/5/28 09:40	新北市中和區公所	技士	陳凱隆	簽到
2026/5/28 09:40	新北市政府新建工程處	副工程司	劉謹榕	簽到
2026/5/28 09:41	臺北自來水事業處南區營業分處	三級工程師	梁文政	簽到
2026/5/28 09:41	臺北市住宅及都市更新中心	資深規劃書	王曉梅	簽到
2026/5/28 09:43	宇泰工程顧問有限公司	品管	蘇奕霖	簽到
2026/5/28 09:45	交通部鐵道局北部工程分局	幫工程司	林瑞馳	簽到
2026/5/28 09:46	臺北市政府捷運工程局第一區工處	助理規劃師	謝宜卉	簽到
2026/5/28 09:46	經濟部水利署第十河川分署	副工程司	鄧嘉璿	簽到
2026/5/28 09:48	臺北自來水事業處	四級工程師	詹証翔	簽到
2026/5/28 09:48	基隆市中山區德和國民小學	總務主任	謝詹億	簽到
2026/5/28 09:49	新北市政府消防局	股長	陳奕丞	簽到
2026/5/28 09:50	臺北市中山區大佳國民小學	主任	張云生	簽到
2026/5/28 09:50	台灣電力公司大潭發電廠	專員	張敏軒	簽到
2026/5/28 09:53	台電台北南區營業處	工程管理專員	吳羽文	簽到
2026/5/28 09:54	臺北市政府都市發展局	聘用正工程司	陳禹達	簽到
2026/5/28 09:55	臺北市停車管理工程處	聘用人員	林東貝	簽到
2026/5/28 09:55	公路局新工北分局	僱用工成員	阮萬新	簽到
2026/5/28 09:56	臺北自來水事業處東區營業分處	三級工程師	陳子俊	簽到
2026/5/28 09:56	國家鐵道博物館籌備處	聘用副工程師	蘇晨瑀	簽到
2026/5/28 09:56	臺北自來水事業處	四級工程師	黃景裕	簽到
2026/5/28 09:56	國家住宅及都市更新中心	副組長	陳仲斌	簽到
2026/5/28 09:57	台灣自來水股份有限公司第一區管理處淡水營運所	技術士	吳威煬	簽到
2026/5/28 09:57	國防醫學大學三軍總醫院	專案管理員	徐永燈	簽到
2026/5/28 09:57	台北供電區營運處	課長	謝宗穎	簽到
2026/5/28 09:58	國家人權博物館	技正	周瑋菁	簽到
2026/5/28 09:58	市場處	臨僱技術員	劉羿瑤	簽到
2026/5/28 09:58	臺北自來水事業處北區分處	助理工程師	吳昀儒	簽到
2026/5/28 09:58	憲兵指揮部	工程官	林毓修	簽到
2026/5/28 09:59	國立清華大學	助理工程師	李文博	簽到

**「臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程」
收容營建剩餘土石方第19次會議線上簽到表**

時間戳記	機關名稱	職稱	姓名	簽到(退)
2026/5/28 09:59	工務局水利工程處	約僱人員	吳清樺	簽到
2026/5/28 09:59	桃園市政府建築管理處	業務助理	林怡忻	簽到
2026/5/28 09:59	台北自來水事業處	助理工程師	吳承恩	簽到
2026/5/28 10:00	衛工處	股長	李宗翰	簽到
2026/5/28 10:00	台電北北區	北北	沈里佳	簽到
2026/5/28 10:00	國立臺灣大學總務處	資深專員	王幼君	簽到
2026/5/28 10:01	海軍陸戰指揮部	士官長	許權順	簽到
2026/5/28 10:01	內政部國土管理署	幫工程司	呂益廣	簽到
2026/5/28 10:02	公園路燈工程管理處	技工	葉炯明	簽到
2026/5/28 10:02	新北市政府農業局	約僱人員	簡里任	簽到
2026/5/28 10:03	新北市政府水利局河川工程 科	幫工程司	駱威仲	簽到
2026/5/28 10:03	新北市政府漁業及漁港事業 管理處	技士	郭萬能	簽到
2026/5/28 10:04	基隆市中山區德和國民小學	總務主任	謝詹億	簽到
2026/5/28 10:04	臺北自來水北區營業分處	四級工程師	楊心怡	簽到
2026/5/28 10:04	國家鐵道博物館籌備處	專案規劃師	呂孟哲	簽到
2026/5/28 10:05	臺北自來水事業處	三級工程師	林聖恩	簽到
2026/5/28 10:09	台水二區處	工程員	郭玆如	簽到
2026/5/28 10:09	臺北自來水事業處工程總隊	三級工程師	劉介元	簽到
2026/5/28 10:10	桃園市政府經濟發局	專案助理	簡雅惠	簽到
2026/5/28 10:11	臺北自來水事業處北區營業 分處	三級工程師	謝筱萍	簽到
2026/5/28 10:12	基隆市立安樂高級中學	事務組長	李亦騏	簽到
2026/5/28 10:12	台電輸變電工程處中區施工 處	檢驗員	蔡大元	簽到
2026/5/28 10:13	新竹市政府工務處	技士	王品臻	簽到
2026/5/28 10:18	臺灣銀行股份有限公司不動 產管理部	辦事員	林聖堯	簽到
2026/5/28 10:19	國立歷史博物館秘書室	專案助理	林昀	簽到
2026/5/28 10:19	臺北自來水事業處西區營業 分處	三級工程師	黃子豪	簽到
2026/5/28 10:20	內政部土地重劃工程處	工程員	楊忠翰	簽到
2026/5/28 10:22	農業部農田水利署瑠公管理 處	社子工作站雇 員	何建志	簽到

**「臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程」
收容營建剩餘土石方第19次會議線上簽到表**

時間戳記	機關名稱	職稱	姓名	簽到(退)
2026/5/28 10:37	鐵道局北部工程分局第二工務段	工程員	莊易翰	簽到
2026/5/28 10:39	國立臺灣藝術大學	技正	林鏗銘	簽到
2026/5/28 10:44	台灣電力公司北區施工處	課長	施元瑋	簽到
2026/5/28 10:54	麗山國中	總務主任	邱淑敏	簽到
2026/5/28 11:10	臺北市立動物園	組員	蔡秉祐	簽到
2026/5/28 11:10	交通部鐵道局	幫工程司	林政男	簽到
2026/5/28 11:18	經濟部水利署北區水資源分署	工程員	韓宇翔	簽到

**「臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程」
收容營建剩餘土石方第19次會議線上簽退表**

時間戳記	機關名稱	職稱	姓名	簽到(退)
2026/5/28 10:26	臺北市政府都市發展局	聘用正工程司	陳禹達	簽退
2026/5/28 10:30	台北供電區營運處	課長	謝宗穎	簽退
2026/5/28 10:30	臺北自來水處工程總隊	三級工程師	劉介元	簽退
2026/5/28 10:30	國家住都中心	副組長	陳仲斌	簽退
2026/5/28 10:31	臺北自來水事業處南區營業分處	三級工程師	梁文政	簽退
2026/5/28 10:32	新北市政府水利局	幫工程司	駱威仲	簽退
2026/5/28 10:32	國立臺灣大學	行政專員	游志豪	簽退
2026/5/28 10:32	國立臺灣大學總務處	資深專員	王幼君	簽退
2026/5/28 10:33	新北市立新北高級工業職業學校	行政人員	曾鈴惠	簽退
2026/5/28 10:37	臺北自來水事業處	三級工程師	林聖恩	簽退
2026/5/28 10:47	新北市政府漁業及漁港事業管理處	技士	郭萬能	簽退
2026/5/28 10:47	桃園市政府建築管理處	業務助理	林怡忻	簽退
2026/5/28 10:47	台水二區處	工程員	郭玆如	簽退
2026/5/28 10:47	經濟部水利署第十河川分署	副工程司	鄧嘉璿	簽退
2026/5/28 10:47	交通部鐵道局北部工程分局	幫工程司	林瑞馳	簽退
2026/5/28 10:47	台電台北南區營業處	工程管理專員	吳羽文	簽退
2026/5/28 10:47	臺北市住宅及都市更新中心	資深規劃師	王曉梅	簽退
2026/5/28 10:47	新北市汐止區公所	技士	林哲全	簽退
2026/5/28 10:47	工務局水利工程處	約僱人員	吳清樺	簽退
2026/5/28 10:47	自來水公司第一區管理處	技術士	簡淑鴻	簽退
2026/5/28 10:47	國立清華大學	助理工程師	李文博	簽退
2026/5/28 10:47	交通部高速公路局第一新建工程分局	助理工程員	林盈穎	簽退
2026/5/28 10:47	新北市政府農業局	約僱人員	簡里任	簽退
2026/5/28 10:47	新北市環保局	科員	張玉涵	簽退
2026/5/28 10:47	桃市府經發局	專案助理	簡雅惠	簽退
2026/5/28 10:47	臺北自來水事業處北區營業分處	三級工程師	謝筱萍	簽退
2026/5/28 10:47	臺北市政府捷運工程局第二區工程處	助理規劃師	王明裕	簽退
2026/5/28 10:47	台電輸變電工程處中區施工處	檢驗員	蔡大元	簽退
2026/5/28 10:48	台灣電力公司大潭發電廠	專員	張敏軒	簽退

**「臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程」
收容營建剩餘土石方第19次會議線上簽退表**

時間戳記	機關名稱	職稱	姓名	簽到(退)
2026/5/28 10:48	基隆市中山區德和國民小學	總務主任	謝詹億	簽退
2026/5/28 10:48	國營臺灣鐵路股份有限公司 (資產開發處)	助理工程師	王竣賢	簽退
2026/5/28 10:48	臺北市中山區大佳國民小學	主任	張云生	簽退
2026/5/28 10:48	公園路燈工程管理處	技工	葉炯明	簽退
2026/5/28 10:48	臺北市政府捷運工程局第二 區工程處	助理規劃師	王明裕	簽退
2026/5/28 10:48	農業部農田水利署瑠公管理 處	社子工作站雇 員	何建志	簽退
2026/5/28 10:48	國立臺灣藝術大學	技正	林鉉銘	簽退
2026/5/28 10:49	台灣電力公司北區施工處	課長	施元瑋	簽退
2026/5/28 10:49	台電北北區	沈里佳	沈里佳	簽退
2026/5/28 10:49	交通部高速公路局第一新建 工程分局	幫工程司	李奕霆	簽退
2026/5/28 10:49	新北市政府水利局	副工程司	呂孟宸	簽退
2026/5/28 10:50	臺北市政府地政局土地開發 總隊	約聘人員	陳正翰	簽退
2026/5/28 10:50	臺北自來水事業處西區營業 分處	三級工程師	黃子豪	簽退
2026/5/28 10:51	臺北市政府財政局	股長	林振暘	簽退
2026/5/28 10:52	國防醫學大學三軍總醫院	專案管理員	徐永燈	簽退
2026/5/28 10:52	臺北自來水事業處	二級工程師兼 股長	張正忠	簽退
2026/5/28 10:55	麗山國中	總務主任	邱淑敏	簽退
2026/5/28 10:55	臺北市政府工務局大地工程 處	幫工程司	柯亭羽	簽退
2026/5/28 10:55	新北市政府新建工程處	副工程司	劉謹榕	簽退
2026/5/28 10:55	臺北市停車管理工程處	聘用人員	林東貝	簽退
2026/5/28 10:55	臺北市政府捷運工程局第二 區工程處	助理規劃師	王明裕	簽退
2026/5/28 10:56	臺北市市場處	臨僱技術員	劉羿瑤	簽退
2026/5/28 10:56	憲兵指揮部	工程官	林毓修	簽退
2026/5/28 10:56	國防部政務辦公室軍博籌備 處	聘員	朱思樺	簽退
2026/5/28 10:56	新北市政府板橋區公所	書記	劉又瑄	簽退

**「臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程」
收容營建剩餘土石方第19次會議線上簽退表**

時間戳記	機關名稱	職稱	姓名	簽到(退)
2026/5/28 10:58	新北市立新北高級工業職業學校	行政人員	曾鈴惠	簽退
2026/5/28 11:00	內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	工程司	李明俊	簽退
2026/5/28 11:01	臺北自來水事業處	北區營業分處	黃景裕	簽退
2026/5/28 11:08	新北市政府消防局	股長	陳奕丞	簽退
2026/5/28 11:08	台灣自來水股份有限公司第一區管理處淡水營運所	技術士	吳威煬	簽退
2026/5/28 11:09	宇泰工程顧問有限公司	品管	蘇奕霖	簽退
2026/5/28 11:24	交通部鐵道局北部工程分局第二工務段	工程員	莊易翰	簽退
2026/5/28 11:29	國立歷史博物館	專案助理	林昀	簽退
2026/5/28 11:54	臺北自來水事業處北區分處	助理工程師	吳昀儒	簽退
2026/5/28 11:55	內政部土地重劃工程處	工程員	楊忠翰	簽退
2026/5/28 12:00	台電協和電廠	土木維護專員	李傑祐	簽退
2026/5/28 12:02	公路局新工北分局第二工務段	僱用工成員	阮萬新	簽退
2026/5/28 12:03	海軍陸戰隊指揮部	士官長	許權順	簽退
2026/5/28 12:07	國家人權博物館	技正	周瑋菁	簽退
2026/5/28 12:11	臺北自來水事業處	四級工程師	詹証翔	簽退
2026/5/28 12:18	衛工處	股長	李宗翰	簽退
